

Pós-Graduação

Gestão de Processos e Qualidade

Gestão por Processos
Aula 1 – Tema 1

Definição de Processos

Prof. Dr. Marcos Hashimoto





Ementa

Gestão de Processos e Gestão por Processos. Diagnóstico e Análise de Processos. Gestão da Qualidade Total. Melhoria de processos. Administração da Qualidade e 5s. Planejamento da Qualidade. Garantia da Qualidade. Controle da Qualidade. Melhoria da Qualidade. Decisões de Aceitação. Retrabalho. Ajustes nos processos.



Conteúdo Programático

1. Gestão de processos e gestão por processos.
2. Classificação dos processos.
3. Análise dos processos de negócio.
4. Mapeamento de processos de negócio.
5. Modelagem de processos de negócio.
6. Melhoria de processos de negócio e qualidade.
7. Estruturas organizacionais.
8. Simulação e implantação de processos de negócio.



Aula 1

Gestão por Processos

Aula 2

Diagnóstico e Análise de Processos

Aula 3

Gestão da Qualidade Total

Aula 4

Administração da Qualidade e 5s





Resultados esperados com a disciplina:

- Entender o ambiente organizacional.
- Entender o que são processos de negócio.
- Conhecer os principais elementos de um processo de negócio.
- Entender como os elementos se relacionam entre si em um processo.



Resultados esperados com a disciplina:


- Aprender o que são eventos.
- Aprender o que é eventOgrama.
- Aprender o que é infOgrama.
- Aprender o que é funcionOgrama.
- Aprender a mapear um processo de negócio.
- Aprender a importância da simulação.
- Aprender a importância da implantação de processos.
- Aprender sobre os controles do processo.
- Aprender sobre os mecanismos de gestão da qualidade.



Por quê processos?

- Criar um novo negócio.
- Produzir um novo bem ou serviço.
- Melhorar a qualidade do produto.
- Melhorar a eficiência e a eficácia da organização.
- Controlar o uso dos recursos e das tecnologias.
- Motivar pessoas.
- Etc.

Metodologia DOMP (Desenho, organização e melhoria de processos)

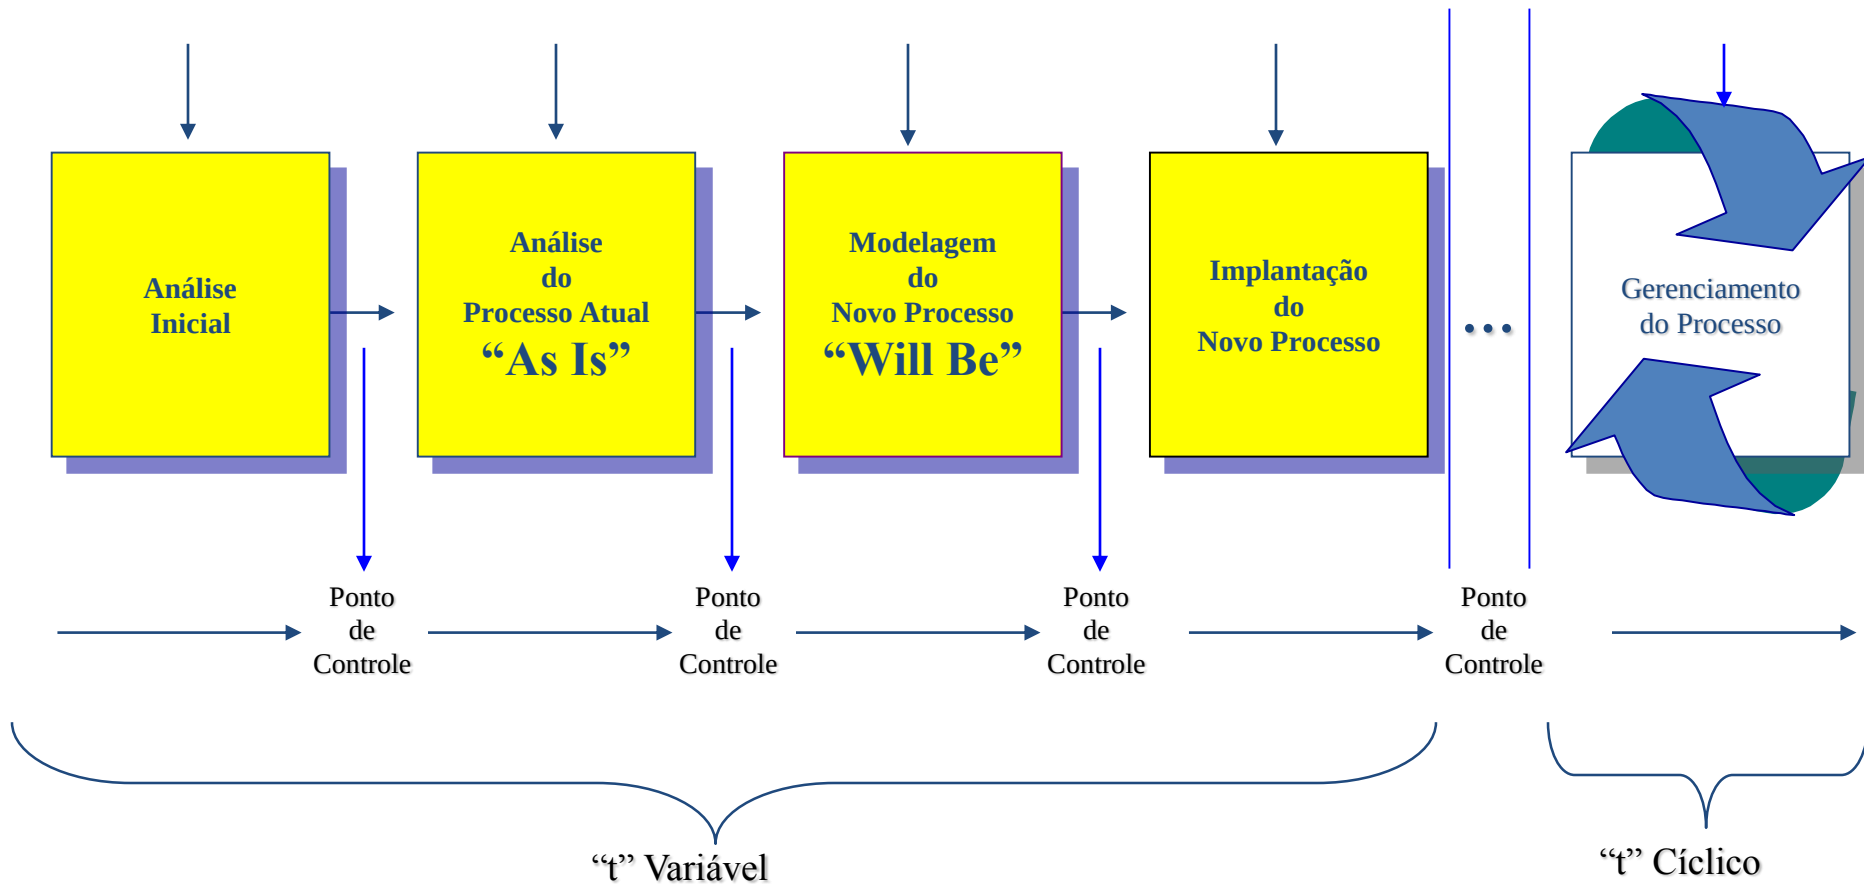



Tempo Variável

Análise inicial do problema. Quando tomaremos contato com a realidade do projeto, sua extensão, duração, custo e objetivo.

Documentação e análise do processo atual. Quando documentaremos o processo que já existe a fim de melhorar suas condições de executabilidade.

Análise e criação do novo processo. Quando desenharemos o novo processo, quer com melhorias sobre os existentes, quer o processo seja totalmente novo.

Implantação do novo processo. Quando implantaremos o novo processo, treinando e acompanhando as pessoas para garantir que “aquilo” que foi projetado e criado seja efetivamente operacionalizado.

Modelo de Relacionamento Cíclico



Situação Ideal



Desequilíbrios



Pós-Graduação


Tema 2

Reengenharia de Processos

Prof. Dr. Marcos Hashimoto



Reengenharia de Processos

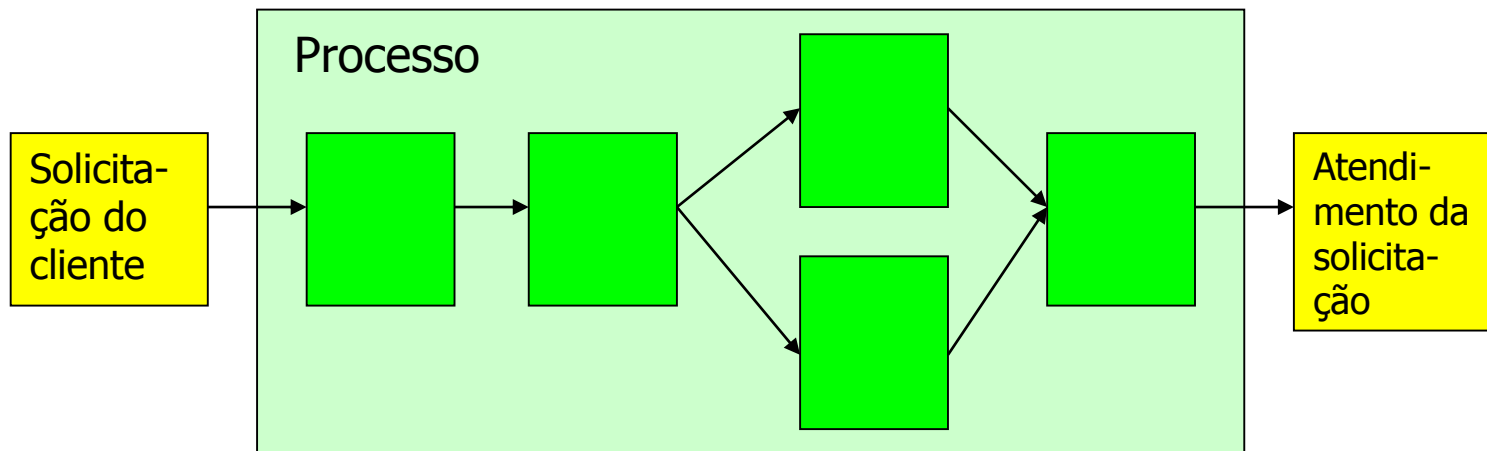


A metodologia 6 Sigma inclui uma revisão de fluxos internos para a melhoria da eficácia do sistema, revertendo em eliminação de atividades que não agregam valor, redução de custos e defeitos e diminuição do ciclo de tempo.

Reengenharia de Processos




Caso Citibank:

Antes: 10 pessoas levavam 45 dias em média para implementar uma solução de Office Banking, 35 defeitos em média por projeto e índice de satisfação do cliente de 58%.



Ações: 53 pessoas envolvidas em 27 ações corretivas durante 8 meses. Prestadores de serviço recertificados, formulários revistos, treinamento extensivo, extinção de atividades internas, reuniões periódicas de revisão, criação de uma gerência de implementação, documentação de processos.



Depois: 10 pessoas levam 15 dias em média para implementar o Office Banking. 10 defeitos em média por projeto e índice de satisfação do cliente de 83%. Produtividade por funcionário aumentou em 24% e os ganhos financeiros chegaram a US\$ 230 mil/ano.

Reengenharia de Processos



Caso Citibank:

"O Caso se tornou modelo para a América Latina, levando a subsidiária brasileira à sua primeira participação no *Citibank Team Recognition Award Program*, programa mundial de reconhecimento de trabalhos em equipe."



Pós-Graduação

Tema 3

Projeto de Produto

Prof. Dr. Marcos Hashimoto






O Projeto do Produto

Projetar o produto que o processo deve produzir!

Nenhum processo existe sem produzir um produto, que pode ser um bem ou um serviço.

O Projeto do Produto

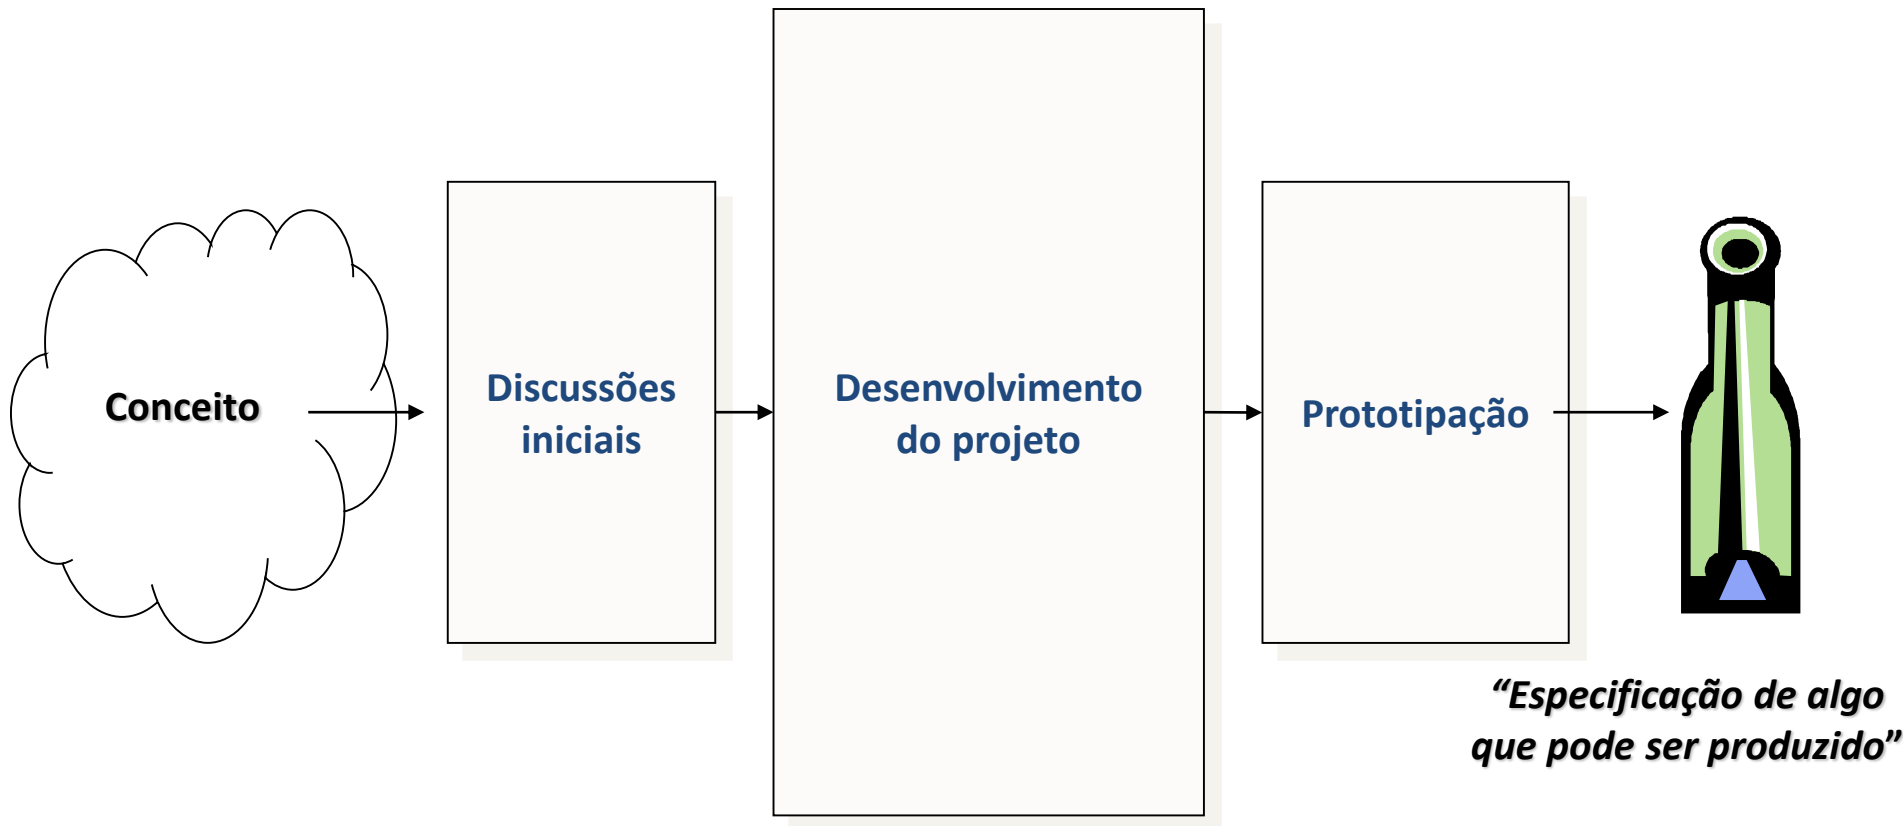



Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

“Os processos de gerenciamento de projetos são aplicados globalmente e nos mais variados setores econômicos e industriais. ‘Boa prática’ significa que existe um acordo geral de que a aplicação dos processos de gerenciamento de projetos pode aumentar as chances de sucesso em uma ampla série de projetos.”



Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

“Isto não significa que os conhecimentos, as habilidades e os processos descritos sempre devem ser aplicados de forma uniforme em todos os projetos. Para qualquer projeto específico, o gerente do projeto, em colaboração com a equipe do projeto, sempre é responsável por determinar quais processos são apropriados e o grau de rigor apropriado para cada um.”



Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

“Como uma referência básica, esse padrão não é abrangente e nem completo. Ele é um guia ao invés de uma metodologia. É possível usar metodologias e ferramentas diversas e distintas para implantar a estrutura”.



Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

Os processos de projeto são, ao todo, 42 e estão organizados em cinco grupos, cada um deles contendo um número variável de processos:

Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

Iniciação – autorização do projeto ou fase. Neste grupo estão processos que possibilitam a definição de um novo projeto ou de uma nova fase de um projeto, já que projetos muito grandes e muito complexos devem ser divididos em fases. O mais importante produto deste grupo é a autorização para que o projeto, ou fase, seja iniciado.



Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

Planejamento – definição e refinamento dos objetivos e seleção da melhor das alternativas de ação para alcançar os objetivos que o projeto estiver comprometido em atender.



Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

Execução – coordenar pessoas e outros recursos para realizar o plano.



Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

Monitoramento e controle – assegurar que os objetivos do projeto estão sendo atingidos, através da monitoração regular do seu progresso para identificar variações do plano e, portanto, ações corretivas podem ser tomadas quando necessárias.



Processos do Projeto – Segundo o PMBoK

Encerramento – Formalizar a aceitação do projeto ou fase e encerrá-lo de uma forma organizada.



Pós-Graduação


Tema 4


Planejamento Estratégico

Prof. Dr. Marcos Hashimoto



Planejamento Estratégico




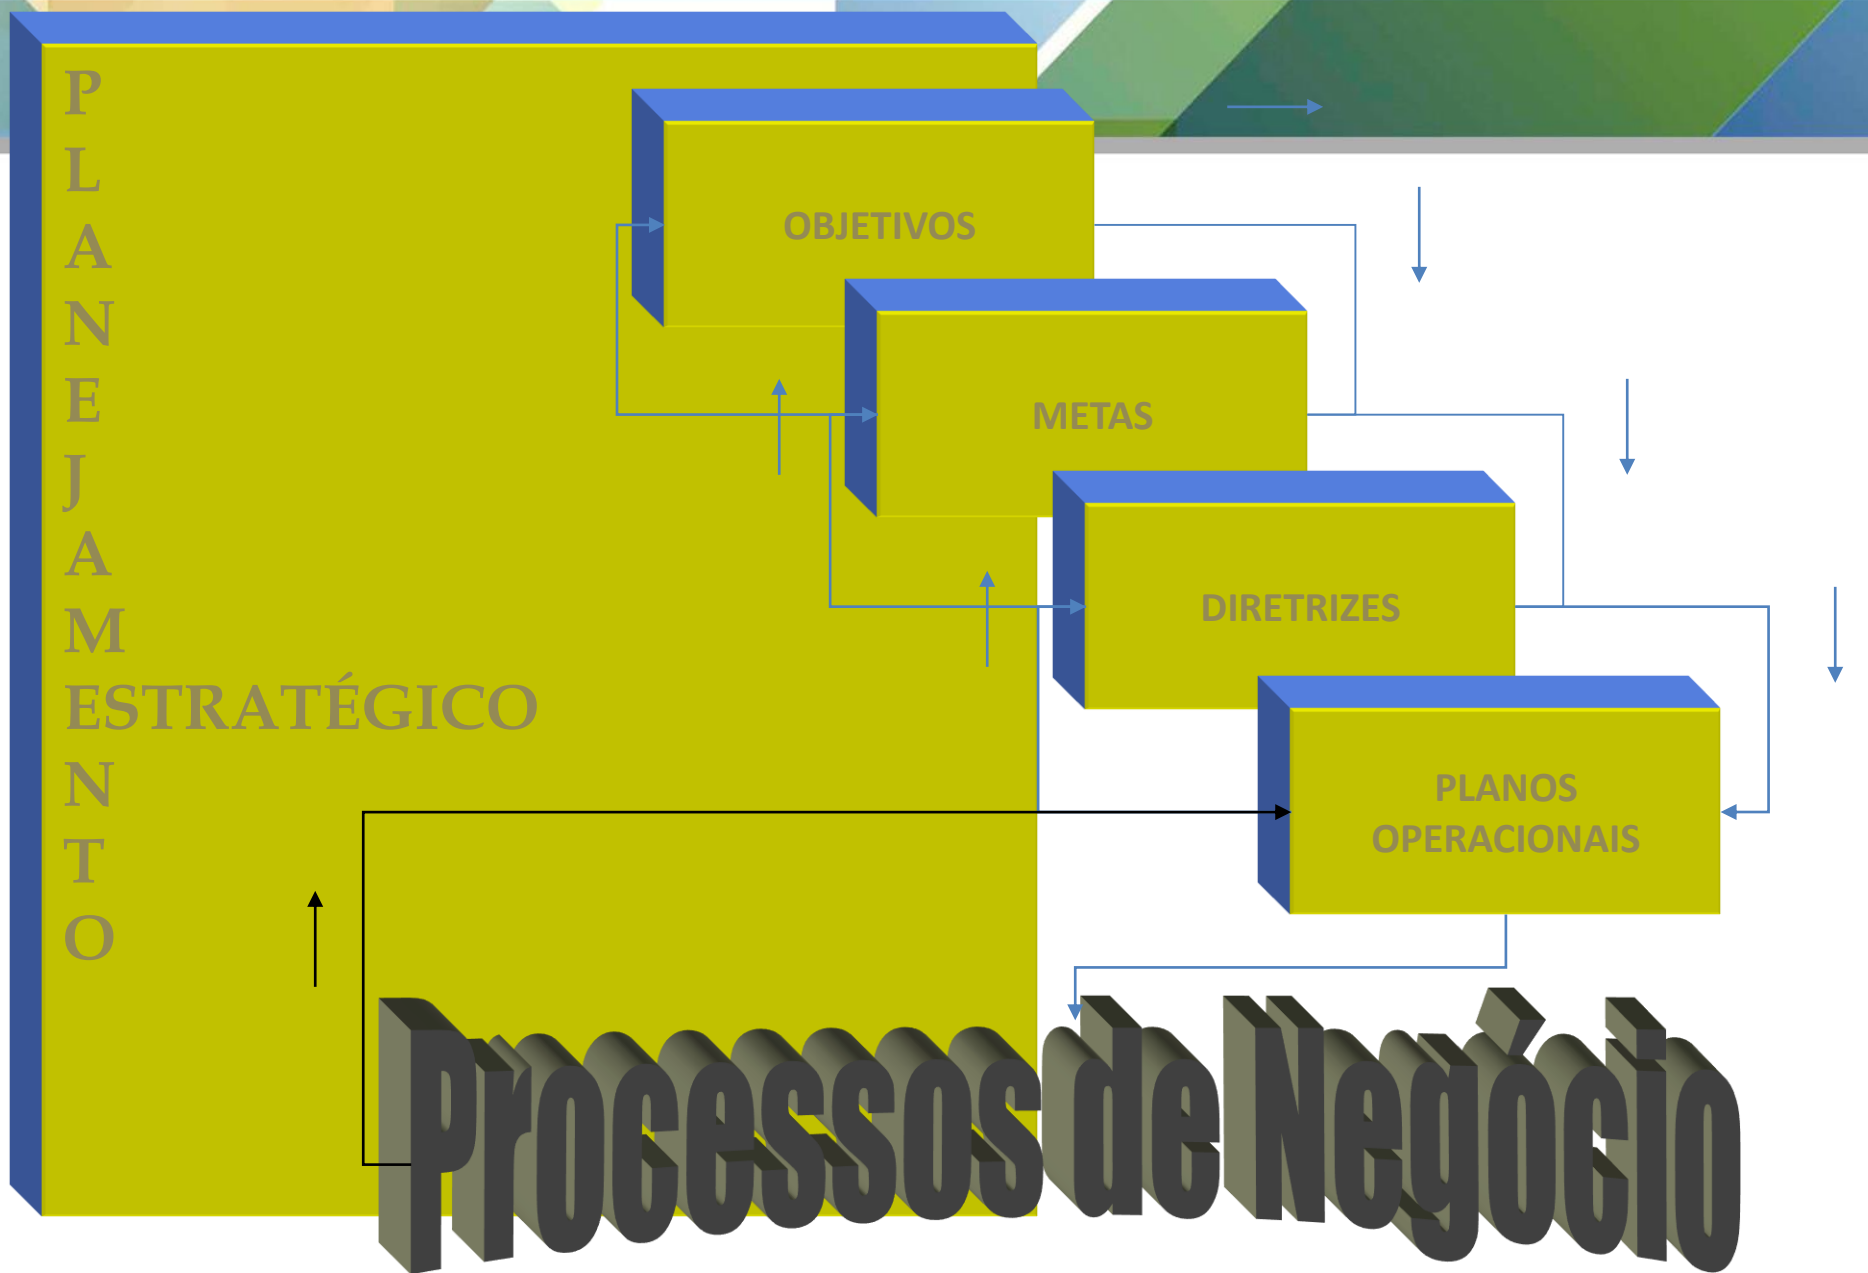


META



Fatores
Críticos de
Sucesso



OBSTÁCULO

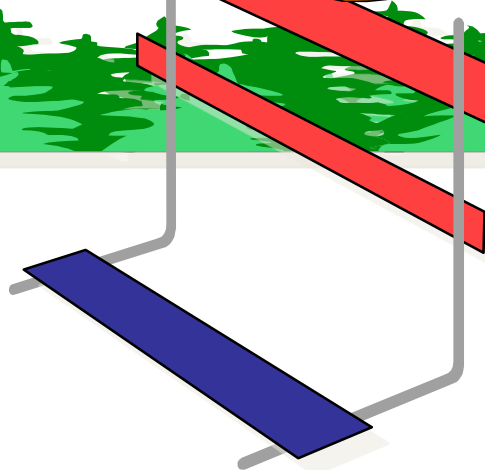

Tipos de Objetivos

Nível
institucional

Estratégico

- Envolve toda a organização.
- Direcionado a longo prazo.
- Focaliza o futuro e o destino.
- Ação global.

Nível
intermediário

Tático


- Envolve cada departamento.
- Direcionado a médio prazo.
- Focaliza o imediato.
- Ação departamental.

Nível
operacional

Operacional

- Envolve cada tarefa/atividade.
- Direcionado a curto prazo.
- Focaliza o imediato/presente.
- Ação específica.


Processo de Negócio

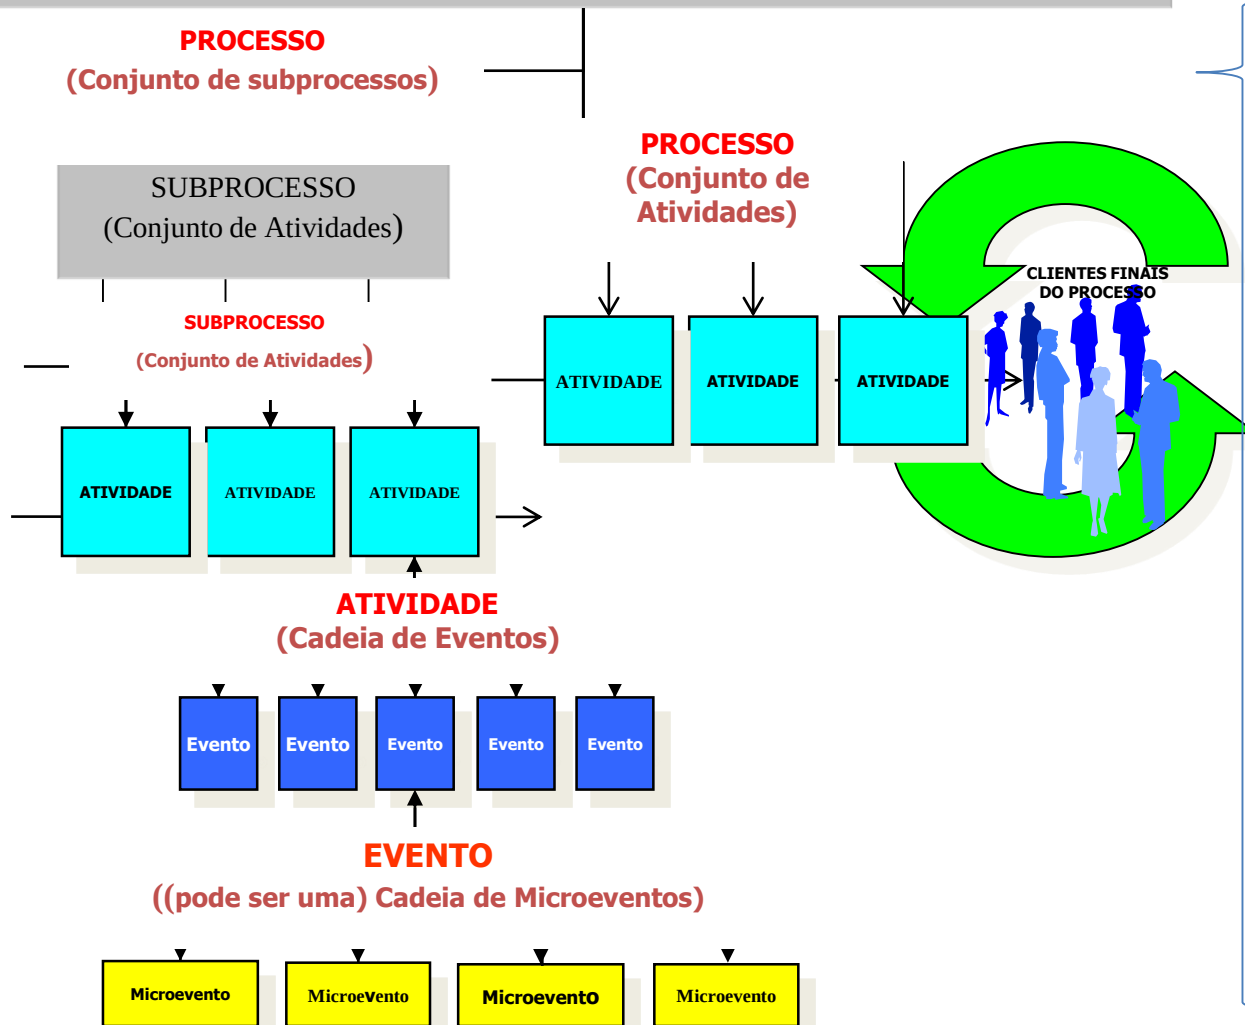


- Clientes externos.
- Clientes internos.
- Fornecedores externos.
- Fornecedores internos.
- Atividades.
- Eventos.
- Papéis funcionais.
- Procedimentos.
- Tarefas.
- Metas.
- Indicadores de desempenho.
- Regras de negócio.
- Exceções.
- Anomalias.
- Tempos.
- Rotas.

A Organização

Pessoas



**Primeiro
Plano**



**Segundo
Plano**

Tecnologias da Informação

Tecnologias

Problema

Como integrar processos
em primeiro plano e
processos em segundo
plano?



Primeira Diretriz

Os processos executados em primeiro plano devem estar **sempre** alinhados ao negócio, **nunca** à estrutura organizacional.



Segunda Diretriz

Os processos em segundo plano são **sempre** processos que apoiam os processos em primeiro plano. Essa ordem não deve ser invertida **nunca!**



Terceira Diretriz

Os processos em segundo plano devem ser mapeados, analisados, organizados e gerenciados com o mesmo rigor com que devem ser mapeados, analisados, organizados e gerenciados os processos em primeiro plano.



Referências Bibliográficas

Bibliografia Básica

CRUZ, T. *Sistemas, métodos e processos*. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

CRUZ, T. *Sistemas, organizações e métodos*. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

CARVALHO, M. *Gestão da Qualidade*. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. ISBN: 8535217525.

PROJECT Management Institute Inc. *Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos* (Guia PMBoK). 4ª. ed. Pennsylvania: PMI, 2008.

Bibliografia Complementar

CRUZ, T. *Gerência do Conhecimento*. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Editora E-Papers, 2007.

LAURINDO, J. *Tecnologia da Informação: planejamento e Gestão de Estratégias*. São Paulo: Atlas, 2008. ISBN 9788522451166.

PHILLIPS, J. *Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação*. Rio de Janeiro: Campus, 2003. ISBN: 9788535211832.

