FIAP ON

GESTÃO DE PROJETOS

INTEGRAÇÃO

2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Processo: “Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto”.....10
Figura 2 – Processo: “Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto” 13
Figura 3 – Processo: “Orientar e gerenciar o trabalho do projeto” 16
Figura 4 – Processo: “Gerenciar o Conhecimento do Projeto”.....18
Figura 5 – Processo: “Monitorar e controlar o trabalho do projeto” 19
Figura 6 – Processo: “Realizar o controle integrado de mudanças”.....21
Figura 7 – Ciclo de monitoramento e controle.....22
Figura 8 – Processo: “Encerrar o projeto ou a fase”.....24
Figura 9 – Exemplo de resumo da lista de marcos 27

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento 7
Quadro 2 – Exemplo de histórico de revisões 28
Quadro 3 – Exemplo de lista de marcos 30
Quadro 4 – Exemplo de orçamento e partes interessadas que o aprovam.....30

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 INTEGRAÇÃO 5
1.1 Processos a serem realizados 6
1.1.1 Promovendo a integração 6
1.1.2 Termo de Abertura do Projeto 9
1.1.3 Especificação de trabalho do projeto 10
1.1.4 Plano de negócios ou *business case* 11
1.1.5 Acordos 12
1.2 Gerenciando o projeto 12
1.2.1 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto 12
1.2.2 Opinião especializada para o Plano de Gerenciamento do Projeto 13
1.2.3 Plano de Gerenciamento do Projeto 13
1.3 Trabalho do projeto 15
1.3.1 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 15
1.3.2 Gerenciar o conhecimento do projeto 17
1.3.3 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 19
2 REALIZAR O CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS 21
2.1 Encerrar o projeto ou fase 22
2.2 Elaboração do Termo de Abertura 25
2.3 Exemplo de Termo de Abertura 28
REFERÊNCIAS 31

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 INTEGRAÇÃO

Um dos papéis fundamentais de todo bom gestor é a capacidade analítica – ou seja, de análise – da situação atual da empresa, e de que tarefas executar para atingir um novo resultado. Uma das formas de materializar nossos objetivos como gestores de tecnologia é por meio dos projetos. Mas são tantas as atividades, que se torna muito fácil perder o controle do projeto ou desenvolver partes dele que simplesmente não se encaixam. Essa é a importância dos processos de integração, que veremos a seguir.

Antes de prosseguirmos, cabe aqui algumas observações importantes. A visão analítica e do todo em um projeto está intimamente vinculada à capacidade de visão sistêmica e orgânica do ambiente onde ele se insere, assim como dentro do próprio projeto.

Principalmente para os gerentes de projetos, essa competência se desenvolve ao longo de vários anos de experiência e ela não se desenvolve de forma natural. É preciso que este profissional esteja atento e busque referências em conteúdos de boas práticas, como é o caso do PMBOK, seja na 6ª ou na 7ª Edição deste documento.

Em termos de visão sistêmica, o PMBOK 7ª Edição carrega vantagem em relação à versão 6, porém, a 7ª Edição é substancialmente exigente no que tange ao nível prévio de conhecimento e experiência do leitor.

Desta forma, se você é um iniciante, é recomendável que você siga pela versão 6, onde temos uma visão mais prática e prescritiva dos modelos e técnicas adotados em gerenciamento de projetos. E mesmo nesta versão, é necessário um estudo dirigido, que é o nosso objetivo aqui.

A 7ª Edição, por outro lado, carrega conteúdo mais sofisticado e é mais adequada para um público avançado em termos de experiência e conhecimentos em Gestão de Projetos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1 Processos a serem realizados

1.1.1 Promovendo a integração

Processos para a coordenação, consolidação, comunicação e ações integradoras são essenciais para o bom andamento e a conclusão de um projeto. Na 6ª Edição do PMBOK, encontramos um capítulo dedicado com processos que visam unificar as ações integradoras.

- **Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto:** desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto**.**
- **Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto:** definir, preparar e coordenar todos os componentes do plano e consolidá-los em um plano único e integrado de gerenciamento do projeto.
- **Orientar e gerenciar o trabalho do projeto:** liderar e realizar o trabalho definido no Plano de Gerenciamento do Projeto, bem como a implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto.
- **Gerenciar o Conhecimento do Projeto**: utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional.
- **Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto:** acompanhamento, análise e relato do progresso geral para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.
- **Realizar o Controle Integrado de Mudanças:** revisar todas as solicitações de mudança, aprová-las e gerenciá-las nas entregas; ativos de processos organizacionais; documentos do projeto e do plano de gerenciamento do projeto e comunicar a decisão tomadas.
- **Encerrar o Projeto ou a Fase:** finalização formal de todas as atividades para o projeto, fase ou contrato.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para que você se localize na estrutura do PMBOK, vamos resgatar a tabela onde cruzamos Áreas de Conhecimento com Grupos de Processos, porém, exatamente nesta área de conhecimento e veremos como esses processos se distribuem:

Áreas de conhecimento	4.Gerenciamento da integridade do projeto
Grupos de processos de iniciação	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto
Grupos de processos de planejamento	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
Grupos de processos de execução	4.3 Orientar e gerenciar o Trabalho do Projeto 4.4 gerenciar o Conhecimeto do Projeto
Grupos de processos de monitoramento e controle	4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.6 Realizar o Controle Integrado de mudanças
Grupos de processos de encerramento	4.7 Encerrar o Projeto ou Fase

Quadro 1 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento
Fonte: PMBOK 6ª Edição (2017)

A 7ª Edição do PMBOK trata a questão da Integração de forma mais ampla e distribuída ao longo do texto do documento. A preocupação com a integração das atividades e componentes do projeto se distribui entre:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Sistemas de Governança Organizacional** - O framework de governança pode incluir elementos de supervisão, controle, avaliação de valor, integração entre componentes e recursos de tomada de decisão.
- **Gerenciamento de produto** – Trata da integração de pessoas, dados, processos e sistemas de negócios para criar, atualizar e evoluir um produto ou serviço durante o seu ciclo de vida.
- **Pensamento Sistêmico** – Aplica-se a como a equipe do projeto vê a si mesma e às suas interações no sistema do projeto. O sistema de projeto geralmente reúne uma equipe de projeto diversificada, empenhada em trabalhar por um objetivo comum. As equipes de projeto devem operar conscientes e vigilantes em relação às mudanças na dinâmica do ambiente. As seguintes habilidades apoiam uma visão sistêmica do projeto:
    - Empatia com as áreas de negócios;
    - Pensamento crítico com foco no panorama geral;
    - Desafio de suposições e modelos mentais;
    - Busca de revisão externa e aconselhamento;
    - Uso de métodos, artefatos e práticas integrados para que haja um entendimento comum do trabalho do projeto, das entregas e dos resultados;
    - Uso de modelagem e cenários para prever como a dinâmica do ambiente pode interagir e reagir; e
    - Gerenciamento proativo da integração para ajudar a alcançar os resultados do negócio.

Percebeu como o PMBOK na 6ª Edição é mais prescritivo e objetivo no que se refere de gerenciar a integração entre as partes, atividades e recursos de um projeto?

É mais fácil de compreender a importância da gestão da integração em um projeto desta forma, porém, isso não invalida o formato de compreensão e a preocupação deste mesmo tema na versão 7, pois nela temos uma visão distribuída

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

em temas importantes e específicos. Podemos dizer que ambas as edições se complementam.

1.1.2 Termo de Abertura do Projeto

Pertencente ao grupo de processos de iniciação, um dos primeiros passos do projeto é desenvolver um artefato conhecido como Termo de Abertura do Projeto ou *Project Charter.* Seus principais objetivos são: formalizar a existência do projeto na organização, fortalecer o compromisso das partes envolvidas e conceder ao gerente de projetos a autoridade necessária para transformá-lo em realidade.

Sendo assim, ele é, praticamente, a “certidão de nascimento” do projeto. É este artefato que o formaliza perante a organização, apresentando o gerente de projetos como o principal responsável por fazê-lo acontecer.

Enquanto na 6ª Edição do PMBOK encontramos um processo exclusivo para a produção deste documento, na 7ª Edição ele é citado na seção 4, em Modelos, Métodos e Artefatos como um componente estratégico para a correta iniciação de um projeto.

> **Termo de Abertura do Projeto**. Um documento publicado pelo iniciador ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto. (PMI, GUIA PMBOK, 7ª EDIÇÃO, 2021)

Vejamos, então, o processo da 6ª Edição em seus componentes, que, na saída, produzem o Termo de Abertura do Projeto. Mais adiante, veremos em detalhes a estrutura de composição deste documento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1 – Processo: “Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado pela FIAP (2019)

1.1.3 Especificação de trabalho do projeto

Também conhecido como *Statement of Work* (SOW), trata-se de um documento que contém uma descrição narrativa dos produtos e serviços a serem entregues por um projeto. No caso de projetos internos, este documento é fornecido pelo departamento responsável ou patrocinador, enquanto, em projetos externos, o cliente fornece tal especificação na forma de uma licitação ou parte de um contrato. A especificação do trabalho do projeto contém:

- **Necessidade de negócios:** pode ser originada a partir de um requisito legal, regulamentação governamental, demanda de mercado ou avanço tecnológico. Geralmente, essa necessidade e sua viabilidade são justificadas pelo *business case.*
- **Descrição do escopo do projeto:** documenta as características do produto ou serviço que o projeto terá de criar para atender à necessidade de negócio.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Plano estratégico:** todo projeto deve estar alinhado com o plano estratégico de sua empresa, contribuindo para atingi-lo. Aqui se documentam a visão estratégica, as metas e os objetivos da organização com os quais o projeto está alinhado.

1.1.4 Plano de negócios ou *business case*

Documento que possui as informações necessárias do ponto de vista de negócio, determinando se o projeto justifica ou não seu investimento. Desenvolvido antes de o projeto começar, normalmente por um analista de negócios com base em várias informações das partes interessadas, geralmente é utilizado no processo decisório para definir se o projeto será realmente realizado ou não (o chamado *go/no go*).

O plano de negócios é gerado a partir de um ou mais fatores, como:

- **Solicitação do cliente:** um projeto para a construção de uma nova unidade acadêmica que atenda aos novos cursos de uma faculdade.
- **Necessidade organizacional:** a implementação de um sistema de ERP que resultará em maior controle nos processos e em redução de custos.
- **Requisito legal:** a implementação de uma nova declaração contábil, como o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que substitui o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) (PIS e Cofins).
- **Demanda de mercado:** um novo modelo de carro para substituir o atual produto.
- **Avanço tecnológico:** a implementação de um sistema de nota fiscal eletrônica, gerando notas que não precisarão ser impressas.
- **Necessidades de natureza social:** um projeto para arrecadação de alimentos e sua distribuição para ONGs.
- **Impactos ecológicos:** um projeto para captação pluvial em um edifício para uso em sanitários e irrigação de seus jardins.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Integração

Em projetos de grande duração, o plano de negócios deve ser revisitado e revisado frequentemente, assegurando que o projeto continue no caminho certo e alinhado com os interesses da organização.

1.1.5 Acordos

Reúnem-se aqui todas as intenções iniciais do projeto. São contratos, Memorandos de Entendimento (MoUs), Acordos de Nível de Serviço (ANSs), cartas de acordos e intenções, e-mails, acordos verbais e por escrito.

1.2 Gerenciando o projeto

1.2.1 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto

Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto é o processo de consolidação, em um único documento, do Plano de Gerenciamento Integrado do Projeto. O principal benefício desse processo é a produção de um documento abrangente que define a base de todo o trabalho do projeto e como o trabalho será realizado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

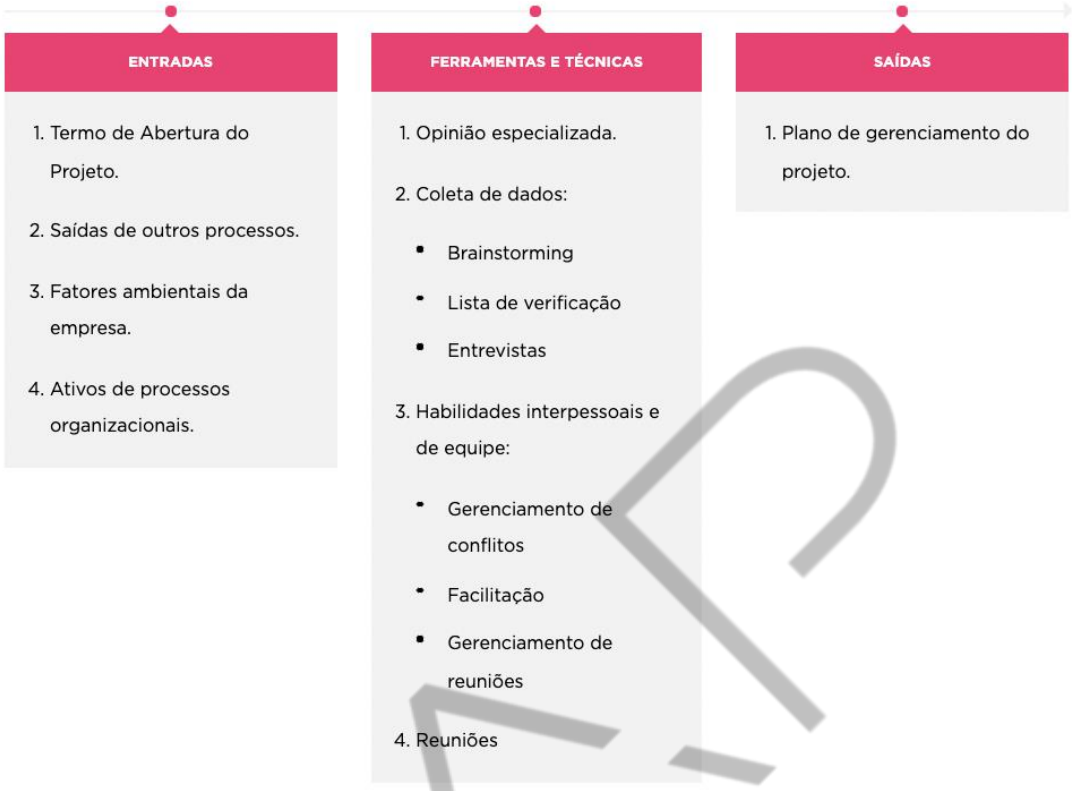

Figura 2 – Processo: “Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado pela FIAP (2019)

1.2.2 Opinião especializada para o Plano de Gerenciamento do Projeto

É útil para:

- Identificar detalhes técnicos e gerenciais a serem incluídos no plano.
- Determinar recursos humanos e níveis de habilidades necessárias para executar o trabalho do projeto.
- Identificar documentos do projeto sujeitos ao processo formal de controle de mudanças.

1.2.3 Plano de Gerenciamento do Projeto

Geralmente fragmentado em muitas partes, chamadas de planos auxiliares, sendo cada uma delas dedicada a uma área de conhecimento (escopo, cronograma,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

custos, riscos, comunicações, entre outras), este documento define como o projeto é executado, monitorado/controlado e encerrado.

Seu conteúdo e detalhamento variam dependendo de sua área de aplicação e complexidade.

- **Plano de Gerenciamento do Escopo**: estabelece como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e validado.
- **Plano de Gerenciamento dos Requisitos**: determina como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados.
- **Plano de Gerenciamento do Cronograma**: estabelece os critérios e as atividades para desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma.
- **Plano de Gerenciamento dos Custos**: estabelece como os custos serão planejados, estruturados e controlados.
- **Plano de Gerenciamento da Qualidade**: determina como as políticas da qualidade, metodologias e padrões de uma organização serão implementados no projeto.
- **Plano de Gerenciamento dos Recursos**: fornece orientação sobre como os recursos do projeto devem ser categorizados, alocados, gerenciados e liberados.
- **Plano de Gerenciamento das Comunicações**: define como, quando e por quem informações sobre o projeto serão administradas e divulgadas.
- **Plano de Gerenciamento dos Riscos**: estabelece como as atividades de gerenciamento de risco serão estruturadas e realizadas.
- **Plano de Gerenciamento das Aquisições**: determina como a equipe do projeto irá adquirir bens e serviços de fora da organização executora.
- **Plano de Engajamento das Partes Interessadas:** define como as partes interessadas serão engajadas nas decisões e execução do projeto, de acordo com suas necessidades, interesses e impactos.

Aqui cabe, novamente, uma observação importante entre as abordagens do PMBOK na 6ª e na 7ª Edição. Na 6ª Edição, encontramos um processo exclusivo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

descrevendo como produzir, em toda a sua extensão, um Plano de Gerenciamento do Projeto. Nesta edição, pouca atenção é dada à dosagem desta abordagem, evitando que se desenvolva um documento extenso e pouco útil em projetos de porte menor.

Já na 7ª Edição, encontramos uma maior sensibilidade em contextualizar as práticas de acordo com as características do projeto, ambiente de execução e cultura da empresa.

É o que chamamos de Tailoring tratado na seção 3 do PMBOK 7ª edição. Tailoring consiste em ajustar e adaptar as ferramentas e técnicas utilizadas na Gestão do Projeto, conforme o ambiente, projeto e contexto, para otimizar o seu desempenho.

Observe o que a versão 7 fala a respeito do Plano de Gerenciamento do Projeto.

> Grandes projetos podem combinar os artefatos de planejamento em um Plano de Gerenciamento do Projeto Integrado. Para projetos menores, um Plano de Gerenciamento do Projeto detalhado será ineficiente. Independentemente do tempo, frequência e grau de planejamento, os vários aspectos do projeto precisam permanecer alinhados e integrados. (PMI, GUIA PMBOK, 7ª EDIÇÃO, 2021).

E nesta mesma versão na seção 4, encontramos menção a todos os possíveis planos que um projeto pode exigir. Cabe, portanto, sensibilidade em não sobrecarregar um plano de projeto com temas que não são relevantes só porque está escrito no PMBOK, seja qual for a sua edição.

Um plano de projeto precisa ser objetivo e funcional. Nada de excessos irrelevantes e burocráticos, pois corre-se o risco de perder o foco.

1.3 Trabalho do projeto

1.3.1 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto

Processo que compreende coordenar a realização de trabalhos que foram definidos no Plano de Gerenciamento do Projeto, implementando eventuais mudanças aprovadas para atingir os objetivos estabelecidos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Documentos de projeto: • Registro das mudanças • Registro das lições aprendidas • Lista de marcos • Comunicações do projeto • Conograma do projeto • Matriz de rastreabilidade dos requisitos • Registro dos riscos • Relatório de riscos 3. Solicitações de mudanças aprovadas. 4. Fatores ambientais da empresa. 5. Ativos de processos organizacionais.	1. Opinião especializada. 2. Sistema de informações de gerenciamento de projetos. 3. Reuniões.	1. Entregas. 2. Dados de desempenho do trabalho. 3. Registro das questões. 4. Solicitações de mudança. 5. Atualizações no Plano de Gerenciamento do Projeto: • Lista de atividades • Registro de premissas • Registro das lições aprendidas • Documentação dos requisitos • Registro dos riscos • Registro das partes interessadas 6. Atualizações nos documentos do projeto. 7. Atualizações de ativos de processos organizacionais.

Figura 3 – Processo: “Orientar e gerenciar o trabalho do projeto”
Fonte: PMBOK (2017), 6ª Edição, adaptado pela FIAP (2019)

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto inclui:

- **Ações corretivas:** orientações para que o trabalho do projeto seja executado de modo que seu desempenho futuro esperado fique de acordo com o plano de gerenciamento.
- **Ações preventivas:** orientações para a realização de uma atividade que possa reduzir a probabilidade de consequências negativas associadas aos riscos do projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Reparos de defeito:** formalização de um defeito em um componente do projeto com a recomendação para reparar o defeito ou substituir o componente.

Observe que, enquanto o PMBOK 6ª edição é bem específico neste tema, a 7ª Edição é mais abrangente e sistêmica. Podemos dizer que este tema permeia quase toda a extensão desta versão.

1.3.2 Gerenciar o conhecimento do projeto

Gerenciar o conhecimento do projeto é o processo de utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional. O principal benefício desse processo é que conhecimentos organizacionais anteriores sejam aproveitados para produzir ou aprimorar os resultados do projeto e que conhecimentos criados pelo projeto fiquem também disponíveis para apoiar as operações organizacionais e outros projetos ou fases futuras.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

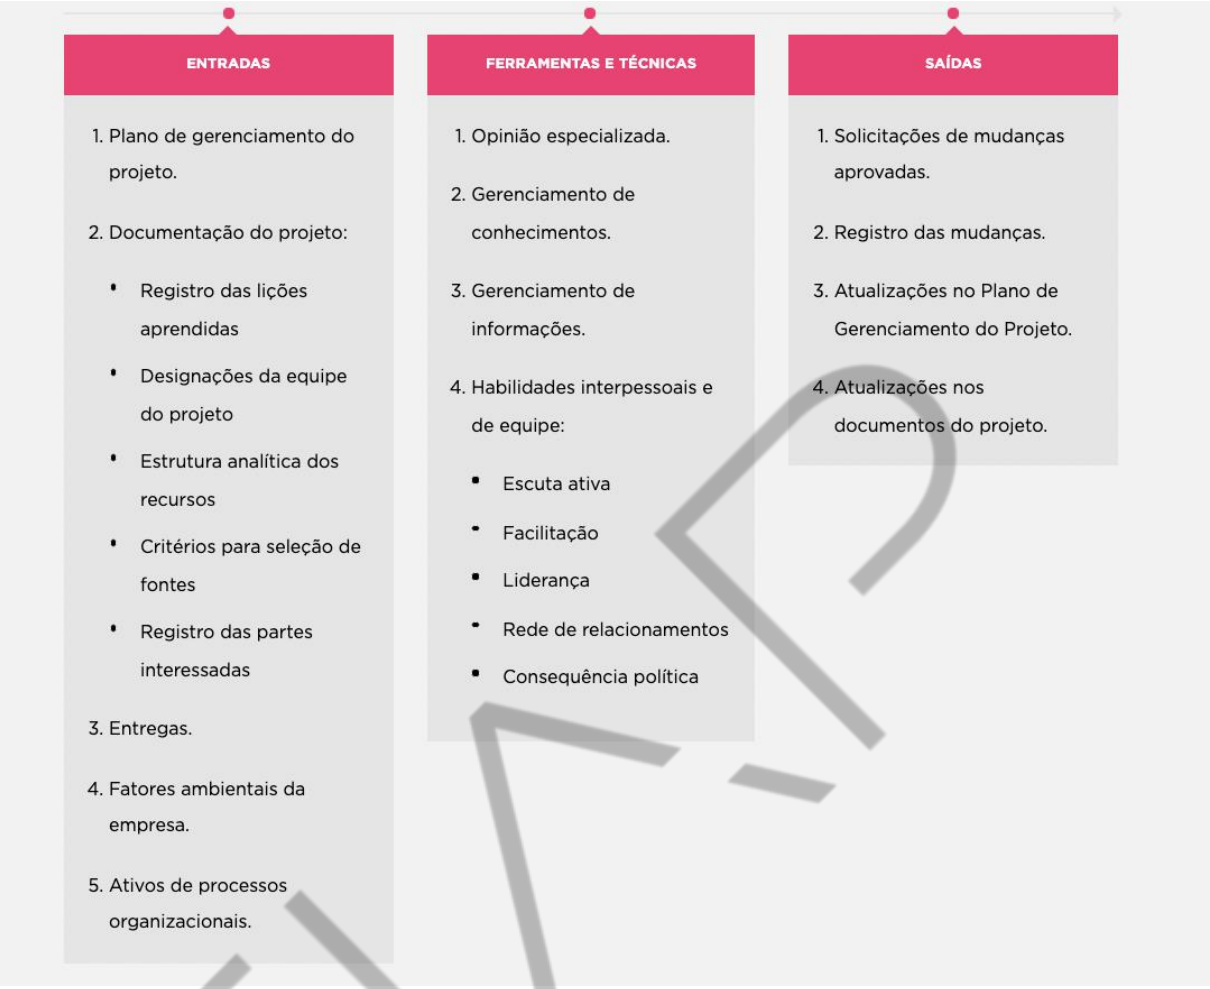

Figura 4 – Processo: “Gerenciar o Conhecimento do Projeto”
Fonte: PMBOK (2017), 6ª Edição adaptado pela FIAP (2019)

A Gestão do Conhecimento é outro tema recorrente em quase toda a extensão do PMBOK 7ª edição. Ele permeia desde seções como Sistema de Entrega de Valor, Princípios de Gerenciamento de Projetos, Domínios de Desempenho e Modelos, Métodos e Artefatos.

Isso porque gerenciar o conhecimento assume vários aspectos que, dificilmente, você conseguiria cobrir em um único processo, como é o caso da 6ª edição. Por outro lado, é preciso um ponto de partida no entendimento deste tipo de gestão e aí que encontramos a vantagem nesta 6ª edição. Um ponto de partida que pode ser expandido e aperfeiçoado posteriormente pela leitura da 7ª Edição.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.3 Monitorar e controlar o trabalho do projeto

Processo que compreende acompanhar, analisar e documentar o progresso dos trabalhos, visando atingir as metas de desempenho definidas no Plano de Gerenciamento do Projeto.

Figura 5 – Processo: “Monitorar e controlar o trabalho do projeto”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado pela FIAP (2019)

Na 6ª Edição, você irá observar que, além da área de Gestão da Integração do Projeto, em todas as demais áreas de conhecimento teremos sempre um processo de controle do tema que se discute. Por exemplo, no tema Gerenciamento do Cronograma do Projeto, temos o Processo 6.6 – Controlar o Cronograma.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Integração

A junção de todos os demais processos de monitoramento e controle é consolidada e harmonizada no processo de Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto apresentado aqui.

Já a 7ª Edição, muito embora aborde essa questão com ênfase, ela não se preocupa em ser específica para cada área de conhecimento, mas, sim, indicando vários elementos qualitativos e de competências que tanto a Gestão do Projeto quanto equipes devem desenvolver e estarem atentas no que tange ao monitoramento e controle.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 REALIZAR O CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

Processo conduzido do início ao final do projeto, compreendendo a revisão de todas as solicitações de mudança e, em caso de aprovação, gerenciar as mudanças que devem ser feitas nas entregas, eventuais mudanças de linha de base, entre outros.

Figura 6 – Processo: “Realizar o controle integrado de mudanças”
Fonte: PMBOK (2017), 6ª Edição adaptado pela FIAP (2019)

Mudanças podem ser solicitadas por qualquer parte interessada do projeto. Embora possam ser iniciadas verbalmente, deverão sempre ser registradas de maneira escrita e formal, seguindo um fluxo estabelecido no gerenciamento de mudanças.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Normalmente, é realizada uma análise de impacto dessas mudanças, identificando o acréscimo no trabalho e o seu custo, devendo, portanto, serem submetidas e aprovadas pelo patrocinador do projeto antes de serem colocadas em prática.

Aqui cabe realçar uma vantagem indiscutível da 6ª sobre a 7ª Edição do PMBOK. Se você quer entender de forma direta e objetiva um sistema de controle integrado de mudanças, a 6ª Edição cumprirá esse objetivo. Já a 7ª edição discute sistemas de controle de mudanças de forma bem qualitativa nas seções Domínios de Desempenho e Tailoring.

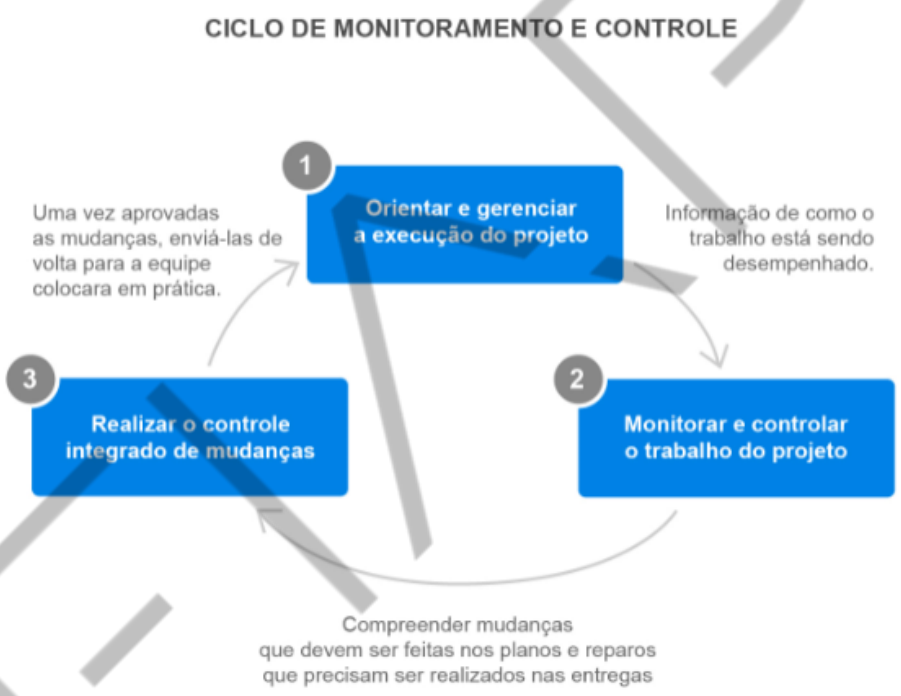

Figura 7 – Ciclo de monitoramento e controle
Fonte: FIAP (2019)

2.1 Encerrar o projeto ou fase

Compreende o processo de finalização de todas as atividades de gerenciamento de projeto para encerrar formalmente uma fase ou todo o projeto.

Como resultado, temos os seguintes artefatos:

- **Lições aprendidas:** coletar todos os registros do projeto – sejam êxitos ou fracassos, atualização à base de lições aprendidas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Arquivamento de informações do projeto:** no caso de encerramento do projeto, o arquivamento de todos os seus artefatos é importante, servindo no futuro como referências e histórico.
- **Encerramento formal:** após o aceite do cliente, tem-se o encerramento formal do projeto ou de uma fase.
- **Liberação de recursos organizacionais:** os recursos humanos e equipamentos utilizados pelo projeto podem ser liberados e utilizados em outros projetos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Termo de abertura do projeto. 2. Plano de Gerenciamento do Projeto. 3. Documentos do projeto: • Registro de premissas • Bases das estimativas • Registro das mudanças • Registro de questões • Registro das lições aprendidas • Lista de marcos • Comunicações do projeto • Medições de controle da qualidade • Relatório de qualidade • Documentação dos requisitos • Registro dos riscos • Relatório de riscos 4. Entregas aceitas. 5. Documentos de negócios: • Business case • Plano de Gerenciamento de Benefícios 6. Acordos. 7. Documentação de aquisições. 8. Ativos de processos organizacionais.	1. Opinião especializada. 2. Análise de dados: • Análise de documentos • Análise de tendência • Análise de variação 3. Reuniões.	1. Atualizações nos documentos do projeto. 2. Registro das lições aprendidas. 3. Transição do produto, serviço ou resultado final. 4. Relatório final. 5. Atualizações de ativos de processos organizacionais.

Figura 8 – Processo: “Encerrar o projeto ou a fase”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado por FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A 7ª Edição do PMBOK aborda o tema de encerramento de um projeto com certa recorrência em várias partes do seu texto e, por esta razão, mais uma vez a balança pende para a 6ª Edição. Nela, você encontrará um entendimento bem objetivo da importância desta etapa. Quem já experimentou alguma vivência em Gestão de Projetos sabe quanto é conturbado encerrar um projeto quando faltam a sistematização e a objetividade em validar e formalizar as suas entregas.

Assim como na iniciação de um projeto, neste processo, encontramos elementos prescritivos e importantes para garantir a correta formalização do término de um projeto.

2.2 Elaboração do Termo de Abertura

Como desenvolver este artefato tão importante? Não existe um formato-padrão (*template*) para um Termo de Abertura, embora seja praticamente um consenso que ele não pode ser um documento muito longo. Primeiramente, porque, em geral, é o primeiro documento formal após o aceite do projeto e, normalmente, não dispõe de tantas informações assim, já que muitos detalhes são levantados durante o planejamento. Além disso, o documento não pode fugir de seu propósito, que é apresentar formalmente o projeto e o seu gerente a todas as partes interessadas.

Um bom Termo de Abertura deve conter:

- **Nome do projeto, nome do documento e versão:** geralmente no cabeçalho ou na capa do documento, o projeto deverá ser identificado na organização por algum nome. É importante que o tipo do documento esteja identificado – TERMO DE ABERTURA –, pois um projeto terá vários documentos ao longo de sua vida. Ele deve ser “versionado”, visto que os documentos serão constantemente revisados, podendo sofrer alterações, as quais serão observadas em sua versão e controladas pelo histórico de revisões.
- **Histórico de revisões:** cada alteração realizada em um documento deve ser formalizada neste item, que, normalmente, conta com data, versão, responsável e teor da alteração. Dessa maneira, quem já leu uma versão

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

anterior do documento pode se inteirar das novidades e realizar a leitura apenas dos novos trechos.

- **Nome do gerente do projeto e seu nível de autoridade:** indispensável em qualquer Termo de Abertura. Quem é o grande responsável pelo projeto e, além disso, qual é seu nível de autoridade? Existem projetos cuja verba é disponibilizada ao GP, que tem plena autoridade para fazer como bem entender. Em outros, sua autoridade é reduzida, submetendo-se as solicitações à hierarquia preexistente na empresa.
- **Propósito e justificativa do projeto:** salienta a sua importância. Tais informações podem ser encontradas na declaração do trabalho (SOW) do projeto e *business case*.
- **Descrição geral do produto:** uma descrição sucinta do produto do projeto e as principais entregas que serão realizadas. Deve ser uma descrição objetiva, facilitando o entendimento das partes interessadas.
- **Requisitos mínimos:** relação dos requisitos, funcionalidades ou características absolutamente indispensáveis do produto do projeto.
- **Justificativa de negócio, incluindo a análise de retorno de investimento:** informações constantes no *business case,* justificando o projeto do ponto de vista de negócio.
- **Influências das partes interessadas (*stakeholders*):** uma listagem das partes interessadas do projeto e sua influência – se ela é positiva ou negativa.
- **Envolvimento de outros departamentos:** mapeando os departamentos que estão envolvidos no projeto e seu nível de engajamento.
- **Premissas:** tudo aquilo que é prometido. Em um planejamento de projeto, algumas promessas surgem e o cumprimento de tais promessas é incerto. Parte-se da **premissa** de que as promessas serão cumpridas. Exemplo: “Os servidores de desenvolvimento do sistema, responsabilidade do Departamento de TI, estarão disponíveis a partir de fevereiro”. Todo o planejamento, de fevereiro adiante, parte de tal premissa e é por essa razão que isso deve ser documentado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Restrições:** tudo aquilo que restringe, ou seja, limita a ação de um gerente de projetos e sua equipe. Trata-se de uma obrigação. Exemplos: “O sistema deverá utilizar um banco de dados relacional *Oracle Database 12c Standard Edition.*” Pode-se usar uma versão mais antiga? Ou um *Microsoft SQL Server*? Ou um banco de dados não relacional? A resposta a essas três perguntas é uma só... Não!

- **Lista de Marcos:** um resumo de cronograma, apenas com as principais etapas e marcos do projeto, e uma estimativa de duração de cada um em uma linha do tempo, conforme exemplificado na Figura “Exemplo de resumo da lista de marcos.”

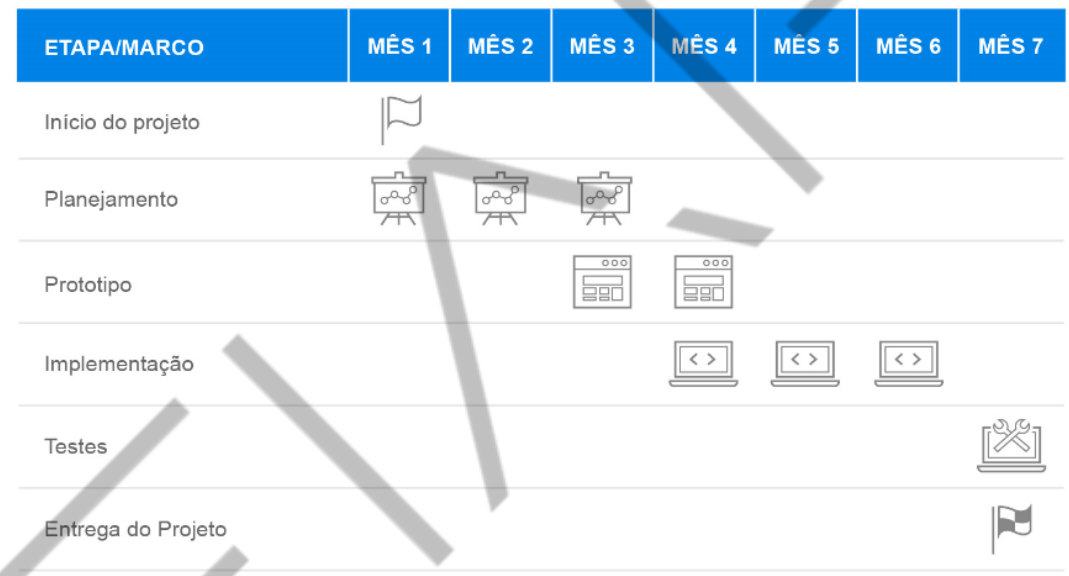

Figura 9 – Exemplo de resumo da lista de marcos
Fonte: FIAP (2019)

- **Previsão de conclusão e resumo do orçamento:** uma equipe de profissionais experientes pode elencar as principais atividades de um projeto, estimando sua duração e custos. Deve haver, logo no início do projeto, uma estimativa de prazos e custos a ser estabelecida como meta, que pode ter sido fornecida pelo *business case.* Conforme dito, trata-se de uma estimativa, portanto, esperam-se variações na ordem de 30% a 50%, já que o planejamento detalhado é realizado em uma etapa posterior.

- **Nome, autoridade e assinatura do patrocinador e/ou outras autoridades:** simbolismo importante para dar credibilidade, apoio e força ao projeto e seu gerente, que ocorre em uma etapa posterior.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.3 Exemplo de Termo de Abertura

- **Histórico de revisões:**

Versões	Data	Responsável	Descrição
1.0	01/01 2020	Paulo Mentor	Versão inicial do documento
1.1	03/06/2020	Paulo Mentor	Revisão do orçamento

Quadro 2 – Exemplo de histórico de revisões
Fonte: FIAP (2019)

- **Gerente de projeto e sua autoridade:**

Paulo Mentor é o gerente do projeto, sua autoridade é total na esfera da divisão, podendo contratar, gerenciar o pessoal e realizar compras de acordo com seus próprios critérios, que serão formalizados no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos e Aquisições, respectivamente. No aspecto financeiro, sua autoridade estará limitada conforme definido no Plano de Gerenciamento de Custos.

- **Propósito e justificativa do projeto:**

A empresa **Quero Meu Board Game Ltda.** solicitou à consultoria **Webber Sistemas Ltda.** o desenvolvimento de um sistema de comércio eletrônico que realizará vendas de jogos de tabuleiro importados.

- **Descrição geral do produto:**

Trata-se do desenvolvimento de um sistema de comércio eletrônico, em modalidade B2C (*Business to Consumer*), para a venda de jogos de tabuleiro importados em âmbito nacional, com sistema de pagamento baseado em *bitcoins*.

- **Requisitos mínimos:**
  - Galeria de Produtos.
  - Busca de Produto.
  - Área do Cliente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Integração

- Carrinho de Compras.
- Cadastrar Cliente.
- Realizar Pagamento.

- **Justificativa de negócio:**

De acordo com o *business case* fornecido pelo cliente, o mercado de jogos de tabuleiro está em franco crescimento, crescendo 400% por ano de acordo com levantamentos realizados nos últimos três anos. Em uma análise da concorrência, não existem concorrentes profissionais identificados, representando uma grande oportunidade de negócio.

- **Influência das partes interessadas:**

Cliente/Patrocinador – Influência Positiva – espera-se total colaboração para a conclusão do projeto no prazo e custo estimados.

- **Envolvimento de outros departamentos:**

Jurídico: assinado em eventuais impasses com o cliente que não possam ser resolvidos em âmbito técnico.

- **Premissas:**

O logotipo e a identidade visual são de responsabilidade do cliente, que deverá fornecê-los antes da fase de desenvolvimento do sistema.

- **Restrições:**

O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem de programação PHP, compatível com a versão 5.5 e armazenar informações em um sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL na versão 9.1.

- **Lista de Marcos:**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE MARCOS						
ETAPA/MARCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Início do projeto	X					
Planejamento	X	X				
Implementação			X	X	X	
Testes						X
Entrega do projeto						X

Quadro 3 – Exemplo de lista de marcos
Fonte: FIAP (2019)

- **Previsão de entrega:**

A execução dos trabalhos terá início em janeiro de 2022 e deve durar aproximadamente seis meses.

- **Orçamento:**

O orçamento para este projeto é de R$ 30 mil (custos internos não serão considerados).

APROVAÇÕES	
João Barros (Diretor / Consultoria)	03 de Janeiro de 2022
Felipe Almeida (Cliente / Patrocinador)	03 de Janeiro de 2022

Quadro 4 – Exemplo de orçamento e partes interessadas que o aprovam
Fonte: FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (GUIA PMBOK)**. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (GUIA PMBOK)**. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com
