FIAP ON

GESTÃO DE PROJETOS

RISCOS

8

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Compreender riscos 5
Figura 2 – Processos de gerenciamento de riscos.....6
Figura 3 – Relacionamentos entre princípios, estrutura e processo da ISO 31000...8
Figura 4 – Componentes da estrutura de gestão de riscos do padrão ISO 31000....10
Figura 5 – Processo de gestão de risco do padrão ISO 31000 13
Figura 6 – Mapa de Risco 15
Figura 7 – Processo “Planejar o Gerenciamento dos Riscos” 19
Figura 8 – Processo “Identificar Riscos”.....20
Figura 9 – Processo “Realizar a análise qualitativa dos riscos” 21
Figura 10 – Processo “Realizar a análise quantitativa dos riscos” 22
Figura 11 – Processo “Planejar as Respostas aos Riscos”.....23
Figura 12 – Processo “Implementar Respostas aos Riscos”.....23
Figura 13 – Processo “Monitorar os Riscos” 24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 RISCOS.....4
1.1 Introdução 4
1.2 Definição de risco.....4
1.3 Como gerenciar riscos – o padrão ISO 31000 7
1.4 Princípios da gestão de riscos.....8
2 ESTRUTURA PARA GESTÃO DE RISCOS 10
2.1 Processo para gestão de riscos 12
2.2 Gestão de riscos em projetos.....18
REFERÊNCIAS.....26

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 RISCOS

1.1 Introdução

O tempo parece passar cada vez mais rápido devido às inúmeras mudanças que estamos presenciando no cenário atual, sendo a maioria delas causada pela tecnologia e muitos são os riscos que nos perseguem!

Toda mudança incorre em riscos, seja ela na sua vida, na empresa, no planeta. Vale a pena saber gerenciá-los da melhor forma para não ser pego de surpresa.

Neste capítulo, vamos conhecer formas de identificar, avaliar e gerir um risco.

Chega de surpresas!

1.2 Definição de risco

Na Grécia Antiga, o dom da ***mántis*** – a previsão – tem sua importância retratada na mitologia por meio de Tirésias, o profeta de Tebas que ficou cego por vingança ao decidir uma discussão entre Hera e Zeus, que o compensou com o dom após o castigo aplicado pela deusa. Na mitologia romana, a boa e a má sorte eram domínios da deusa Fortuna, filha de Júpiter, cuja roda decidia o destino da humanidade.

No entanto, a dádiva e o infortúnio eram considerados desígnios divinos, assim como a habilidade de prever o futuro, restando a nós, mortais, apenas nos resignar e sofrer as consequências. Essa visão mudou com uma ideia revolucionária: **o domínio do risco**, ou seja, o ser humano não é passivo perante os acontecimentos, ele pode prevê-los – baseado em histórico de acontecimentos passados – e se antever a eles.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 1 – Compreender riscos
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

O livro de Peter Bernstein – *O Desafio aos Deuses* – conta a história de um grupo de pensadores cuja visão revolucionária era como pôr o futuro a serviço do presente, compreendendo o risco, medindo e avaliando as suas consequências, tornando o ato de correr riscos um catalisador que impulsiona a sociedade ocidental moderna.

A capacidade de definir o que poderá acontecer no futuro e de optar entre alternativas é fundamental nas sociedades contemporâneas, guiando os processos de tomada de decisões utilizadas desde a área militar à economia, por todas as nações do mundo.

A palavra "risco" deriva do italiano antigo ***risicare***, que significa ousar, e no sentido de incerteza, é derivada do latim ***risicu*** e ***riscu***, ou seja, é um conjunto de incertezas encontradas quando ousamos fazer algo. Entendemos assim que o risco é uma opção e não um destino inevitável e sobrenatural – é a ação que ousamos tomar, que depende de um certo grau de liberdade de opção.

No campo da Administração e Gerência, definimos a palavra **risco** como sendo o resultado da combinação entre a probabilidade de uma determinada oportunidade ou ameaça acontecer e o impacto resultante caso ela ocorra.

Conhecer os riscos é ganhar mobilidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Riscos

Como disciplina administrativa, o gerenciamento de riscos aparece de forma mais estrutural nas empresas a partir dos anos de 1950, quando grandes empreendimentos de engenharia, principalmente na indústria aeroespacial, demandavam um olhar mais constante e processual de análise, bem como métodos mais sofisticados de mensuração e tratamento dos riscos.

Inicialmente, o gerenciamento de risco era uma abordagem sob demanda e tratada por poucos dentro das organizações. Assim como a gestão de qualidade, o gerenciamento de risco foi sofrendo um processo gradual de introdução e sistematização nas culturas empresariais.

Com a incidência cada vez maior de projetos dentro das organizações, que são inerentemente suscetíveis a riscos, gerenciar riscos em projetos se tornou disciplina fundamental.

As primeiras versões do PMBOK já em 1985, conhecida como projeto ESA – Ethics, Standard & Accreditation –, já possuíam um capítulo exclusivo para tratar de processos de gerenciamento de riscos.

Hoje, tanto na sua 6ª Edição quanto na 7ª encontramos o gerenciamento de riscos como um tema em destaque. A diferença é que a 6ª edição o introduz como uma das 10 disciplinas de gestão projetos, tendo um capítulo exclusivo para detalhar o gerenciamento de riscos.

Área de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
11. Gerenciamento da integração do projeto		11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos 11.2 Identificar os Riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos	11.6 Implementar Respostas aos Riscos	11.7 Monitorar os Riscos	

Figura 2 – Processos de gerenciamento de riscos
Fonte: PMBOK 6ª Edição (2017), adaptado por FIAP (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A 7ª edição prefere tratar a gestão de riscos dentro do Domínio de Desempenho da Incerteza, seção 2.8. No entanto, com um olhar atento nesta nova versão do PMBOK, você perceberá que o termo incerteza percorre quase todo o documento, com indicações de cuidados a serem tomados em relação aos riscos em vários outros Domínios de Desempenho.

Para efeitos práticos e didáticos, adotaremos aqui nesta apostila o framework da 6ª edição, onde os processos de gestão de riscos estão bem documentados e em uma cadência fácil de se compreender.

Mas nem só do PMBOK vive a gestão de riscos. Outros frameworks também estão disponíveis e são tão, ou até mesmo mais, respeitados que os produzidos pelo PMI e são igualmente difundidos no mundo inteiro. É o caso da ISO 31000, cuja primeira versão foi publicada em 2009 e que discutiremos a seguir.

1.3 Como gerenciar riscos – o padrão ISO 31000

A ISO (*International Organization for Standardization* ou Organização Internacional de Padronização) considera que todas as atividades realizadas por uma organização, em quaisquer de seus níveis hierárquicos, estão envolvidas com riscos. Por isso, a entidade desenvolveu um processo sistemático e genérico para a gestão de riscos, que pode ser adaptado por organizações de qualquer porte ou segmento econômico. Foi criado, assim, o padrão ISO 31000 (ISO, 2018).

Se uma organização adota o padrão ISO 31000, ela se torna capaz de identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos inerentes ao seu negócio de forma sistêmica para atender às suas necessidades e alcançar seus objetivos. Isso inclui atividades de comunicação entre todos os *stakeholders* e o contínuo monitoramento dos riscos para assegurar um tratamento adequado de cada risco ao longo do tempo.

O padrão ISO 31000 está organizado em três grandes partes, mostradas na Figura “Relacionamentos entre princípios, estrutura e processo da ISO 31000”:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

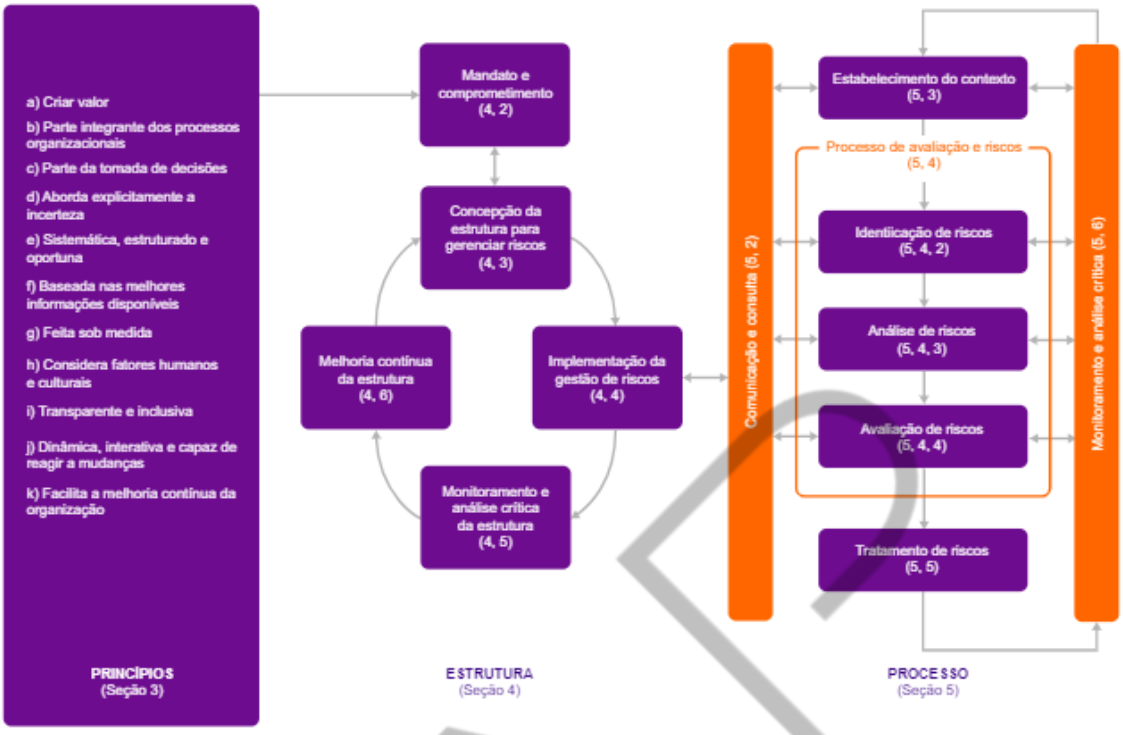

Figura 3 – Relacionamentos entre princípios, estrutura e processo da ISO 31000
Fonte: ABNT (2018), adaptado pela FIAP (2020)

Cada uma das partes será detalhada nas próximas seções.

1.4 Princípios da gestão de riscos

Para garantir a eficácia da gestão de riscos, o padrão ISO 31000 estabelece alguns princípios, centrados na criação e proteção de valor, a serem atendidos por todos os níveis da organização:

a) **Integrada:** a gestão de riscos não pode ser autônoma, mas deve fazer parte das responsabilidades de todos os colaboradores e, inclusive, abranger o planejamento estratégico, a gestão de projetos, mudança e operações.

b) **Estruturada e abrangente:** para obtenção de consistência, comparabilidade e confiabilidade nos resultados da gestão de riscos.

c) **Personalizada:** a gestão de riscos precisa estar alinhada e proporcional aos contextos interno e externo da organização, relacionando-se aos seus objetivos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

d) **Inclusiva:** envolvimento apropriado e oportuno de todos os *stakeholders* para garantir que suas expectativas e opiniões sejam levadas em conta no tratamento dos riscos. Assim, é possível uma melhor conscientização e gestão de riscos fundamentada.

e) **Dinâmica:** a gestão de riscos deve antecipar, detectar, reconhecer e responder às mudanças dos riscos, considerando os contextos internos e externos de uma empresa.

f) **Melhor informação disponível:** a gestão de riscos deve se basear em dados históricos, experiências, *feedbacks* de *stakeholders*, observações, previsões e opiniões de especialistas, considerando-se suas limitações e a possibilidade de divergências.

g) **Fatores humanos e culturais:** capacidades, percepções e intenções de pessoas internas e externas à organização podem facilitar ou não o processo.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 ESTRUTURA PARA GESTÃO DE RISCOS

A estrutura é uma parte crítica para o sucesso da gestão de riscos, pois deve garantir os recursos e arranjos necessários para a boa execução do processo. Ela deve contar com cinco elementos como mostra a Figura “Componentes da estrutura de gestão de riscos do padrão ISO 31000”.

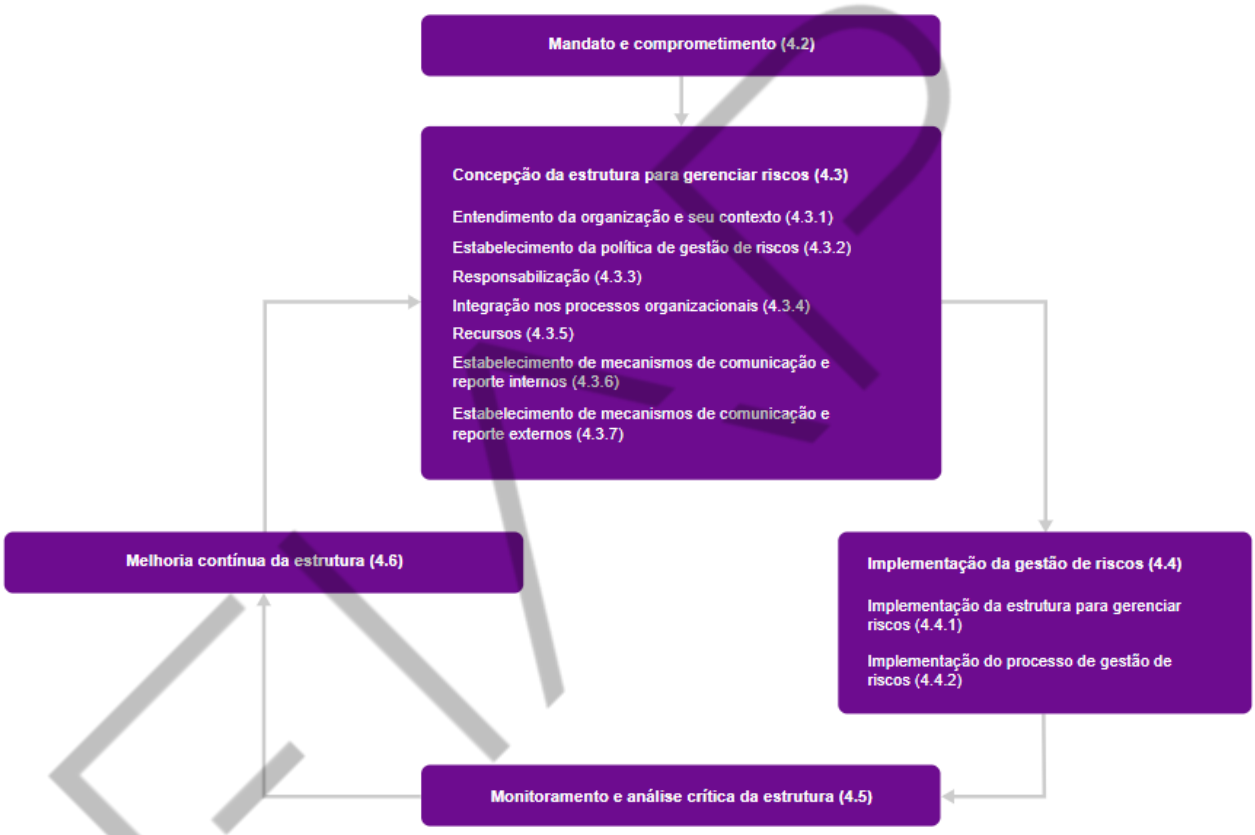

Figura 4 – Componentes da estrutura de gestão de riscos do padrão ISO 31000
Fonte: ABNT (2018), adaptado pela FIAP (2020)

O primeiro componente – **Liderança e Comprometimento** – diz respeito ao compromisso da alta direção e órgãos de supervisão em garantir:

- Personalização e implementação de todos os componentes da estrutura;
- Definição de uma declaração ou política para determinar uma abordagem, plano ou curso de ação da gestão de riscos;
- Alocação dos recursos necessários para a gestão de riscos;
- Atribuição de responsabilidades sobre a gestão de riscos nos níveis organizacionais adequados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com isso, será possível que a organização:

- Alinhamento dos objetivos da gestão de riscos com os objetivos e estratégias e cultura da organização;
- Reconhecer e abordar as obrigações e compromissos voluntários;
- Estabelecer a quantidade e o tipo de risco que pode ser assumido ou não, para orientar o desenvolvimento de critérios, assegurando que sejam informados à organização e aos seus stakeholders;
- Comunicação do valor da gestão de riscos para a organização e para os seus stakeholders;
- Promover o monitoramento sistemático de riscos;
- Assegurar que a estruturação de gestão de riscos mantenha-se apropriada ao contexto da organização.

A **Concepção** está relacionada ao planejamento detalhado da estrutura para a gestão de riscos e engloba as seguintes atividades macro:

- **Entendendo a organização e seu contexto**: envolve a avaliação e a compreensão dos ambientes interno e externo em sentido amplo, com o mapeamento dos *stakeholders*, da estrutura organizacional, de aspectos culturais e políticos, do modelo de governança e tomada de decisão, das capacidades da organização (pessoas, processos e tecnologia) etc.
- **Articulando o comprometimento com a gestão de riscos**: inclui a definição clara dos objetivos, das responsabilidades, dos recursos necessários, dos mecanismos de monitoramento de desempenho, do tratamento de conflitos e da melhoria contínua da gestão de riscos.
- **Atribuindo papéis organizacionais, autoridades, responsabilidades e responsabilizações:** identificar as pessoas da organização que terão papéis no processo de gestão de riscos e atribuir-lhes responsabilidade e autoridade para o exercício efetivo deste papel.
- **Alocando Recursos:** identificação dos recursos necessários ao processo de gestão de riscos, incluindo pessoas e respectivas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

competências requeridas, métodos, ferramentas, sistemas de informação, treinamentos etc.

- **Estabelecendo comunicação e consulta:** definição dos conteúdos, formatos, meios e frequência das comunicações para os *stakeholders* internos, visando à divulgação oportuna e pontual de informações derivadas da gestão de riscos e o apoio e incentivo à responsabilização e propriedade dos riscos.

O componente **Implementação** visa materializar o uso da política e do processo de gestão de riscos na organização, por meio de treinamento, da alocação efetiva de recursos e da execução do plano de riscos.

A **Avaliação** é responsável pela medição e análise dos indicadores do processo de gestão de risco e pela identificação de oportunidades de melhoria.

O último componente, **Melhoria**, é o responsável pela elaboração de um plano de melhoria para a política, plano e estrutura da gestão de riscos, a partir das oportunidades identificadas pelo monitoramento e análise crítica da estrutura.

2.1 Processo para gestão de riscos

O processo de gestão de riscos especificado pela ISO 31000 deve ser incorporado na cultura, nas práticas e nos processos de gestão da organização, bem como adaptado aos processos de negócio.

O processo está dividido em fases, como mostra a Figura “Processo de gestão de risco do padrão ISO 31000”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

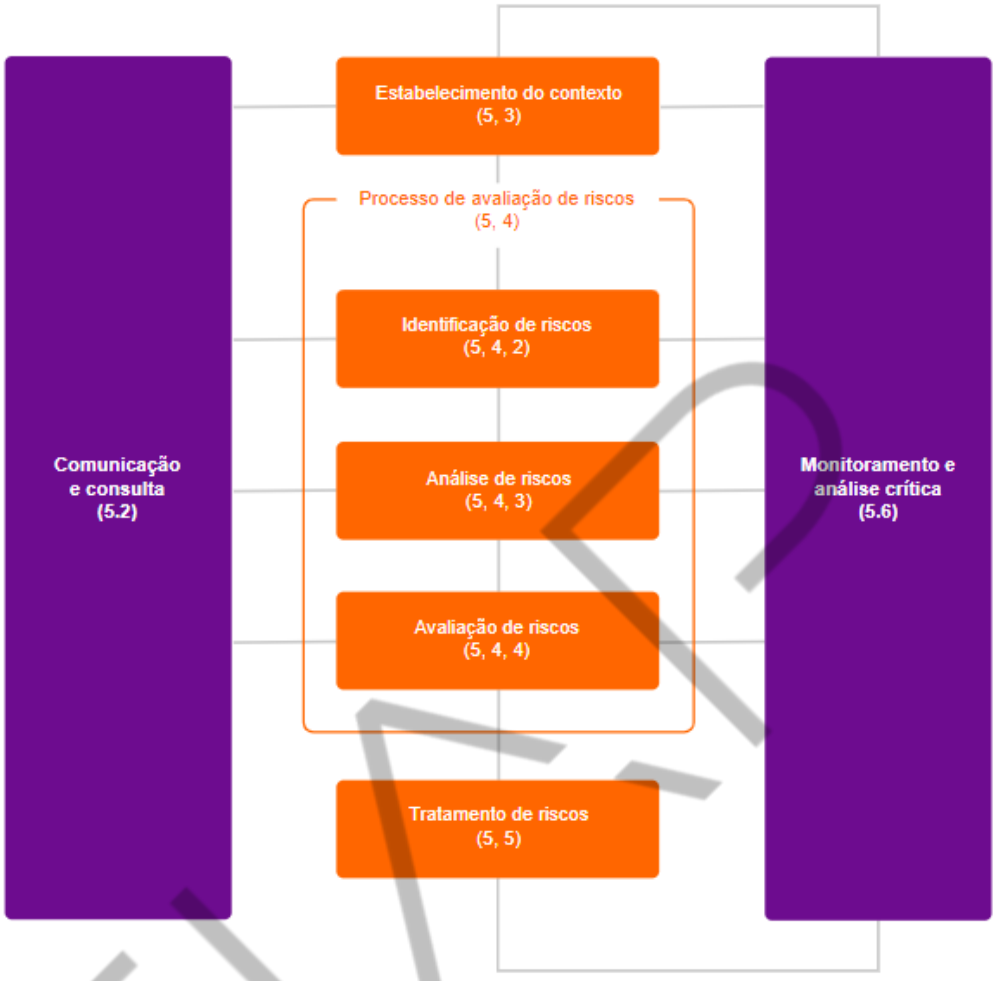

Figura 5 – Processo de gestão de risco do padrão ISO 31000
Fonte: ABNT (2018), adaptado pela FIAP (2020)

a) Escopo, contexto e critério:

Esta fase é responsável pela personalização do processo de gestão de riscos, permitindo um processo eficaz de avaliação e tratamento de riscos. Contempla a definição do escopo do processo, a compreensão dos contextos externo e interno e definição de critérios de risco.

b) Processo de avaliação de riscos:

Esta fase é central no processo e engloba três etapas importantes para a identificação, análise e a própria avaliação de riscos.

A primeira etapa é a **identificação de riscos** e tem como objetivo elaborar uma lista de riscos abrangente e detalhada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A organização pode utilizar diversas técnicas para identificar incertezas que poderão afetar um ou mais objetivos. Alguns fatores e o relacionamento entre eles podem ser considerados:

- Fontes tangíveis e intangíveis de risco;
- Causas e eventos;
- Ameaças e oportunidades;
- Vulnerabilidades e capacidades;
- Mudanças nos contextos externo e interno;
- Indicadores de riscos emergentes;
- Natureza e valor dos ativos e recursos;
- Consequências e seus impactos nos objetivos;
- Limitações de conhecimento e de confiabilidade da informação;
- Fatores temporais;
- Vieses, hipóteses e crenças dos envolvidos.

Todas as possíveis fontes de risco devem ser mapeadas pela organização, mesmo aquelas que não estejam sob seu controle. Um outro ponto importante é o exame de reações em cadeia provocadas por efeitos específicos.

Para identificação de riscos, podem ser usadas várias técnicas, como o uso de *checklists*, bases de lições aprendidas, *brainstorming*, obter opinião de especialistas, entrevistas, reuniões etc. É importante que o máximo de pessoas apropriadas seja envolvido nesta fase, incluindo pessoas de fora da organização sempre que necessário, pois muitos dos riscos podem estar associados a fornecedores, clientes e parceiros de negócios.

Quanto maior o número de riscos identificados e maior a quantidade de detalhes sobre eles, melhor tende a ser o resultado desta etapa.

A segunda etapa é a **análise de riscos**, cujo objetivo é compreender cada risco identificado a partir da apreciação de suas causas, consequências e probabilidades.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nesta etapa, deve-se empregar uma escala padronizada, seja numérica, seja qualitativa (com atributos de classificação do tipo baixo, médio e alto) para determinar os níveis de probabilidade e de impacto de cada evento identificado e, em seguida, combiná-los para verificar o nível de risco.

Uma ferramenta comum para esta etapa é o uso de Mapas de Risco, como ilustra a Figura “Mapa de Risco”.

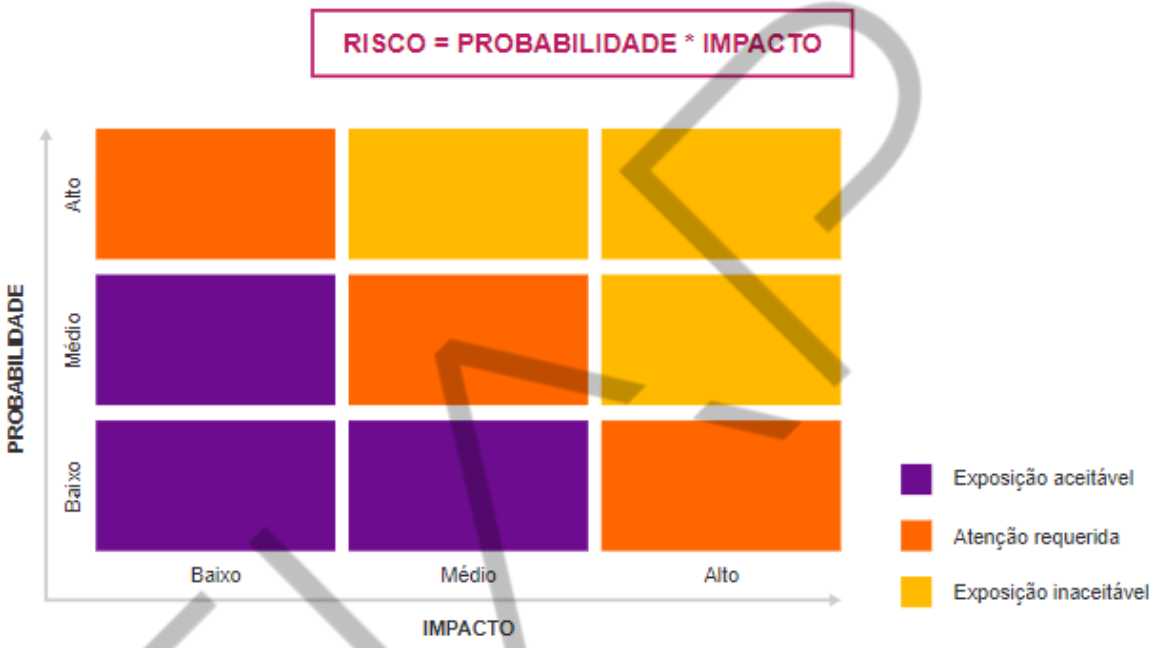

Figura 6 – Mapa de Risco
Fonte: Elaborado pelo autor (2017), adaptado pela FIAP (2017)

Basicamente, o Mapa de Risco trabalha com a combinação de Probabilidade X Impacto de um Risco e pode assumir diversas escalas dentro dos dois eixos de acordo com a política da organização que o aplica.

Por exemplo, se um dado risco apresentar alta probabilidade de ocorrência e alto nível de impacto, sua severidade será crítica.

Em geral, o resultado da etapa de análise de risco é a lista de riscos classificada.

A terceira e última etapa é a de **avaliação de riscos**, cujo objetivo é definir quais riscos precisam ser priorizados para tratamento, sendo um grande suporte para a tomada de decisões.

Basicamente, avaliam-se o nível de risco e demais informações, tomando-se como base os parâmetros e critérios de risco estabelecidos pela organização, tais

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

como o nível de tolerância a risco, requisitos legais, regulatórios ou de controles internos.

Deve-se considerar o contexto mais amplo e as consequências reais e percebidas para os *stakeholders* externos e internos. Por fim, é conveniente que o resultado da avaliação de riscos seja registrado, comunicado e validado nos níveis apropriados da organização.

c) Tratamento de riscos:

Esta fase diz respeito às decisões sobre o tratamento a ser dado para cada risco identificado, analisado e avaliado. Normalmente, as opções de tratamento para riscos envolvem as seguintes ações:

- Evitar o risco ao não iniciar ou descontinuar uma atividade que pode materializá-lo;
- Tomar ou aumentar o risco, quando se trata de oportunidade;
- Remover a fonte de risco;
- Alterar a probabilidade de ocorrência;
- Alterar as consequências (reduzir ou modificar o impacto);
- Compartilhar ou transferir o risco com outras partes;
- Reter o risco por decisão fundamentada.

Se as opções de tratamento afetam vários *stakeholders*, eles devem ser envolvidos na decisão. É importante considerar que uma determinada ação de tratamento pode introduzir novos riscos, que também precisam ser avaliados e monitorados.

Uma outra atividade desta fase é a elaboração do plano para tratamento de riscos, que deve conter as seguintes informações:

- Racional das ações de tratamento – por que foram escolhidas;
- Responsáveis pela aprovação do plano;
- Responsáveis pela implementação do plano;
- Ações a serem executadas;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Recursos necessários, incluindo contingências;
- Medidas de desempenho e restrições;
- Requisitos para apresentação de informação e monitoramento;
- Cronograma e programação.

É importante que os planos de tratamento sejam integrados aos demais processos da organização conforme necessidade.

Por exemplo, pode ser necessário ter aprovação financeira do plano e sua execução pode estar sujeita ao processo de gestão de mudança.

Os planos precisam estar bem comunicados a todos os envolvidos e sua execução pode ser invocada pela atividade de monitoramento e análise crítica que será explicada a seguir.

d) Monitoramento e análise crítica:

Esta fase assegura a verificação regular dos riscos identificados, analisados e avaliados com a finalidade de manter o registro de riscos atualizado e, especialmente, de acionar a execução do plano de tratamento de risco sempre que necessário. Por isso, ela deve ocorrer de forma concomitante com as outras fases.

Além disso, as atividades de monitoramento devem garantir:

- Que os controles sejam eficazes e eficientes tanto para projetos como operações regulares;
- Obter informação adicional para a avaliação de riscos;
- Analisar eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos e registrar as lições aprendidas;
- Detectar mudanças nos contextos interno e externo, tanto nos critérios de risco como nas condições dos riscos, porque elas podem ocasionar nova análise, avaliação e tratamento;
- Detectar novos riscos e disparar sua identificação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

e) Comunicação e consulta:

Esta fase deve ocorrer em paralelo às demais fases do processo de gestão de risco porque a comunicação é contínua.

Por exemplo, a lista de riscos identificados deve ser comunicada a todos os stakeholders relevantes, assim como as listas de riscos analisados e priorizados, e da mesma forma que os planos de tratamento de riscos.

Além disso, cabe a comunicação garantir que todos os *stakeholders* internos e externos tenham o conhecimento apropriado do processo de gestão de riscos, bem como dos parâmetros e definições de risco adotados pela organização.

f) Registro e relato:

É importante que o processo de gestão de riscos, bem como seus resultados sejam documentados e relatados de forma apropriada. Esse processo tem como objetivos:

- Relatar atividades e resultados de gestão de riscos para toda a organização;
- Disponibilizar informações para a tomada de decisão;
- Melhorar as atividades de gestão de riscos;
- Dar suporte na interação com os stakeholders, inclusive aqueles com relação direta – responsabilidade ou responsabilização – por atividades de gestão de riscos.

2.2 Gestão de riscos em projetos

Como a ideia é tentar prever os problemas antes de eles surgirem, é apropriado adotar o seguinte pensamento: "Tudo o que pode dar errado, vai dar errado", ou seja, a lei de Murphy estará presente em todas as atividades do seu projeto.

Um projeto com uma gestão de riscos efetiva apresenta uma redução da ocorrência de “surpresas” e problemas e, consequentemente, redução de perdas em projetos, isto é, um aumento substancial na chance de sucesso do projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A seguir, veremos como gerenciar riscos através do framework do PMBOK 6ª Edição. Observe que em quase todos os aspectos, temos uma correlação com o formato da ISO 31000, todavia, nele encontramos uma cadência prescritiva orientada exclusivamente para projetos.

O PMBOK® 6ª Edição prevê sete processos para a gestão de riscos:

a) Planejar o gerenciamento dos riscos:

Definir como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto com a criação e atualização do Plano de Gerenciamento de Riscos.

Figura 7 – Processo “Planejar o Gerenciamento dos Riscos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª Edição (2017)

b) Identificar os riscos:

Determinar os riscos que podem afetar o projeto e documentar suas características. Este processo pode ser subdividido em quatro atividades realizadas em várias rodadas, ou seja, podem ser assim divididas:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Identificação do risco:** por meio de analogia com projetos similares anteriores ou técnicas de coleta, como *brainstorming*, SWOT, entre outras.
- **Documentação em lista de riscos:** documentar os eventos de risco em potencial em uma lista de riscos.
- **Identificar novos riscos a partir da lista**: com a lista em mãos, novos riscos podem ser gerados a partir dos eventos já identificados. Além disso, novos riscos podem ser identificados em processos posteriores, como planejar respostas aos riscos – as próprias ações preventivas ou corretivas podem resultar em novos riscos.
- **Categorização de novos riscos:** utilizando uma Estrutura Analítica de Riscos (EAR) ou *Risk Breakdown Structure* (RBS), que é uma representação hierárquica dos riscos.

Figura 8 – Processo “Identificar Riscos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

c) Realizar a análise qualitativa dos riscos:

Realizar uma análise de probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos com o objetivo de priorizá-los e fornecer respostas à altura.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Depois que os eventos de riscos são devidamente identificados e categorizados, convém fazer uma análise qualitativa do risco.

A análise qualitativa é realizada quando a equipe do projeto se depara com eventos de risco que não possuem uma base histórica para fundamentar a sua análise mais profunda (e quantificada). Tem como base diversas avaliações feitas por diferentes pessoas da equipe (através de sua opinião especializada), segundo uma escala predefinida, como usada, por exemplo, no Mapa de Riscos.

A análise qualitativa, portanto, busca avaliar riscos com elementos de impacto e probabilidade, geralmente classificados entre Alta(o), Média(o) ou Baixa(o), uma vez que pouca informação prejudica qualquer possibilidade de se avaliar impacto e probabilidade de forma numérica.

Mas não se preocupe, tentar de cara quantificar riscos de maneira algébrica pode ser muito improdutivo e muitas vezes perigoso, pois a falta de informação e conhecimentos em utilizar ferramentas mais sofisticadas pode gerar visões distorcidas de um risco. É o que o SERC – Science and Engineering Research Council –, um importante instituto de estudos de ciências e engenharia, recomenda para uma gestão de risco eficaz: a análise qualitativa, em geral, é suficiente para avaliação da maior parte dos riscos envolvidos em um projeto.

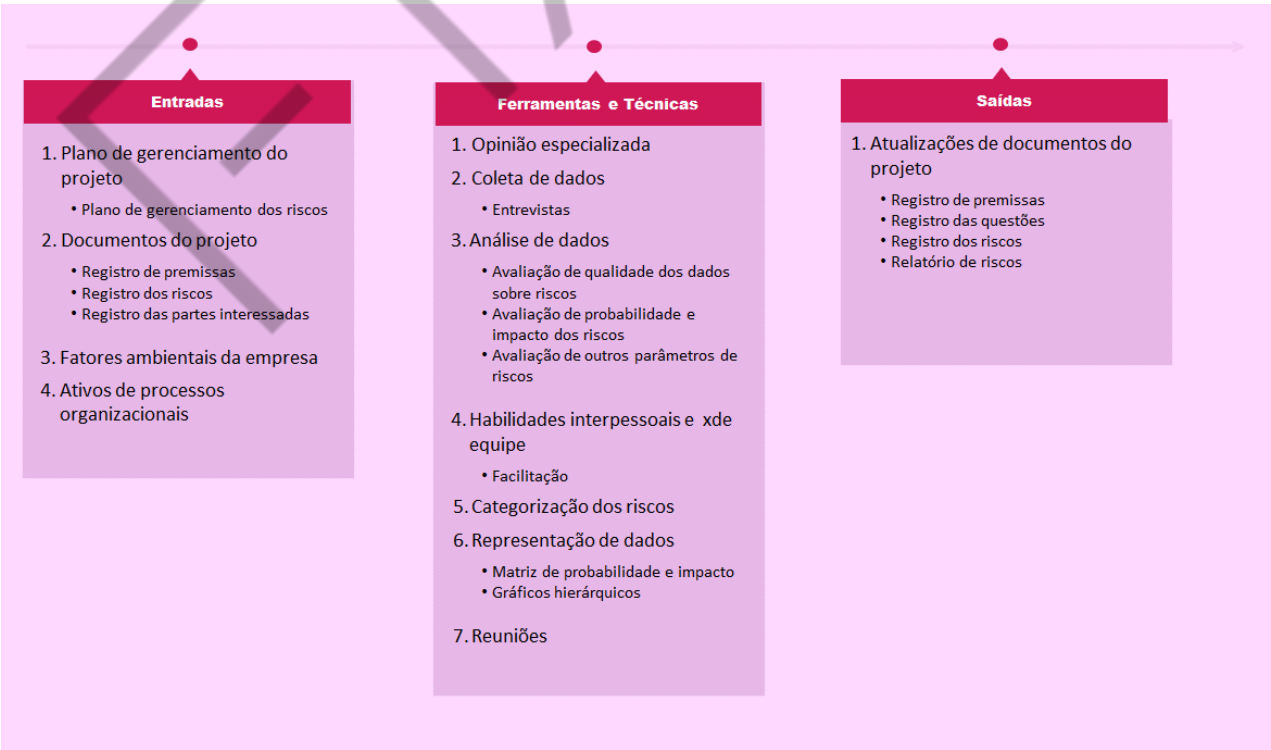

Figura 9 – Processo “Realizar a análise qualitativa dos riscos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

d) Realizar a análise quantitativa dos riscos:

Realizar uma análise com o objetivo de quantificar o impacto do risco, caso ele venha a ocorrer. Trata-se de uma análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

A análise quantitativa é realizada nos riscos priorizados pela análise qualitativa de riscos como tendo impacto potencial e substancial nas demandas concorrentes do projeto.

Novamente, é importante frisar que, sem dados quantitativos seguros e de qualidade, a análise quantitativa deve ser evitada. Você pode proceder com a visão qualitativa priorizando riscos de maior impacto e probabilidade para que se defina quais serão trabalhados em um modelo de resposta a riscos.

Figura 10 – Processo “Realizar a análise quantitativa dos riscos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

e) Planejar as respostas aos riscos:

Este processo identifica opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças ao projeto.

Com os eventos de riscos identificados, categorizados e classificados em sua probabilidade e impacto, chegou o momento de planejar respostas eficazes aos riscos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 11 – Processo “Planejar as Respostas aos Riscos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

Os modelos de respostas aos riscos que você irá encontrar no PMBOK 6ª ou 7ª Edição são absolutamente equivalentes aos que foram apresentados acima na ISO 31000.

f) Implementar respostas aos riscos:

Consiste em implementar planos acordados de resposta aos riscos. O principal benefício deste processo é a garantia de que as respostas acordadas aos riscos sejam executadas conforme planejado a fim de abordar a exposição ao risco geral do projeto, minimizar ameaças individuais e maximizar as oportunidades individuais do projeto.

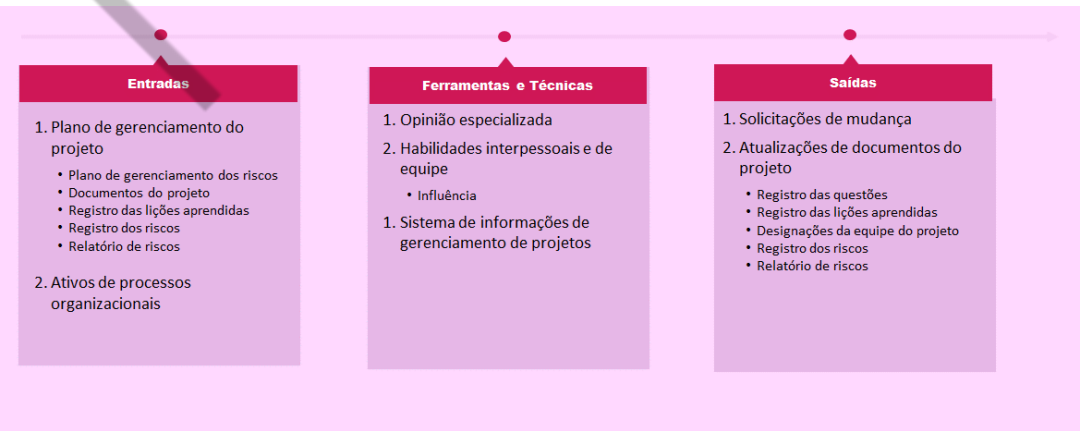

Figura 12 – Processo “Implementar Respostas aos Riscos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

g) Monitorar os Riscos:

Trata-se de manter o acompanhamento de riscos identificados, monitorando os residuais e identificando os novos, garantindo, assim, a execução do Plano de Gerenciamento de Riscos.

O processo também é responsável por avaliar a eficácia das respostas aos riscos, verificando se elas eliminaram ou reduziram o impacto causado pelos eventos de risco em potencial ocorridos.

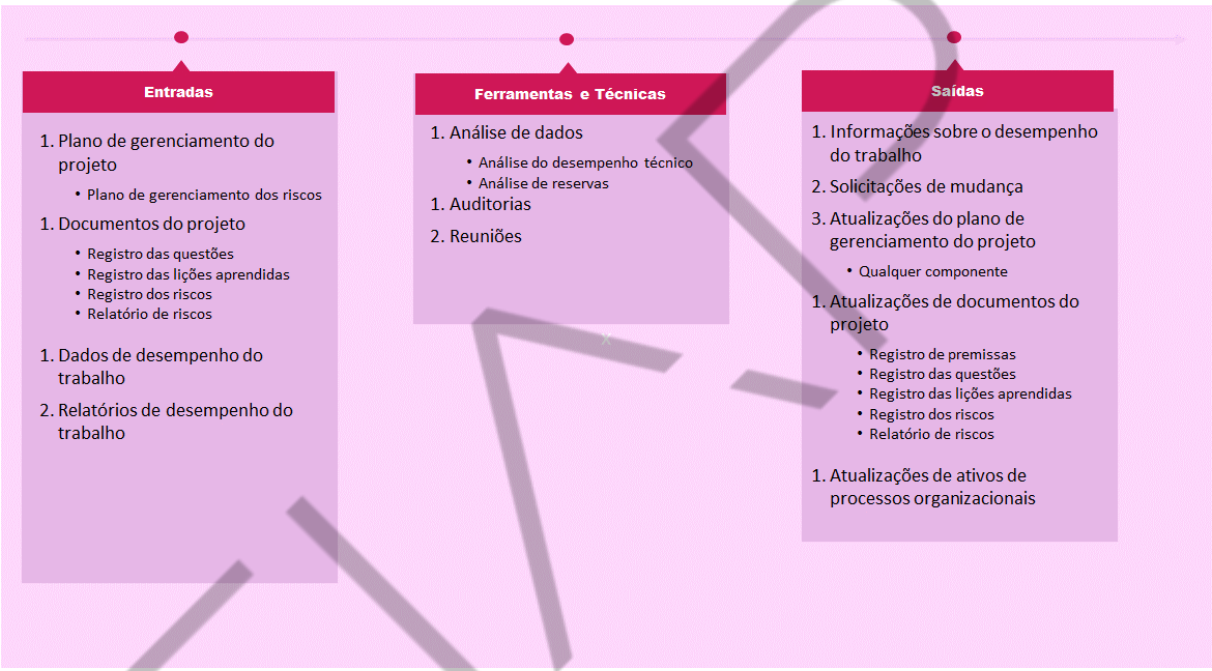

Figura 13 – Processo “Monitorar os Riscos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

A esta altura você deve ter percebido as várias semelhanças entre o framework da ISO 31000 e a 6ª Edição do PMBOK. Todavia, é fácil perceber que a ISO 31000 tem um compromisso mais abrangente e busca fornecer elementos de estratégia para sistematização de cultura de gerenciamento de riscos em toda a organização.

Já o PMBOK adota uma visão mais prática para ser aportada em projetos. Entretanto, é importante lembrar que, mesmo em projetos, a cultura de gestão de riscos tem que ser trabalhada para que se garanta que os recursos do projeto atuem de forma ativa em todos as etapas de gerenciamento de riscos. Nem sempre a gestão do projeto tem uma visão clara de todos os riscos que um projeto está

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sujeito. É neste ponto que os recursos, mesmo os mais técnicos, assumem um papel importantíssimo.

Olhando para a 7ª Edição do PMBOK, na seção 2.8 encontramos o Domínio de Desempenho da Incerteza, onde busca-se elementos para que se obtenha os seguintes resultados em um projeto:

- Uma conscientização do ambiente em que ocorrem os projetos, incluindo, entre outros, os ambientes técnico, social, político, de mercado e econômico.
- Explorar e responder de forma proativa à incerteza.
- A conscientização da interdependência de múltiplas variáveis no projeto.
- A capacidade de antecipar ameaças e oportunidades, bem como compreender as consequências dos problemas.
- Entrega do projeto com pouco ou nenhum impacto negativo de condições ou eventos inesperados.
- Oportunidades são realizadas para melhorar o desempenho e os resultados do projeto.
- As reservas de custo e cronograma são utilizadas de forma eficaz para manter o alinhamento com os objetivos do projeto.

Ao avançar nesta seção da 7ª Edição, veremos uma preocupação mais abrangente em trabalhar as incertezas, tanto do lado de oportunidades quanto das ameaças. Todavia, no que diz respeito aos riscos, você perceberá que ela lida com as mesmas abordagens e ferramentas tratadas na 6ª Edição.

Novamente, fica aqui a dica para os não iniciados em gestão de projetos, de trabalharem primeiramente com o conteúdo da 6ª Edição que é bem mais prático e didático. A 7ª Edição, por outro lado, possui conteúdo mais exigente no que tange a experiência do leitor em gestão de projetos, apresentando visões mais sofisticadas com abordagens sistêmicas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ABNT. **ABNT ISO GUIA 73**: Gestão de riscos – vocabulário. São Paulo: ABNT, 2009a.

ABNT. **ABNT NBR ISO 31000**: Gestão de riscos – princípios e diretrizes. São Paulo: ABNT, 2018.

ASSI, M. **Gestão de riscos com controles internos**: ferramentas, certificações e métodos para garantir a eficiência dos negócios. São Paulo: Saint Paul, 2012.

BERNSTEIN, P.L. **Desafio aos deuses**: a fascinante história do risco. 16. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

IBGC. Guia de orientação para o gerenciamento de riscos corporativos. São Paulo: IBGC, 2007.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (GUIA PMBOK). 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (GUIA PMBOK). 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

SAXON, Wolfgang. Arthur Rudolph, 89, developer of rocket in first Apollo flight. **The New York Times**. Nova York, 3 jan. 1996. Disponível em: <http://www.nytimes.com/1996/01/03/us/arthur-rudolph-89-developer-of-rocket-in-first-apollo-flight.html>. Acesso em: 25 mai. 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com
