FIAP ON

GESTÃO DE PROJETOS

QUALIDADE/RH

9

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Processo “Planejar o Gerenciamento da Qualidade” 6
Figura 2 – Custo-benefício 7
Figura 3 – Custo da qualidade 8
Figura 4 – Benchmarking 9
Figura 5 – Projeto automobilístico de suspensão de carro.....9
Figura 6 – Amostragem estatística.....10
Figura 7 – Processo “Controlar a Qualidade” (1).....11
Figura 8 – Diagrama de causa e efeito 12
Figura 9 – Diagrama de Pareto 12
Figura 10 – Gráfico de controle.....13
Figura 11 – Processo “Gerenciar a Qualidade” (2).....14
Figura 12 – Analogia a diretoria 15
Figura 13 – Custo-benefício 16
Figura 14 – Falta de tempo 17
Figura 15 – Recursos Humanos.....19
Figura 16 – Processo “Planejar o Gerenciamento de Recursos” 21
Figura 17 – Ferramentas importantes 23
Figura 18 – Exemplo de Matriz de Responsabilidades 23
Figura 19 – Processo “Estimar Recursos das Atividades” 25
Figura 20 – Processo “Adquirir Recursos” 26
Figura 21 – Processo “Desenvolver a Equipe”.....27
Figura 22 – Processo “Gerenciar a Equipe” 28
Figura 23 – Processo “Controlar Recursos” 29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 QUALIDADE/RH 4
1.1 Introdução 4
1.2 Qualidade 4
1.3 Recursos Humanos 17
REFERÊNCIAS 30

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 QUALIDADE/RH

1.1 Introdução

A produtividade, a qualidade das reuniões e as tomadas de decisão que nelas acontecem, dependem muito das pessoas – que têm seus egos, convicções, opiniões diferentes e, muitas vezes, divergentes.

A esta altura, fica claro que precisamos saber como gerenciar as pessoas e os recursos à disposição para obtermos bons resultados em nossos projetos.

A gestão de pessoas tem impacto direto na qualidade das soluções que entregamos, por isso vamos começar a desvendar esse desafio agora.

1.2 Qualidade

Qualidade é um daqueles conceitos que a gente compreende, mas não sabe definir exatamente o que é. Então, qual é o significado da palavra qualidade?

Para William Edwards Deming, professor, engenheiro e estatístico, uma das autoridades da área, qualidade significa “atender as necessidades do cliente, resultando em sua satisfação”. Ele complementa com o significado inverso: “livrar-se das deficiências que resultam em insatisfação do cliente”.

Para o PMI, na 6ª edição do PMBOK, a área de conhecimento “Qualidade” contém os processos necessários para determinar as políticas de qualidade, os objetivos e responsáveis, assegurando-se de que o projeto satisfaça as exigências, atendendo as necessidades para as quais foi empreendido.

Já na 7ª edição do PMBOK encontramos o tema qualidade sendo apresentado em quase toda sua extensão, mas ele é especificamente discutido na sessão Padrão de Gerenciamento de Projetos, no tópico 3.8, nomeado INCLUA QUALIDADE NOS PROCESSOS E NAS ENTREGAS, onde encontramos as seguintes anotações:

- A qualidade do projeto implica satisfação das expectativas das partes interessadas e o cumprimento dos requisitos do projeto e do produto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- A qualidade concentra-se em atender aos critérios de aceitação dos produtos.
- A qualidade do projeto implica garantir que os processos do projeto sejam apropriados e tão eficazes quanto possível.

Mais adiante, ele indica que a qualidade pode ter várias dimensões diferentes, incluindo, entre outras:

- **Desempenho**. A entrega está de acordo com as intenções da equipe do projeto e de outras partes interessadas?
- **Conformidade**. A entrega está adequada para uso? Atende às especificações?
- **Confiabilidade**. A entrega gera métricas coerentes a cada vez que é executada ou produzida?
- **Resiliência**. A entrega está em condições de lidar com falhas imprevistas e de se recuperar rapidamente?
- **Satisfação**. A entrega gera feedback positivo dos usuários finais? O feedback inclui possibilidade de uso e experiência do usuário?
- **Uniformidade**. A entrega demonstra paridade com outras entregas produzidas da mesma forma?
- **Eficiência**. A entrega produz o maior volume de saída com a quantia mínima de entrada e esforço?
- **Sustentabilidade**. A entrega produz impacto positivo de acordo com parâmetros econômicos, sociais e ambientais?

Ainda na 7ª edição, na seção Domínios de Desempenho da Entrega, no tópico 2.6.3, novamente encontramos o tema Qualidade sendo discutido e suas interações com os demais domínios de desempenho.

Essa distribuição do tema ao longo do documento torna o seu entendimento um pouco confuso para os iniciados em gestão de projetos, mas a seguir você verá que a 6ª edição oferece um caminho mais prático e prescritivo para lidar com Qualidade, uma vez que esta versão o concentra em um único capítulo – Gerenciamento da Qualidade do Projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O PMBOK® 6ª edição prevê três processos para a gestão da qualidade:

a) Planejar o gerenciamento da qualidade:

Trata-se de formalizar como serão identificados os requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, bem como documentar de que maneira o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou padrões de qualidade.

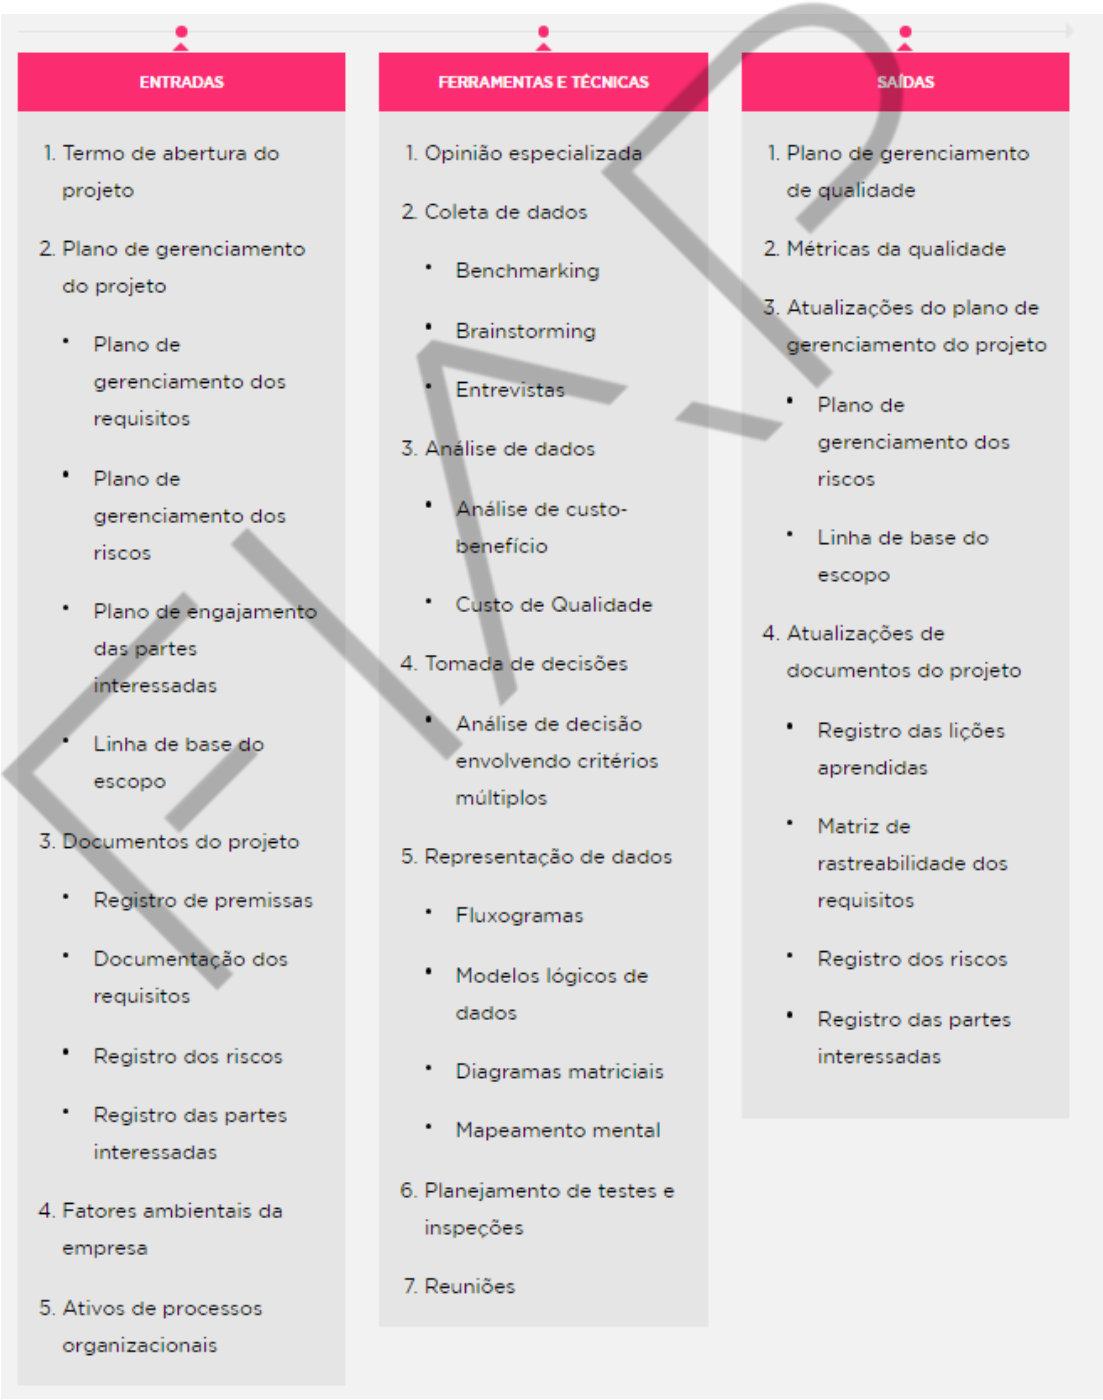

Figura 1 – Processo “Planejar o Gerenciamento da Qualidade”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Fatores ambientais da empresa:** qualquer regulamento da empresa ou governamental que dite como você deve planejar a qualidade para seu projeto.
- **Ativos de processos organizacionais:** sua empresa deve ter uma política de qualidade que determine como a qualidade é medida por toda a organização. O gerente de Projetos deve se assegurar de que o projeto segue a mesma política de qualidade da empresa.
- **Registro de riscos:** o registro é importante para identificar os riscos em que a qualidade poderá sofrer algum impacto.
- **Documentação de requisitos:** lista as entregas do projeto, assim como descreve limites de custo, detalhes e escopo.
- **Registro das partes interessadas:** responde quais partes interessadas têm interesse em requisitos de qualidade especificamente.

A seguir, falaremos brevemente de algumas ferramentas que podem ser utilizadas nesse planejamento.

a.1) Análise de custo-benefício:

Consiste em realizar uma análise cruzando os custos das atividades relacionadas à qualidade (treinamentos, documentação de processos, testes, verificações) com os benefícios atingidos ao cumpri-las, como diminuição do retrabalho, maior produtividade e o aumento da satisfação das partes interessadas.



Figura 2 – Custo-benefício
Fonte: FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

a.2) Custo da qualidade (CDQ):

Inclui todos os custos que ocorrem durante todo o ciclo de vida do produto (desde o projeto), relacionando os investimentos da não conformidade com os requisitos, tanto em sua prevenção (custos internos, encontrados pela equipe de projeto) quanto em sua correção (custos externos, passados despercebidos pela equipe de projeto e encontrados pelo cliente).

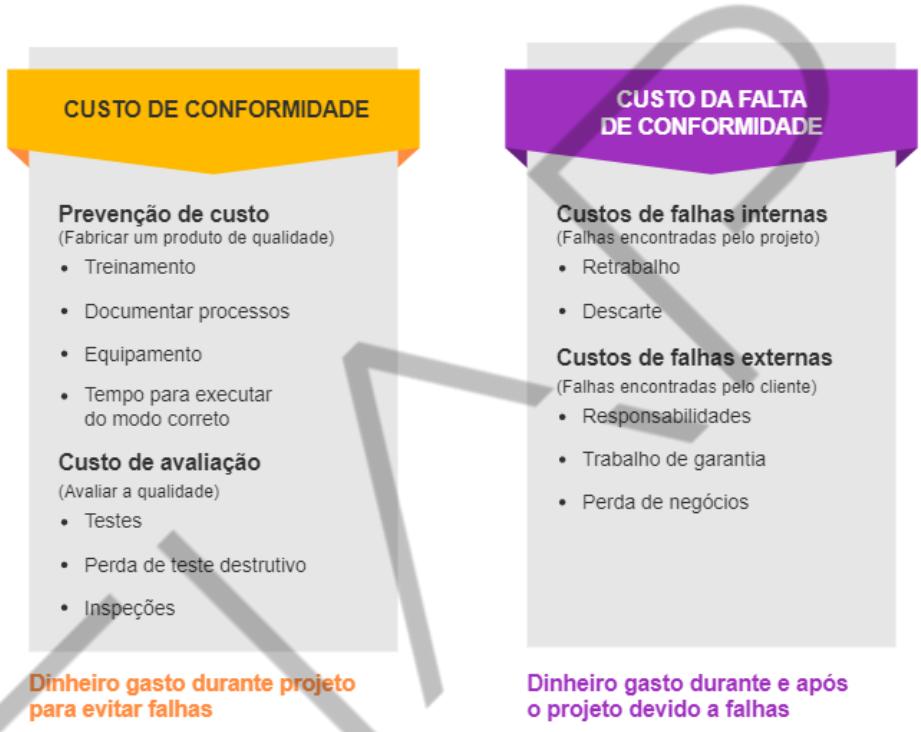

Figura 3 – Custo da qualidade
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2017)

a.3) Benchmarking

Compreende comparar práticas de outros projetos que estão em fase de planejamento ou foram realizados anteriormente com o seu projeto. Estes devem ser similares de alguma maneira, permitindo a analogia. Sendo assim, consulta-se o processo de Planejar Qualidade de outros projetos da empresa em busca de melhorias e métricas para o seu.

Exemplo: o GP identifica um projeto de sua empresa que teve uma redução de 25% nos defeitos em relação ao seu antecessor. Ele deve então estudar o projeto, buscando as melhorias que resultaram nesse desempenho significativo, determinando quais são aplicáveis ao seu próprio projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4 – Benchmarking
Fonte: FIAP (2017)

a.4) Projeto de experimentos:

O projeto de experimentos (ou DOE) é um método estatístico que identifica os fatores responsáveis por impactar variáveis específicas no desenvolvimento ou na elaboração do produto do projeto.

Utilizando-se de experimentação, identifica estatisticamente quais variáveis melhorarão a qualidade do produto.

Para que se tenha uma ideia, projetistas da indústria automobilística utilizam essa técnica para determinar qual combinação entre suspensão e pneus produzirá as melhores características de direção a um custo razoável.

Figura 5 – Projeto automobilístico de suspensão de carro
Fonte: FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

a.5) Amostragem estatística:

Pode ser aplicada quando existe amostra representativa o suficiente para a tomada de decisões, escolhendo parte de uma população de interesse para uma inspeção.

Exemplo: selecionar aleatoriamente para análise 15 documentos em um conjunto de 80.

Com essa amostragem, é possível determinar custos de qualidade, como quanto se gasta em uma inspeção, o percentual de descarte esperado, entre outros.

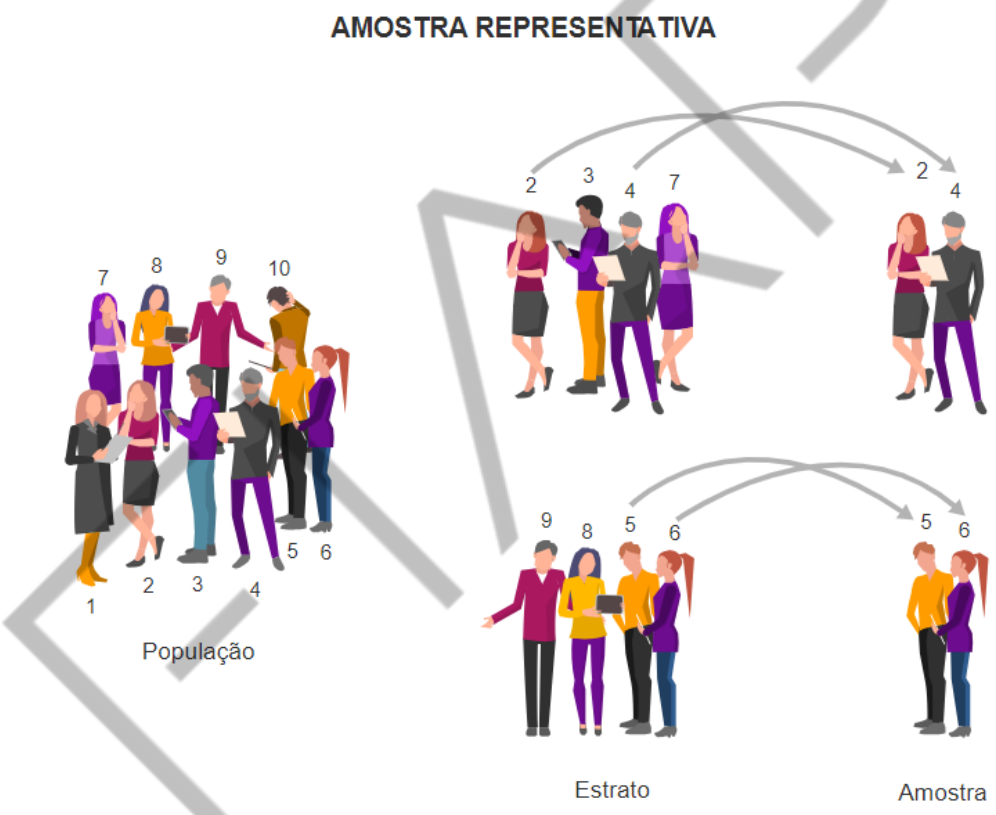

Figura 6 – Amostragem estatística
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2017)

b) Controlar a qualidade:

Compreende monitorar e registrar os resultados da execução das atividades de qualidade (definidas no plano de gerenciamento da qualidade – processo “planejar a qualidade”), a fim de avaliar o desempenho por meio das medições realizadas, comparando com as metas estabelecidas no planejamento da qualidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Qualidade/RH

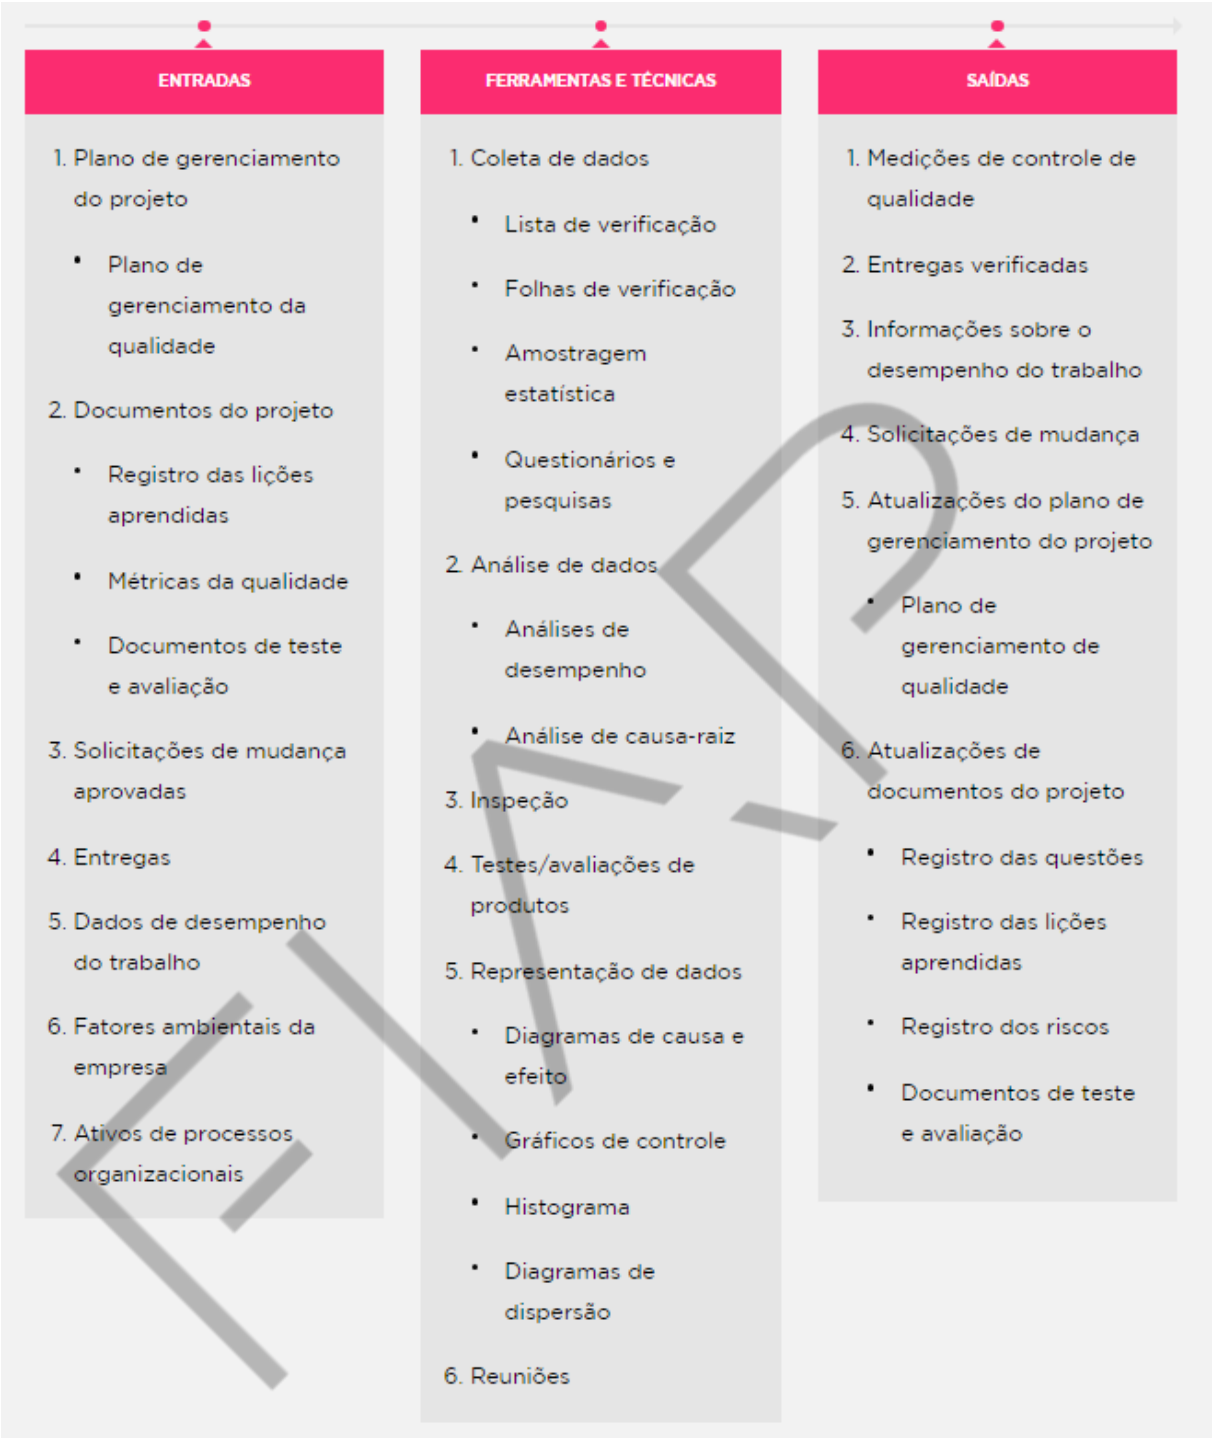

Figura 7 – Processo “Controlar a Qualidade” (1)
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

É possível recomendar mudanças que podem ser necessárias para o cumprimento da qualidade desejada. O controle de qualidade deve ser realizado durante todo o projeto e se torna possível com o uso das ferramentas adequadas, entre elas:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Diagrama de causa e efeito:** também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou Ishikawa, ilustra de maneira intuitiva os diversos fatores (causas) que podem estar ligados a problemas ou efeitos potenciais. Por meio das categorias de defeitos, descrevem-se as causas possíveis para o defeito que está sendo analisado em cada categoria.

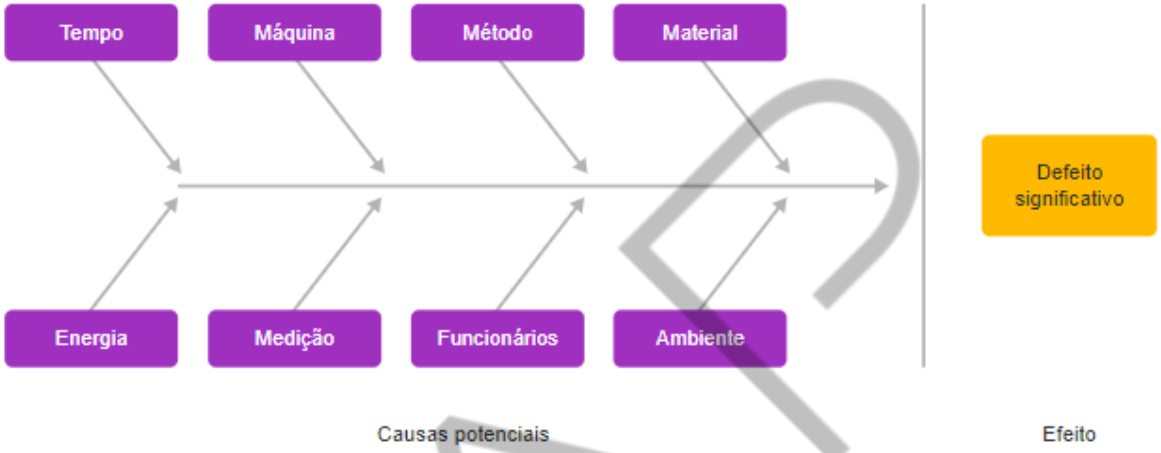

Figura 8 – Diagrama de causa e efeito
Fonte: Adaptado por FIAP (2017)

- **Diagrama de Pareto:** criado por Vilfredo Pareto, economista francês que, no início do século XX, concluiu que 80% de toda a riqueza de um país estava nas mãos de 20% da população.

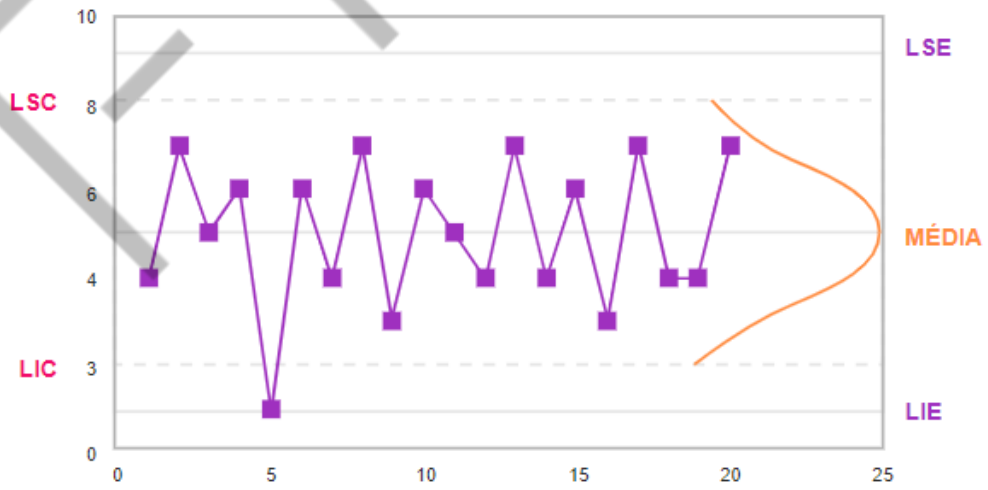

Figura 9 – Diagrama de Pareto
Fonte: Adaptado por FIAP (2017)

Foi criada, assim, a Lei de Pareto, ou regra 80/20. Ao se aplicar em qualidade, Joseph Juran descobriu que 80% dos problemas em um processo sistemático são

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

causados por apenas 20% das áreas problemáticas. Trata-se de um tipo específico de histograma, que nos auxilia a priorizar as categorias de defeitos.

- **Gráficos de controle:** úteis no acompanhamento das métricas de qualidade, os gráficos de controle mostram o desempenho do processo ao longo do tempo, estabelecendo as metas como limites do gráfico.

Entende-se que o processo está “sob controle” se todos os pontos do gráfico estão dentro dos limites de controle (LSC e LIC).

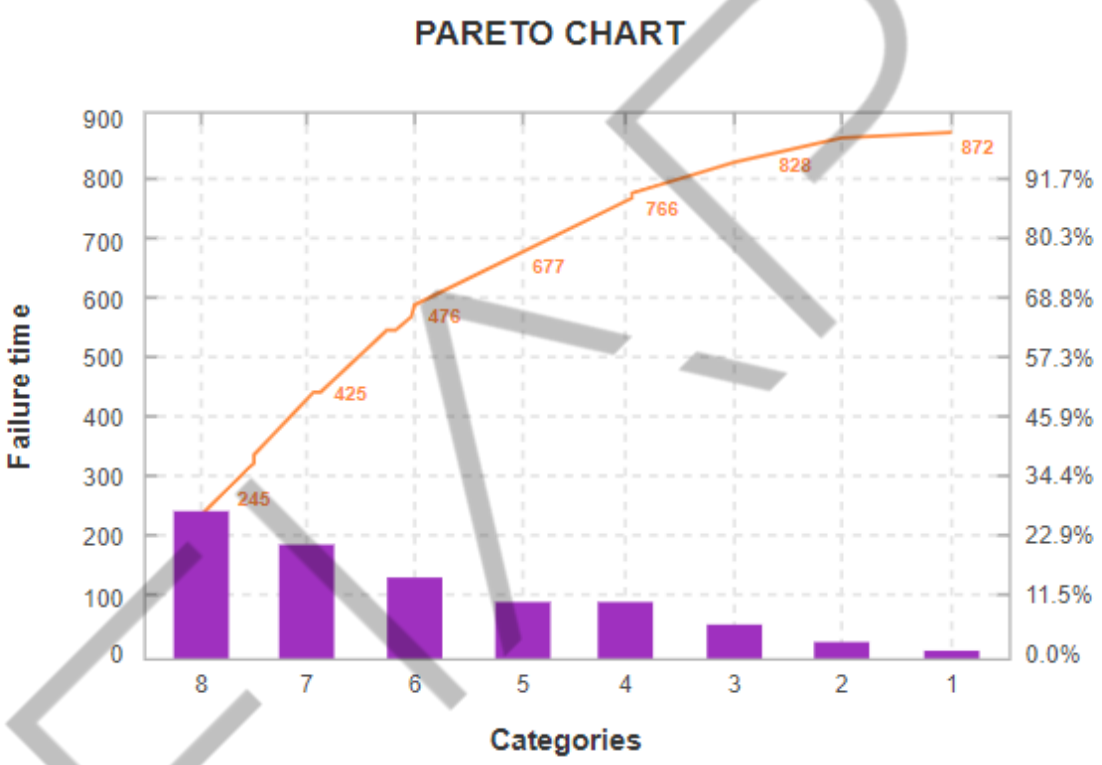

Figura 10 – Gráfico de controle
Fonte: Adaptado por FIAP (2017)

c) Gerenciar a Qualidade:

Trata-se do processo de auditar, confrontando os requisitos de qualidade (estabelecidos no plano de gerenciamento da qualidade) e os resultados das medições (realizadas no controle da qualidade), garantindo-se que estão sendo seguidos todos os padrões de qualidade e as definições operacionais apropriadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Qualidade/RH

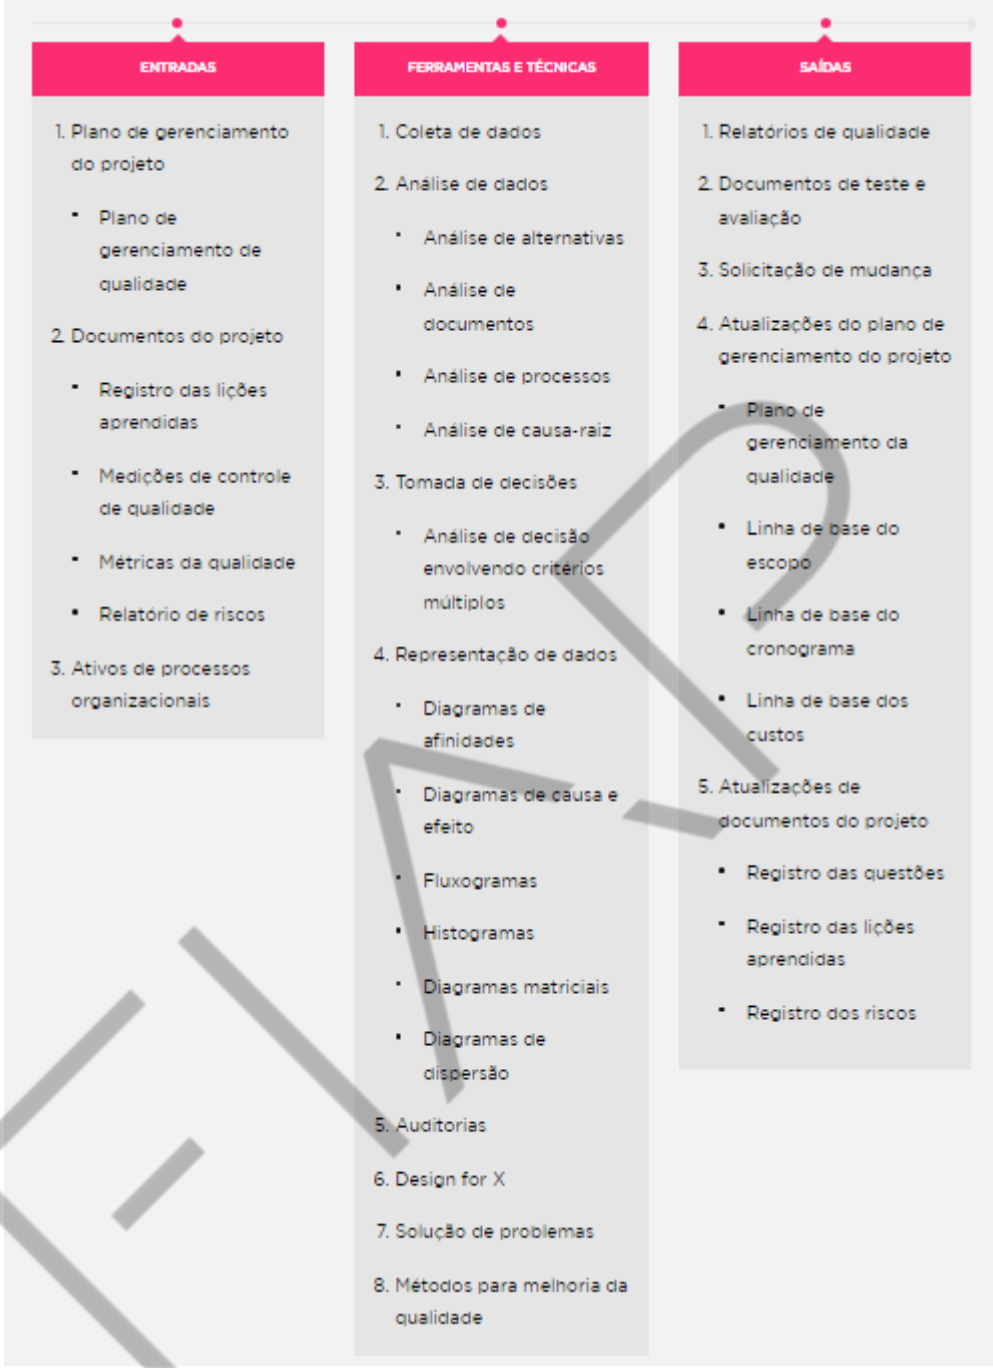

Figura 11 – Processo “Gerenciar a Qualidade” (2)
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

É possível aprimorar continuamente os processos de qualidade. Uma das ferramentas para isso são as Auditorias de Qualidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 12 – Analogia a diretoria
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

Existem dois tipos de auditorias de qualidade: aquelas que podem ser realizadas ao fim do projeto e/ou aquelas que podem ser feitas ao final da fase de garantia da qualidade.

As auditorias ao fim do projeto são essenciais para garantir que todas as lições aprendidas foram identificadas e documentadas para o uso em projetos futuros.

Em auditorias de qualidade efetuadas ao final da fase de garantia da qualidade, são feitas cinco questões:

1. Todos os interessados-chave/clientes foram identificados?
2. Para cada requisito técnico foi identificado um requisito funcional quando necessário?
3. Todos os requisitos foram expressos de forma mensurável, quando possível, especialmente aspectos de desempenho?
4. Para cada requisito existe uma tarefa evidente ou um pacote de trabalho associado para endereçar esse requisito?
5. É sabido como, por quem e quando essas tarefas serão medidas, monitoradas ou acompanhadas durante o projeto?

Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for **“não”**,
o auditor deve propor sugestões (planos de ação) com o intuito de auxiliar
o gerente e sua equipe de projetos a melhorar seus processos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

d) Mitos sobre gestão da qualidade:

Vamos esclarecer alguns mitos em relação à qualidade:

- **Qualidade custa muito caro:** provavelmente o mito mais comum. Essa conclusão surge da ideia de que o planejamento de um produto de qualidade desde o princípio demanda mais tempo, recursos e esforços no planejamento.

Embora inicialmente pareça verdade, a adição de atividades para planejamento, garantia e controle de qualidade resulta em economia em longo prazo. Isso porque evitará as rejeições e a insatisfação do cliente, resultando em correção de defeitos e retrabalho, grandes ralos de dinheiro em um projeto.

Figura 13 – Custo-benefício
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

- **Produto de categoria inferior possui baixa qualidade:** embora possa parecer verdade em algumas linhas de produtos, um produto de uma categoria inferior possui um escopo menor, ou seja, menos funcionalidades e recursos, mas não menor qualidade.

Um fusca e uma BMW têm a mesma qualidade, embora o último possua mais recursos (banco reclinável, ar-condicionado, câmbio automático, freio ABS etc.). Lembrando que qualidade é determinada pela satisfação do cliente daquele produto/serviço.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Não há tempo para produzir com qualidade:** é o mesmo argumento utilizado para não levantar e documentar o escopo corretamente.

Em alguns ramos de mercado, o pioneirismo com o lançamento de um produto à frente da concorrência pode extrapolar todos os limites do bom senso. Não apenas o planejamento da qualidade, mas o planejamento como um todo é atropelado, resultando em defeitos constantes e clientes insatisfeitos.

Figura 14 – Falta de tempo
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

Garantir a qualidade não é tão importante quanto entregar no prazo e com o custo acertados: o PMBOK® coloca a Qualidade no mesmo patamar que o Cronograma e o Custo.

De nada adianta entregar o produto do projeto dentro do prazo e orçamento, se este não estiver alinhado aos requisitos do cliente (escopo), comportando-se exatamente da maneira que deve se comportar.

1.3 Recursos Humanos

Até a 5ª edição do PMBOK, encontrávamos uma área de conhecimento específica para gestão de Recursos Humanos do projeto. O capítulo 9 desta edição era denominado GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na 6ª edição, este capítulo sofre revisões e ajustes e passa a ser denominado como GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROJETO, demonstrando a intenção do PMI em tornar a visão deste tema mais geral, embora o enfoque continue em olhar a questão humana e de desenvolvimento de equipes.

Enquanto a 6ª edição segue um padrão processual e prescritivo, a 7ª edição do PMBOK, novamente, adota a sua percepção orgânica deste assunto, preferindo demonstrar a relação dele com os demais princípios e domínios de desempenho do gerenciamento de projetos.

Na seção 3.2 - CRIE UM AMBIENTE COLABORATIVO PARA A EQUIPE DO PROJETO, encontramos as seguintes observações:

- Os projetos são entregues por equipes de projeto.
- As equipes de projeto trabalham no âmbito de culturas e diretrizes organizacionais e profissionais e, frequentemente, estabelecem sua própria cultura.
- O ambiente de uma equipe de projeto colaborativa promove:
    - alinhamento com outras culturas e diretrizes organizacionais;
    - aprendizagem e desenvolvimento pessoal e de equipe; e
    - contribuições ideais para entregar os resultados desejados.

Em domínios de desempenho de projetos, encontramos uma seção específica para tratar novamente de Equipes onde encontramos os seguintes tópicos de discussão:

- Gerenciamento e liderança da equipe do projeto.
- Cultura da equipe do projeto.
- Equipes de projeto de alto desempenho.
- Habilidades de liderança.
- Adaptando estilos de liderança.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na seção 4, MODELOS, MÉTODOS E ARTEFATOS, encontramos mais uma vez o tema recursos humanos e liderança em destaque, sendo discutidos no tópico 4.2.1, MODELOS DE LIDERANÇA SITUACIONAL, que trata de diversos modelos de liderança.

O PMBOK 6ª edição, portanto, nos oferece uma forma mais prática e didática de aprendermos mais sobre a gestão de recursos humanos em projetos, uma vez que concentra a discussão em um único capítulo.

Para os mais experientes, é interessante seguir pelo modelo da 6ª edição e adiante consultar o que a 7ª edição tem a dizer sobre gestão de recursos, motivação e desenvolvimento de equipes, bem como liderança e suas correlações com os demais domínios de desempenho em gerenciamento de projetos.

Antes de seguirmos com os processos de gestão de recursos, vejamos como este tema é fundamental para o sucesso de um projeto.

Organizações, sejam elas privadas ou públicas, resultam do trabalho de um grupo de pessoas. Empresas não têm sucesso, pessoas sim. Os recursos humanos são o bem mais precioso das corporações, empresas governamentais ou em qualquer outra instituição.

Segundo Robert W. Woodruff, ex-diretor executivo da Coca-Cola, “são as pessoas e suas reações que fazem as empresas serem bem-sucedidas ou quebrarem”.

Figura 15 – Recursos Humanos
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em uma realidade global, em que o diferencial competitivo é tão almejado, vários são os fatores para alcançá-lo, como: investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, investimentos em tecnologia e, por que não, investimentos no desenvolvimento das pessoas.

Uma das consequências de investir no capital humano é a formação de líderes capazes de criar ambientes ideais, fazendo com que as pessoas deem o melhor de si e expressem o seu potencial, criando equipes de alto desempenho.

Embora o foco dos gestores operacionais geralmente esteja centrado em processos e resultados, um bom gestor de projetos deve se preocupar com a gestão de pessoas por várias razões:

Primeiramente, como projetos são temporários em sua essência, a equipe que o compõe é alocada de forma temporária – isso significa novos relacionamentos entre pessoas, com seus hábitos, credos, egos e vícios, por isso é necessário criar um entrosamento entre pessoas que nunca haviam trabalhado juntas antes.

Além disso, a expectativa dos stakeholders e a importância que é dada por eles ao projeto são variáveis ao longo do tempo, sendo necessário que a equipe esteja preparada psicologicamente para essas adversidades.

Outro preparo psicológico importante é a “projectite” ou “agonia de fim de projeto” – os membros da equipe do projeto ficam apreensivos em relação ao seu futuro profissional, e se perguntam: “Serei realocado para outro projeto? Existe outro projeto?”, “Existe um cargo operacional para onde retornar? Já não terei sido substituído?”. Esta é outra consequência do caráter temporário dos projetos.

Por esta e outras razões, uma das habilidades mais valorizada em um gerente de projetos é seu trato com as pessoas – como sua liderança inspira e motiva, como o gerente conversa, negocia, cobra, delega, realiza o coaching e fornece feedback.

O PMBOK® 6ª edição prevê seis processos para gestão de recursos, visto que em sua última publicação, passou a chamar a área de “Recursos”, ao incluir também os recursos físicos, que também são importantes para o projeto:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

a) Planejar o Gerenciamento dos Recursos:

Planejar o Gerenciamento dos Recursos é o processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe.

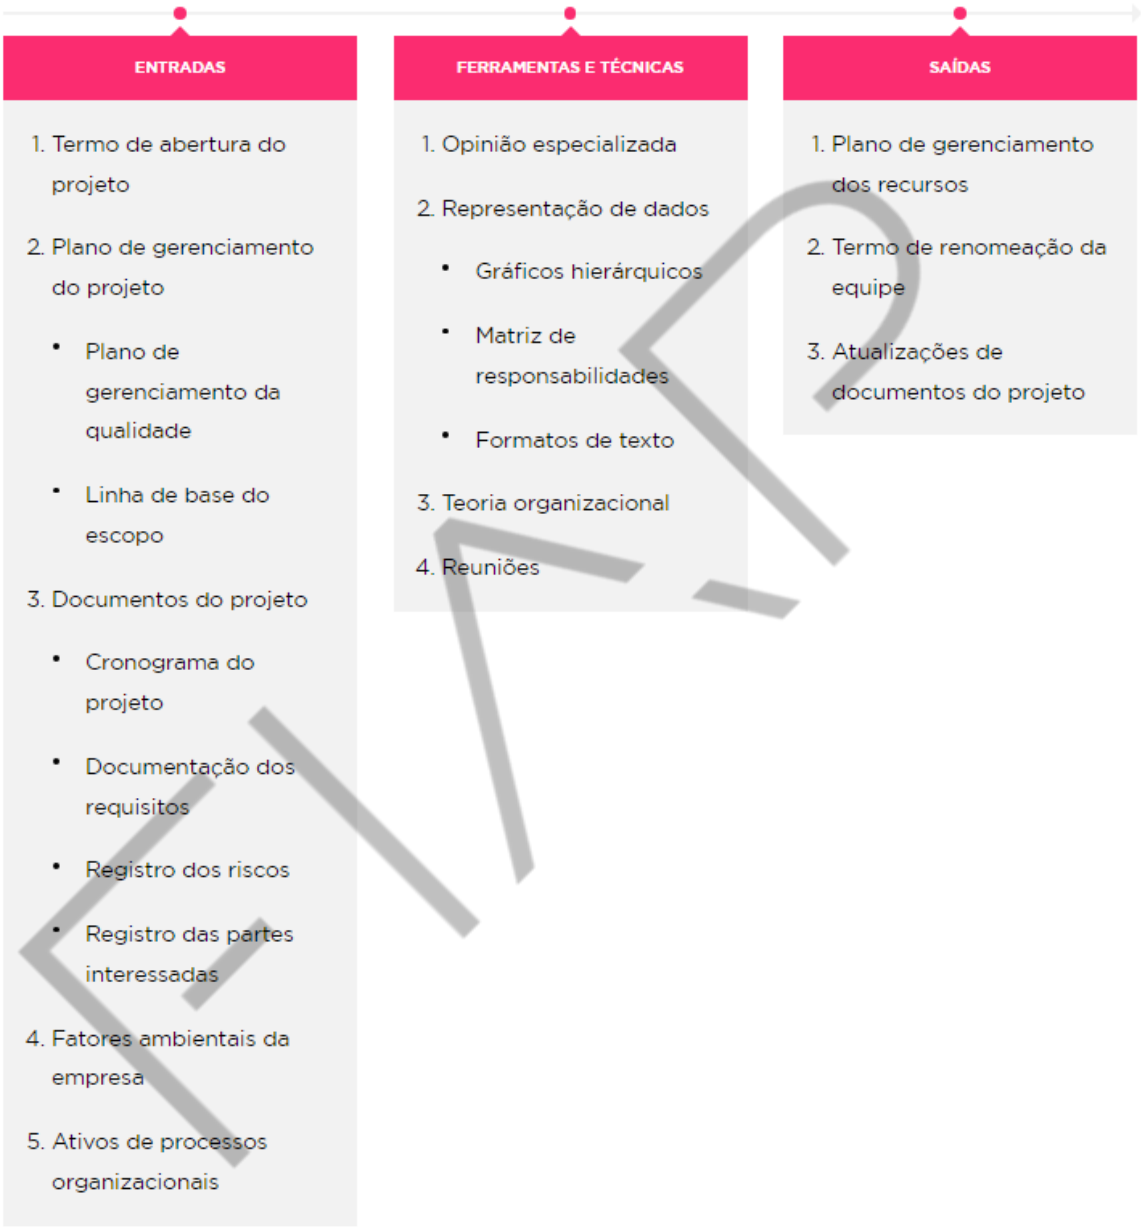

Figura 16 – Processo “Planejar o Gerenciamento de Recursos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

Uma das responsabilidades de extrema importância de um gerente de projetos é a definição da equipe do projeto.

Além disso, durante a execução do projeto, é igualmente importante manter as pessoas trabalhando bem em conjunto. É possível ter uma equipe que se dá bem e trabalha bem desde o início até o fim do projeto, mas na grande maioria dos casos a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

intervenção do gerente de projetos é necessária: resolvendo conflitos, provendo feedback, sugerindo melhorias ou motivando a equipe a trabalhar da melhor forma possível.

Geralmente, as equipes de alto desempenho resultam de um planejamento cuidadoso, avaliando suas habilidades, personalidades e capacidades técnicas, entre outros fatores.

Do ponto de vista organizacional, o gerente de projetos deve analisar ainda:

- Quais departamentos farão parte desse projeto? Quais deles serão *stakeholders* e para quais deles necessito de mão de obra qualificada e, portanto, deverão “emprestar” recursos?
- Quais são os acordos trabalhistas existentes nos departamentos para os quais preciso de mão de obra?
- Quais são os relacionamentos entre os departamentos e entre as pessoas presentes neles, sejam formais ou informais?

Quais são as necessidades técnicas do projeto? A partir disso, quais são os perfis profissionais necessários para cumpri-las?

Em projetos maiores, analisa-se ainda o ponto de vista logístico, onde estão as pessoas e qual o seu local de trabalho. Podem existir ainda profissionais que estão em países diferentes, o que pode representar barreiras culturais e temporais (em razão do fuso horário).

Um projeto pode ser representado por meio de um organograma convencional, diagrama que representa de forma simples e rápida como o projeto está organizado hierarquicamente. Essa ferramenta se faz necessária quando o projeto é grande e composto de dezenas a centenas de pessoas. Em um cenário como este, as pessoas são divididas em grupos, e o gerente de projetos terá lideranças em cada um desses grupos, para um gerenciamento efetivo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

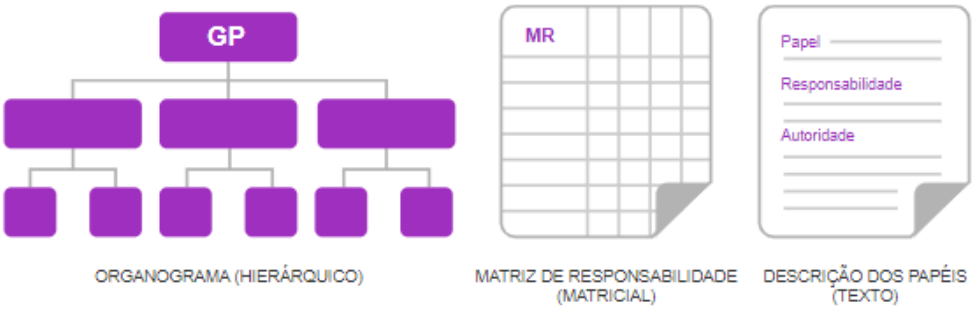

Figura 17 – Ferramentas importantes
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2017)

Uma ferramenta importante para cumprir essa necessidade é a Matriz de Responsabilidades, sendo o RACI (acrônimo para Responsible, Accountable, Consult and Inform [Responsável pela execução, Responsável pela aprovação, Consultado e Informado]) o modelo mais comum.

O RACI é especialmente importante quando a equipe possui recursos internos e externos, garantindo assim divisões claras de papéis.

Gráfico RACI	Indivíduo				
Atividade	Ana	João	Carlos	Cláudia	Sueli
Criar termo de abertura	A	R	I	I	I
Coletar os requisitos	I	A	R	C	C
Apresentar solicitação de mudança	I	A	R	R	C
Desenvolver plano de testes	A	C	I	I	R

Figura 18 – Exemplo de Matriz de Responsabilidades
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2017)

Entretanto, nenhuma delas substitui uma relação textual de descrição de cada um dos papéis necessários para o projeto, definindo bem suas responsabilidades e autoridades.

Escolha as melhores ferramentas para suas necessidades e formalize suas necessidades de recursos humanos no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos.

O Plano de Gerenciamento da Equipe ou Plano de Gerenciamento de Pessoal é uma formalização dessas necessidades relacionadas à equipe, e deve incluir:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Papéis e suas responsabilidades;
- Organogramas do projeto (essenciais em projetos grandes);
- Quando e como os recursos serão contratados;
- Políticas de contratação e dispensa da empresa (recursos internos ou externos);
- Vínculo entre recursos e empresa (Empregado? Terceiro? PJ ou CLT?);
- Tempo de contratação;
- Como e quando os recursos serão alocados no projeto;
- Plano de mobilização de pessoas para outros projetos ou para a área funcional de origem;
- As necessidades e políticas de treinamento dos recursos;
- Orçamento, necessidades e políticas de viagens (quando houver);
- Sistema de avaliações, benefícios e recompensas do projeto.

b) Estimar os Recursos das Atividades:

Estimar os Recursos das Atividades é o processo de estimar recursos da equipe, bem como o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Qualidade/RH

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos recursos • Linha de base do escopo 2. Documentos do projeto • Atributos das atividades • Lista de atividades • Registro de premissas • Calendários dos riscos • Registro dos riscos 3. Fatores ambientais da empresa 4. Ativos de processos organizacionais	1. Opinião especializada 2. Estimativa "bottom-up" 3. Estimativa análoga 4. Estimativa paramétrica 5. Análise de dados • Análise de alternativas 6. Sistemas de informações de gerenciamento de projetos 7. Reuniões	1. Requisitos de recursos 2. Bases das estimativas 3. Estrutura analítica dos recursos 4. Atualizações de documentos do projeto • Atributos das atividades • Registro de premissas • Registro das lições

Figura 19 – Processo "Estimar Recursos das Atividades"
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

c) Adquirir Recursos:

Adquirir recursos é o processo de obter membros para a equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Qualidade/RH

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos recursos 2. Documentos do projeto • Registro das lições aprendidas • Cronograma do projeto • Designações da equipe do projeto • Termo de nomeação da equipe 3. Fatores ambientais da empresa 4. Ativos de processos organizacionais	1. Agrupamento 2. Equipes virtuais 3. Tecnologias de comunicações 4. Habilidades interpessoais e de equipe • Gerenciamento de conflitos • Influência • Motivação • Negociação • Construção de equipes 5. Reconhecimento e recompensas 6. Treinamento 7. Avaliações individuais 8. Reuniões	1. Avaliações do desempenho da equipe 2. Solicitação de mudança 3. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto 4. Atualizações de documentos do projeto • Registro das lições aprendidas • Cronograma do projeto • Designação do projeto • Designações da equipe do projeto • Calendário dos recursos • Termo de nomeação da equipe 5. Atualizações nos fatores ambientais da empresa 6. Atualizações de ativos de processo organizacionais

Figura 20 – Processo “Adquirir Recursos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

d) Desenvolver a equipe:

Processo que visa a melhoria de competências, interação e ambiente da equipe para aprimorar o desempenho do projeto, provendo treinamento, reconhecendo o bom trabalho, recompensando, mantendo, motivando, liderando e inspirando a equipe de projeto. A finalidade é ter uma equipe de alto desempenho e que cumpra os objetivos do projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Qualidade/RH

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos recursos 2. Documentos do projeto • Registro das lições aprendidas • Cronograma do projeto • Designações da equipe do projeto • Termo de nomeação da equipe 3. Fatores ambientais da empresa 4. Ativos de processos organizacionais	1. Agrupamento 2. Equipes virtuais 3. Tecnologias de comunicações 4. Habilidades interpessoais e de equipe • Gerenciamento de conflitos • Influência • Motivação • Negociação • Construção de equipes 5. Reconhecimento e recompensas 6. Treinamento 7. Avaliações individuais e da equipe 8. Reuniões	1. Avaliações do desempenho da equipe 2. Solicitação de mudança 3. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto 4. Atualizações de documentos do projeto • Registro das lições aprendidas • Cronograma do projeto • Designações da equipe do projeto • Calendários dos recursos • Termo de nomeação da equipe 5. Atualizações nos fatores ambientais da empresa 6. Atualizações de ativos e processos organizacionais

Figura 21 – Processo “Desenvolver a Equipe”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

Habilidades interpessoais são poderosas ferramentas para o desenvolvimento de equipe. São conhecidas também como “habilidades não técnicas” ou soft skills e abrangem, por exemplo: empatia, influência, criatividade e facilitação de grupo, que o gerente de projetos aplica, reduzindo os problemas gerados por relacionamento ou falha de comunicação no projeto, ajudando o líder a compreender os sentimentos e o clima da equipe, antevendo suas ações, bem como acompanhando e tratando eventuais preocupações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

e) Gerenciar a equipe do projeto:

Este processo visa acompanhar o desempenho de membros da equipe, fornecendo feedback, resolvendo questões e gerenciando mudanças de ordem pessoal com foco na otimização e no desempenho da equipe no projeto.

O gerente de projetos precisa, portanto, observar o comportamento dos membros do projeto, gerenciando conflitos entre eles e avaliando seus desempenhos individualmente. Esse GP deve possuir habilidades especiais em comunicação, como oratória e boa articulação, gerenciamento de conflitos, negociação e liderança.

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos recursos 2. Documentos do projeto • Registro das questões • Registro das lições aprendidas • Designações da equipe do projeto • Termo de nomeação da equipe 3. Relatórios de desempenho do trabalho 4. Avaliações do desempenho da equipe 5. Fatores ambientais da empresa 6. Ativos de processos organizacionais	1. Habilidades interpessoais e de equipe • Gerenciamento de conflitos • Tomada de decisões • Inteligência emocional • Influência • Liderança 2. Sistema de informações de gerenciamento de projetos	1. Solicitação de mudança 2. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos recursos • Linha de base do cronograma • Linha de base dos custos 3. Atualizações de documentos do projeto • Registro das questões • Registro das lições aprendidas • Designações da equipe do projeto 4. Atualizações nos fatores ambientais da empresa

Figura 22 – Processo “Gerenciar a Equipe”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

f) Controlar Recursos:

Controlar os recursos é o processo de garantir que os recursos atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado, bem como monitorar a utilização planejada versus a utilização real de recursos e executar ação corretiva conforme necessário.

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos recursos 2. Documentos do projeto • Registro das questões • Registro das lições aprendidas • Designações de recursos físicos • Cronograma do projeto • Estrutura analítica dos recursos • Requisitos de recursos • Registro dos riscos 3. Dados de desempenho do trabalho 4. Acordos 5. Ativos de processos organizacionais	1. Análise de dados • Análise de alternativas • Análise de custo-benefício • Análise de desempenho • Análise de tendências 2. Soluções de problemas 3. Habilidades interpessoais e de equipe • Negociação • Influência 4. Sistema de informações de gerenciamento de projetos	1. Informações sobre o desempenho do trabalho 2. Solicitações de mudança 3. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos recursos • Linha de base do cronograma • Linha de base de custos 4. Atualizações de documentos do projeto • Registro de premissas • Registro das questões • Registro das lições aprendidas • Designações de recursos físicos • Estrutura analítica dos recursos • Registro dos riscos

Figura 23 – Processo “Controlar Recursos”
Fonte: Guia PMBOK® 6ª edição (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HELDMAN, Kim. **Gerência de Projetos**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique Ferreira. **Gestão de Projetos:** uma abordagem global. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

PETERS, Tom. **The Brand called you**. Disponível em: <http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you>. Acesso em: 25 mai. 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (GUIA PMBOK). 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (GUIA PMBOK)**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

SENA, Nara. **A importância das pessoas nas organizações**. Publicado em: 20 mar. 2014. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-importancia-das-pessoas-nas-organizacoes/22510/>. Acesso em: 25 mai. 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com
