GESTÃO DE PROJETOS

COMUNICAÇÕES

6

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Como uma comunicação funciona 5
Figura 2 – Informação demais acaba desinformando 7
Figura 3 – Falhas de comunicação 9
Figura 4 – Processo “Planejar o gerenciamento das comunicações”.....11
Figura 5 – Processo “Gerenciar as comunicações”.....13
Figura 6 – Processo “Monitorar as comunicações” 16
Figura 7 – Reuniões para discussão do projeto 17
Figura 8 – Gráfico evolução física do projeto – Percentual físico Previsto x Realizado. Pontos em azul indicam baseline previsto de evolução do projeto. Pontos em vermelho representam as leituras reais de evolução do projeto 20
Figura 9 – Gráfico Evolução Regressiva - Burndown.....21
Figura 10 – Exemplo de *Dashboard* de Desempenho de um Projeto 23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 COMUNICAÇÕES....4
1.1 Introdução....4
1.2 Conceito....4
1.3 Métodos de comunicação....5
1.4 Cuidados para uma comunicação adequada....6
2 COMUNICAÇÕES NO CONTEXTO DE PROJETO....8
2.1 Planejar o gerenciamento das comunicações....10
2.2 Gerenciar as comunicações....13
2.2.1 Ferramentas e técnicas....14
2.3 Monitorar as comunicações....15
2.3.1 Reuniões....16
2.3.2 Atas de reuniões....17
2.3.3 A Prestação de Contas em um Projeto – Relatórios de Desempenho....18
REFERÊNCIAS....24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 COMUNICAÇÕES

1.1 Introdução

A comunicação foi essencial para o desenvolvimento da civilização humana. Uma das grandes qualidades humanas é exatamente esta: a capacidade de se comunicar e de registrar, por escrito ou outros meios, seus pensamentos. Se por um lado, a tecnologia permitiu todas essas trocas comunicacionais por meios digitais, como redes sociais e serviços de mensagens, por outro, ela criou a demanda por novas tecnologias de análise de dados (como o Big Data) e processamento acelerado (Virtualização e *Cloud Computing*).

Comunicar-se é importante e, em um projeto, isso não é diferente. Como diria um grande comunicador em sua época: “Quem não se comunica se trumbica”. Décadas se passaram e esta frase continua muito atual.

Diz-se que o trabalho de um gerente de projeto ocorre em mais de 70% nos domínios da comunicação entre as partes interessadas. Gerentes de projetos que costumam ficar atrás de monitores de computares ou trancados em suas salas, em geral, acabam sendo vítimas da falta de comunicação. Comunicação precária definitivamente não funciona bem com projetos.

Veremos mais adiante a estrutura de processos de comunicação e de como isso funciona dentro de um projeto. Mais uma vez adotaremos o modelo procedural do PMBOK 6ª edição, o que torna mais compreensível a importância e a forma de se aplicar esse importante tema em um projeto.

Neste capítulo, também veremos como formalizar as comunicações de um projeto.

1.2 Conceito

Comunicação vem da palavra em latim *communicare,* que significa “tornar comum” ou “compartilhar”, sendo sua principal finalidade se fazer compreender ao expressar ideias, pensamentos ou sentimentos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A comunicação possui alguns princípios importantes. O emissor codifica a mensagem utilizando um vocabulário e uma gramática para tanto, transmitindo a mensagem em um dado meio. O receptor decodifica a mensagem, usando seus próprios conhecimentos de gramática e vocabulário para fazê-lo. Em seguida, uma mensagem de *feedback* é gerada de alguma maneira, confirmando ao emissor o recebimento da mensagem por parte do receptor, possibilitando a continuidade da transmissão.

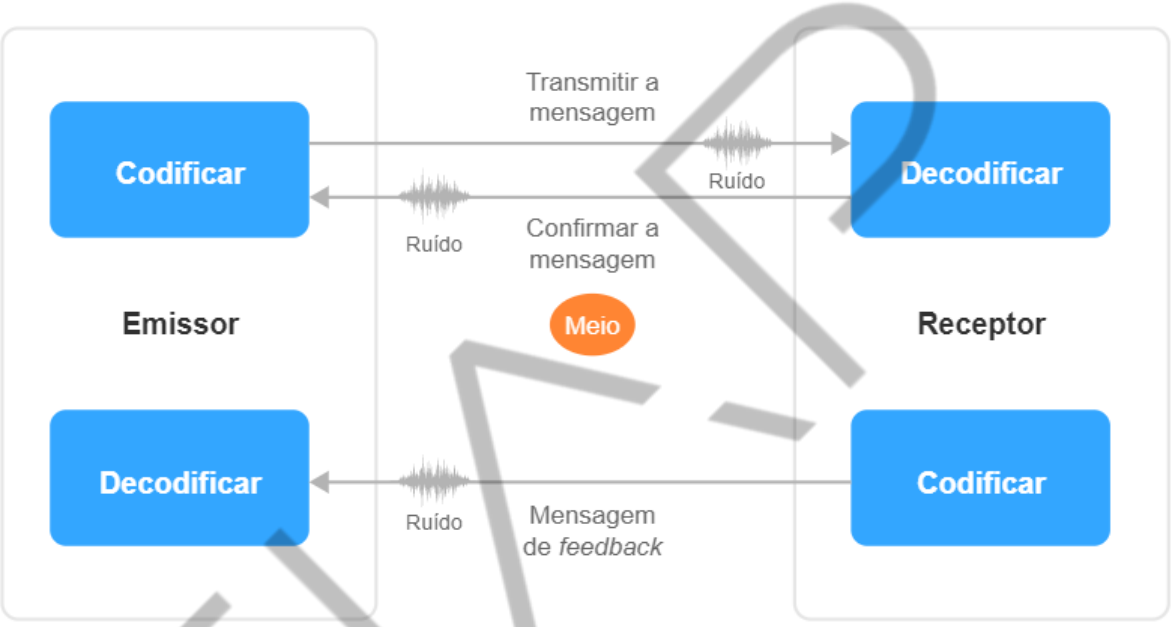

Figura 1 – Como uma comunicação funciona
Fonte: PMBOK® 6ª Edição (2017)

Portanto, uma boa comunicação não está tão relacionada com o uso de um vasto vocabulário e, sim, com a capacidade de compreender e ser compreendido, sendo necessário o uso de um vocabulário comum.

1.3 Métodos de comunicação

- **Escrita:** o uso de sinais ou símbolos para expressar ideias humanas foi fundamental no desenvolvimento da humanidade, tendo como principal vantagem a transmissão do conhecimento a longo prazo e como principal desvantagem a ausência de entonação. A comunicação escrita pode ser dividida em duas categorias: formais, utilizadas em contratos e documentos oficiais; e informais, usadas em e-mails, por exemplo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Oral (Falada):** o uso do aparelho fonador na produção de sons codificados em uma linguagem humana através de meio aéreo tem como principal vantagem a praticidade e a velocidade de comunicação, em detrimento do seu efeito de longo prazo e falta de comprovação posterior. Pode ser formal, como a utilizada em apresentações ou palestras, ou informal, como uma "conversa de cafezinho".
- **Não verbal:** de acordo com Mehrabian (1981), 55% das comunicações entre seres humanos são não verbais, ou seja, há ausência de palavra. Por essa razão, quando uma comunicação oral e presencial é realizada, o impacto total da mensagem pode ser estimado da seguinte maneira:

Impacto Total da Mensagem =   *Palavras (7%) + Tom de Voz (38%) + Expressões Faciais (55%)*

Sendo assim, o valor da comunicação não verbal não pode ser ignorado, devendo, sim, ser considerado.

1.4 Cuidados para uma comunicação adequada

Um dos principais problemas da comunicação é o ruído, que pode ser qualquer coisa que distorça, distraia, comprometa ou cause perdas no significado original da mensagem.

Entre outros, o ruído pode ser causado por:

- Canais de comunicação não definidos claramente.
- Uso inadequado de vocabulário, gírias ou termos técnicos.
- Fatores ambientais de distração, como barulhos ou odores.
- Em comunicações orais, velocidade da fala e falta de articulação.
- Hostilidade, descrença, preconceitos e diferenças culturais.
- Informação excessiva.

"Informação nunca é demais" é um pensamento que remete a uma era pré-Internet, quando a informação era escassa e de difícil acesso. Se a princípio, a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

existência da Internet parece consolidar tal afirmação, ela mesma comprova que informações demais, das mais diferentes qualidades, podem desinformar mais do que informar.

Figura 2 – Informação demais acaba desinformando
Fonte: Banco de Imagens Shutterstock (2017)

Em uma geração de X e *timelines* de Facebook, menos se torna mais. Com pouco tempo disponível para se informar, as pessoas buscam por informações mais concisas e objetivas.

Quem realmente lê um e-mail de 50 linhas, quando se espera como resposta um simples “Sim” ou “Não”?

A informação deve ser gerada levando em consideração o receptor da mensagem. Quando falamos dos níveis hierárquicos mais altos em uma empresa, como gerentes, superintendentes e presidentes, estes geralmente buscam informações mais consolidadas e sumarizadas, requisitando mais detalhes apenas conforme acharem necessário. Entretanto, por estarem mais próximos dos processos operacionais, os níveis hierárquicos mais baixos necessitam de informações mais ricas em detalhes. Assim sendo, a mesma informação precisa ser gerada com tamanhos diferentes, visando atingir receptores diferentes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 COMUNICAÇÕES NO CONTEXTO DE PROJETO

Certamente, você já ouviu a frase “Propaganda é a alma do negócio”. Parafraseando, podemos dizer aqui que a “Comunicação é a alma do negócio” e esse negócio, em nosso caso, é o projeto. Comunicar-se é uma necessidade humana fundamental e essencial para o sucesso de um projeto: como ele é composto por pessoas, elas precisam saber exatamente o que cada uma está fazendo para poder articular melhor suas ações.

Além disso, o projeto possui várias partes interessadas que podem ser clientes, gerentes de outras áreas, superintendentes ou até mesmo o presidente da empresa, e cada uma dessas partes tem expectativas em relação ao projeto.

Percebeu aqui a interdependência entre temas? Comunicação e as Partes Interessadas – os Stakeholders? Neste ponto, fica interessante salientar a conveniência do PMBOK, já que este possui, entre as demais disciplinas, duas áreas de conhecimento para tratar respectivamente da comunicação e do gerenciamento das partes interessadas em um projeto. Tanto uma quanto a outra carregam fortes interdependências e merecem atenção especial.

Comunicações mal planejadas significam pessoas importantes desinformadas, ou seja, o projeto é um negócio como qualquer outro e precisa de seu marketing bem realizado, caso contrário, ele corre o risco de perder prioridade em relação a outros projetos na mesma empresa, podendo, inclusive, ser cancelado prematuramente em um eventual corte de gastos. Portanto, lembre-se: se o alto escalão souber pouco sobre seu projeto, ele não deve ser tão importante.

A maioria dos especialistas em gestão de projetos e pesquisas aponta **falhas de comunicação** como sendo um dos principais problemas em projetos. Elas podem aumentar os conflitos entre equipe de projeto e partes interessadas e resultar em problemas maiores. Para evitar tais falhas, um gerente de projetos pode dedicar até 90% do seu tempo realizando as comunicações do projeto. Dada a importância, nada mais coerente do que formalizar e organizar procedimentos tão relevantes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3 – Falhas de comunicação
Fonte: Banco de Imagens Shutterstock (2017)

Na 6ª edição do PMBOK, encontramos os seguintes processos de gerenciamentos das comunicações:

- **Planejar o gerenciamento das comunicações:** processo responsável por desenvolver uma abordagem e um plano adequado para atividades de comunicação do projeto com base nas necessidades de informação de cada parte interessada ou grupo, nos ativos organizacionais disponíveis e nas necessidades do projeto.
- **Gerenciar as comunicações:** processo de assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição final das informações do projeto, de forma oportuna e adequada.
- **Controlar as comunicações:** necessário para garantir que as necessidades de informação do projeto e de suas partes interessadas sejam atendidas.

Já a 7ª Edição, trata o mesmo tema distribuído ao longo de todo o documento, começando pelo domínio de desempenho do planejamento e do trabalho do projeto em que ele trata o planejamento da comunicação, a comunicação adequada com as partes interessadas e o engajamento no projeto, bem como a verificação de resultados do trabalho. Na seção 4, em Modelos, Métodos e Artefatos, a 7ª edição discute modelos de comunicação e de conflito, reuniões e eventos, bem como os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

planos do projeto que compreendem meios propostos para se comunicar e realizar algo.

Os já iniciados no conteúdo do PMBOK irão perceber que a 7ª edição, ao final, remete aos mesmos conceitos que encontramos na 6ª edição, porém prefere abordar os mesmos de forma sistêmica e distribuída com os demais temas ao longo de todo o documento. A 6ª edição, sendo mais processual, tem a vantagem de concentrar o tema comunicação em um único capítulo.

Vejamos então os processos para o gerenciamento das comunicações em um projeto segundo a 6ª Edição.

2.1 Planejar o gerenciamento das comunicações

Neste processo, planejamos as comunicações do projeto de maneira coerente com as necessidades de informação de todas as partes interessadas, levando em consideração os ativos organizacionais disponíveis.

Embora existam vários projetos em uma mesma empresa que compartilhem de ativos organizacionais, como salas de reunião, sistema de correio eletrônico, Intranets, servidores de compartilhamento de arquivos, entre outros, as necessidades de comunicação de cada projeto podem ser diferentes, fazendo-se necessária a formalização usando um Plano de Gerenciamento das Comunicações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4 – Processo “Planejar o gerenciamento das comunicações”
Fonte: PMBOK® 6ª Edição (2017)

Cada evento de comunicação, seja este um relatório, uma reunião ou uma apresentação, possui seu próprio formato, vigência, destino e necessidade. Sendo assim, para cada um deles, nos questionamos:

- Quem precisa de quais informações? Além disso, quem está autorizado a acessar? E quais delas? Se as informações precisarem ser coletadas e formatadas, quem será o responsável por isso?
- Quando as informações serão necessárias? Exemplo: reuniões de levantamento de requisitos não acontecem durante o projeto todo, apenas em suas fases de iniciação e planejamento.
- Onde as informações devem ser armazenadas? Qual(is) é(são) o(s) repositório(s) oficial(is) de comunicações do projeto?
- De que forma as informações serão coletadas? Em que formato serão criadas?
- Qual o meio de distribuição da informação? Um relatório será encaminhado fisicamente, em uma reunião? Será encaminhado digitalmente por e-mail? Ou será armazenado em um determinado repositório que os atendidos por ele devem acessar diretamente?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vejamos um exemplo de preenchimento de uma reunião muito conhecida em âmbito de grandes projetos, chamada *Kick Off Meeting* (ou reunião inicial de apresentação do projeto).

Kick Off Meeting:

a) **Objetivo:** apresentar para parte da empresa o projeto X, seu objetivo e sua importância para a empresa, quais são seus prazos e custos. Como objetivo secundário, apresentar o gerente de projeto e seu time para a empresa, buscando construir um ambiente colaborativo e integrado.

b) **Metodologia:** apresentação audiovisual com *coffee-break*.

c) **Responsável:** Paulo Mendes, gerente do projeto.

d) **Envolvidos**: time de projeto, patrocinador (Fernando Vargas) e convidados (gerentes departamentais e nível superior).

e) **Data e horário:** 2 de março de 2022, às 9h.

f) **Duração:** 2 horas e meia.

g) **Local:** auditório da empresa, sede, 11º andar.

Outro artefato comum é um relatório de situação do projeto, também conhecido como *Status Report*, que poderia ser formalizado da seguinte maneira:

Status Report:

a) **Objetivo**: informar o andamento do projeto, seus indicadores e principais eventos às seguintes partes interessadas – patrocinador e gerentes departamentais afetados pelo projeto.

b) **Frequência:** semanalmente, gerado sempre às segundas-feiras, retratando a semana anterior.

c) **Responsável:** Paulo Mendes, gerente do projeto.

d) **Vigência**: de 2 de março a 11 de novembro de 2022.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

e) **Formato:** *template* formalizado no índice 3.9 deste Plano de Gerenciamento das Comunicações, gerado como arquivo PDF e enviado através de e-mail.

Sendo assim, um bom Plano de Gerenciamento das Comunicações deve possuir a formalização de quais comunicações são formais e quais não são, quais os eventos de comunicação do projeto (conforme exemplificados há pouco), quais são os repositórios oficiais de comunicação e, como anexo, *templates* de relatórios e atas de reunião.

2.2 Gerenciar as comunicações

Gerenciar as comunicações compreende realizar a coleta e estabelecer o formato, a distribuição e o armazenamento exatamente conforme foi planejado no Plano de Gerenciamento das Comunicações.

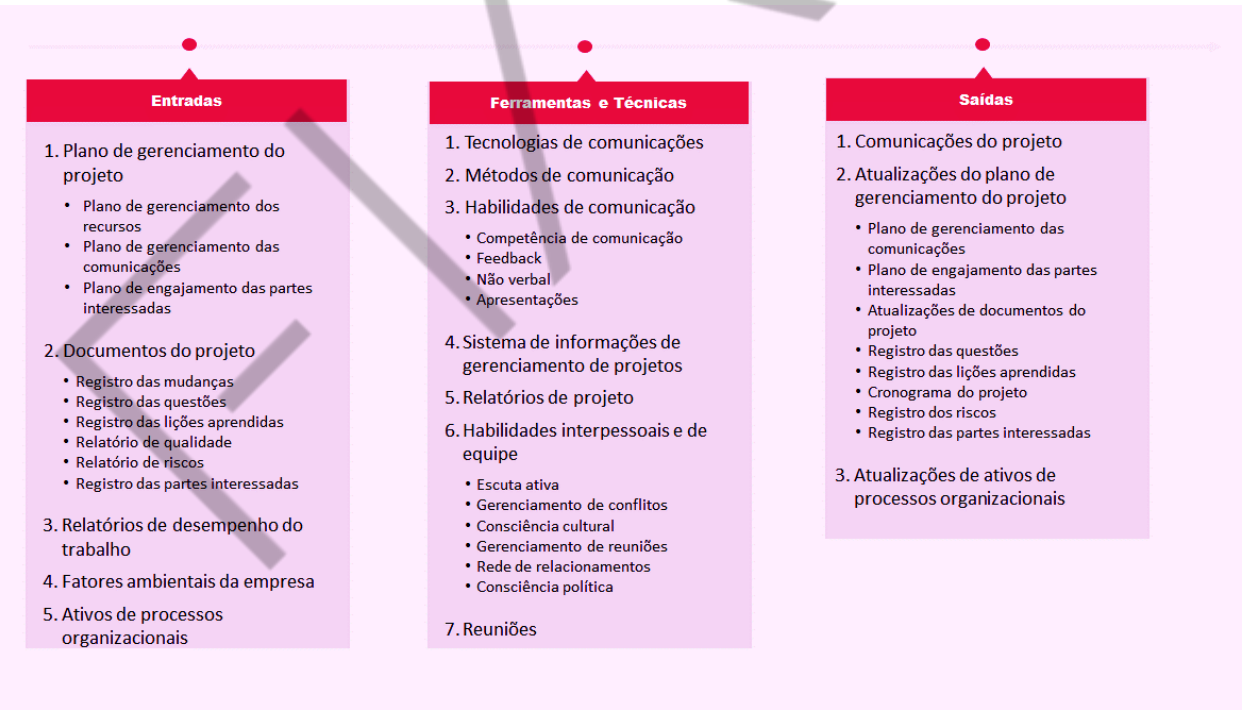

Figura 5 – Processo “Gerenciar as comunicações”
Fonte: PMBOK® 6ª Edição (2017)

Um dos principais objetivos é assegurar que as informações estão sendo geradas, recebidas e compreendidas de forma adequada e, para tanto, podem-se utilizar de técnicas como:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Modelos de emissor-receptor**: a incorporação de ciclos de feedback para fornecer oportunidades de interação/participação e remover barreiras para a comunicação eficaz.
- **Escolha dos meios de comunicação**: as decisões sobre aplicação de artefatos de comunicação para atender necessidades de projeto específicas, como quando comunicar por escrito *versus* oralmente, quando preparar um memorando informal *versus* um relatório formal e quando usar opções ativas/passivas e a escolha de tecnologia apropriada.
- **Estilo de redação**: uso adequado da voz ativa ou passiva, estrutura das frases e escolha das palavras.
- **Gerenciamento de reuniões**: preparar a pauta, convidar participantes essenciais e garantir que compareçam. Lidar com conflitos dentro da reunião ou resultantes de seguimento inadequado de atas e ações, ou comparecimento das pessoas erradas.
- **Apresentações**: consciência do impacto da linguagem corporal e desenvolvimento de recursos visuais.
- **Facilitação**: desenvolver consenso e superar obstáculos como dinâmicas de grupo difíceis e manter o interesse e o entusiasmo entre os membros do grupo.
- **Escuta ativa**: escutar ativamente envolve reconhecer, esclarecer, confirmar, entender e remover as barreiras que afetam negativamente a compreensão.

2.2.1 Ferramentas e técnicas

Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos (SIGP): trata-se do conjunto de ferramentas para o gerenciamento de informações e do projeto, tais como:

- **Ferramentas eletrônicas para gerenciamento de projetos**: software de gerenciamento de projetos, software para reuniões e apoio a escritórios

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

virtuais, interfaces web, portais e painéis de controle de projeto especializados e ferramentas colaborativas de gerenciamento de trabalho.

- **Gerenciamento eletrônico das comunicações**: e-mail e correio de voz; áudio, vídeo e reunião pela Internet, websites e publicação na web.
- **Gerenciamento de mídias sociais**: websites e publicação na web; blogs e aplicativos que oferecem a oportunidade para engajar as partes interessadas e formar comunidades online.

Relatórios de desempenho: compreendem coletar e distribuir informações referentes ao desempenho do projeto e envolvem a análise periódica da linha de base (o planejamento que foi acordado e aprovado) contra a coleta das informações reais no momento, determinando o andamento e prevendo se os resultados serão ou não atingidos conforme planejado.

Podem incluir:

- Informações do Relatório de Desempenho anterior.
- Tempo planejado x Tempo realizado (até o momento).
- Custo planejado x Custo realizado (até o momento).
- Situação atual dos riscos (identificados x ocorridos), respostas aplicadas e sua efetividade.
- Trabalho concluído no período.
- Trabalho que deverá ser concluído no próximo período (próximos passos).
- Mudanças aprovadas no período.

2.3 Monitorar as comunicações

Compreende o processo de garantir que as necessidades de informação do projeto e de suas partes interessadas sejam atendidas.

Com o Plano de Gerenciamento das Comunicações, comunicações e dados de desempenho em mãos, além de assegurar que todas as partes interessadas estejam sendo devidamente informadas, verifica-se, por meio de análise e opinião especializada se eventos de comunicação são suficientes ou precisam ser

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

aprimorados de alguma forma. Isso é feito aumentando a frequência de uma reunião ou relatório, adicionando novas informações a ele, entre outras possibilidades.

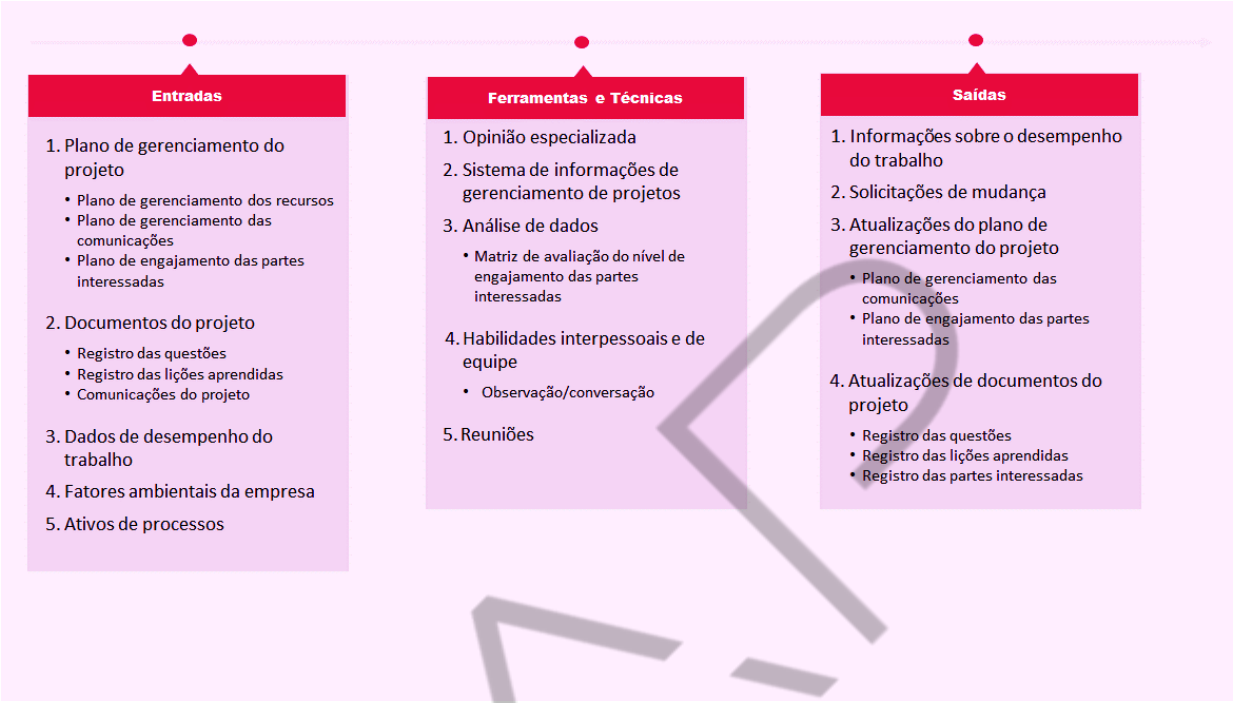

Figura 6 – Processo “Monitorar as comunicações”
Fonte: PMBOK® 6ª Edição (2017)

2.3.1 Reuniões

Com o objetivo de determinar a melhor maneira de atualizar e comunicar o desempenho do projeto e responder às solicitações de informações, o gerente de projetos, sua equipe e até mesmo fornecedores e vendedores devem realizar discussões e diálogos, que são facilitados através de reuniões. Podem ser conduzidas presencialmente em vários lugares, como o local do projeto ou do cliente, ou remotamente (*on-line*), utilizando as mais novas tecnologias de reuniões e videoconferência.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 7 – Reuniões para discussão do projeto
Fonte: Banco de Imagens Shutterstock (2017)

2.3.2 Atas de reuniões

Para formalizar as reuniões no formato escrito, atas de reuniões são os artefatos que devem ser utilizados para esse objetivo. Elas não são, de maneira alguma, uma transcrição “na íntegra” da reunião, mas um documento que sintetiza as principais informações coletadas.

Uma boa ata de reunião possui:

- **Título da reunião e nome do projeto:** é uma reunião de alinhamento? Uma reunião de levantamento de requisitos ou riscos? Nomeie a reunião de acordo com o evento de comunicação formalizado no Plano de Gerenciamento das Comunicações.
- **Data e hora do início da reunião.**
- **Data e hora do final da reunião.**
- **Local:** onde a reunião aconteceu? Foi em uma sala de reuniões? Em qual unidade?
- **Participantes e seus cargos:** e, principalmente, quem foi convidado para a reunião e quem realmente compareceu?
- **Pauta da reunião/objetivo:** nenhuma reunião sequer pode ser marcada sem um objetivo, uma pauta preestabelecida. Qual o propósito da reunião?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Discussões:** nesta parte, formalizam-se os principais pontos discutidos, declarações de participantes e outros.
- **Resultados obtidos ou conclusões:** resumem-se aqui as conclusões que foram obtidas a partir das discussões realizadas.
- **Compromissos:** neste item, formalizam-se os compromissos estabelecidos, ou seja, quem ficou de fazer o quê e para quando.

Falaremos sobre as reuniões com mais detalhes em breve.

2.3.3 A Prestação de Contas em um Projeto – Relatórios de Desempenho

Um importante instrumento de comunicação de um projeto que não pode ser esquecido pela sua gestão são os Relatórios de Desempenho.

Os Relatórios de Desempenho possuem uma combinação de documento formal de situação do projeto com uma reunião de prestação de contas, cuja audiência corresponde às altas hierarquias interessadas no projeto. Em geral, essas hierarquias tratam-se de gerências e diretorias das principais áreas envolvidas no projeto, mas em projetos de grande amplitude organizacional essas hierarquias avançam até a Presidência ou mesmo os Conselhos de Acionistas. Daí a importância do cuidado na elaboração e apresentação destes relatórios.

Comumente conhecidos nos meios profissionais pelo termo "*Status Report*", é importante que a prestação de contas ocorra de forma muito direta e objetiva. A reunião na qual o Status é apresentado também deve ser breve. Reuniões de *Status Report* que avançam para além de uma hora indicam fatalmente projetos com problemas. Os executivos que participam, em geral, não gostam de se estender em discussões de problemas técnicos e nem tampouco serem envolvidos em discussões de problemas que a resolução pode ser dada dentro do domínio da Gestão do Projeto. Eles querem e cobram objetividade, uma vez que a sessão de *Status* serve para prestação de contas e para a escalação de problemas que fogem a hierarquia do Gerente do Projeto e demandam ações de apoio desses executivos presentes na reunião.

A reunião de *Status Report* de um Projeto desenvolve-se a partir de um documento de apresentação, em geral confeccionado em slides, utilizando o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Microsoft PowerPoint ou algum *software* com a mesma finalidade. Ao confeccioná-lo, o Gerente de Projeto normalmente se vale de modelos que podem ser os já adotados pela empresa onde o projeto está sendo realizado ou ainda modelos desenvolvidos por uma Consultoria que eventualmente apoie o projeto. Quando não há modelos predefinidos, a Gestão do Projeto pode definir um.

Independentemente de se ter um modelo ou ter que desenvolver um, é imprescindível que uma apresentação de *Status* deva se ater a entregar, de forma muito direta e objetiva, as seguintes questões e suas respectivas respostas:

- Evolução – Planejado x Realizado:
    - Qual a evolução física esperada para o projeto naquele momento?
    - Qual a evolução física real do projeto naquele momento?
- Qual é o atual desvio do projeto? (se houver)
    - Quais são as frentes de origem dos desvios?
    - Quais são as razões causadoras dos desvios?
    - Quais são as ações de recuperação sendo adotadas?
    - Quando teremos o projeto de volta ao baseline planejado?
- Informações de entregas ocorridas no período.
- Informações de próximas entregas previstas.
- Pendências relevantes.
- Riscos e alertas do projeto.

Entrar em uma reunião de *status* sem estar preparado para responder as questões acima é um grande risco para o gestor do projeto, uma vez que revelará a incapacidade do mesmo em se comunicar com hierarquias mais altas e sofisticadas.

As apresentações de *status* costumam se valer de imagens gráficas consolidadas em um único *Dashboard* para sintetizar parte das informações mencionadas acima. É um importante recurso para consolidar informações da situação de um projeto, mas deve-se tomar cuidado para que se evite painéis

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

poluídos e exagerados, em cores fortes e destoantes. Opte sempre por distribuição clara de informações resumidas. Adote estéticas que façam uso de cores sóbrias e frias para evitar dificuldades na interpretação das informações nele contidas.

Um típico gráfico utilizado nesses painéis é o gráfico de evolução física, consistindo basicamente em duas curvas: Previsto x Realizado. A figura seguinte representa esse recurso.

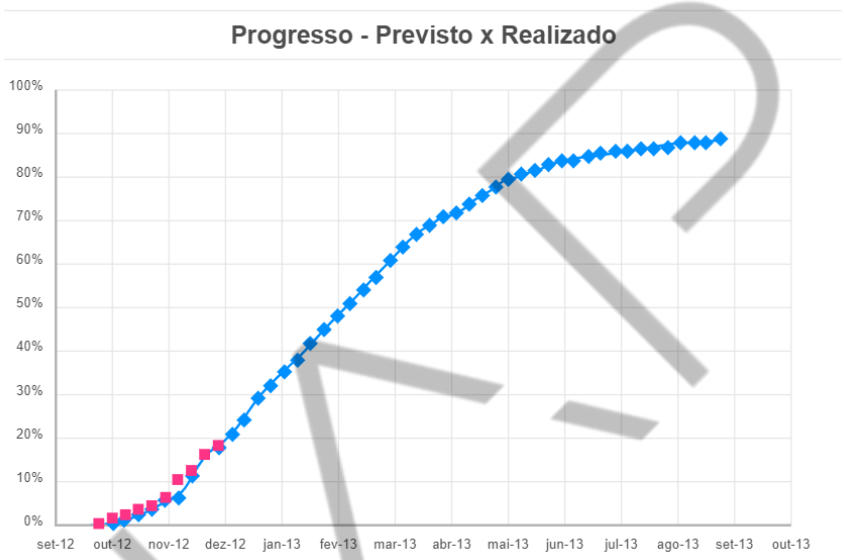

Figura 8 – Gráfico evolução física do projeto – Percentual físico Previsto x Realizado. Pontos em azul indicam baseline previsto de evolução do projeto. Pontos em vermelho representam as leituras reais de evolução do projeto
Fonte: FIAP (2020)

Através deste gráfico, os executivos conseguem não só acompanhar a evolução dos trabalhos do projeto, mas também antecipar tendências.

Outros tipos gráficos também podem ser utilizados para acompanhar a evolução dos trabalhos em um projeto. O gráfico de evolução regressiva - Burndown rastreia o trabalho que ainda precisa ser concluído na lista de atividades de um projeto. É utilizado também para analisar a variação em relação a uma evolução regressiva do baseline de trabalho comprometido desde o planejamento do projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

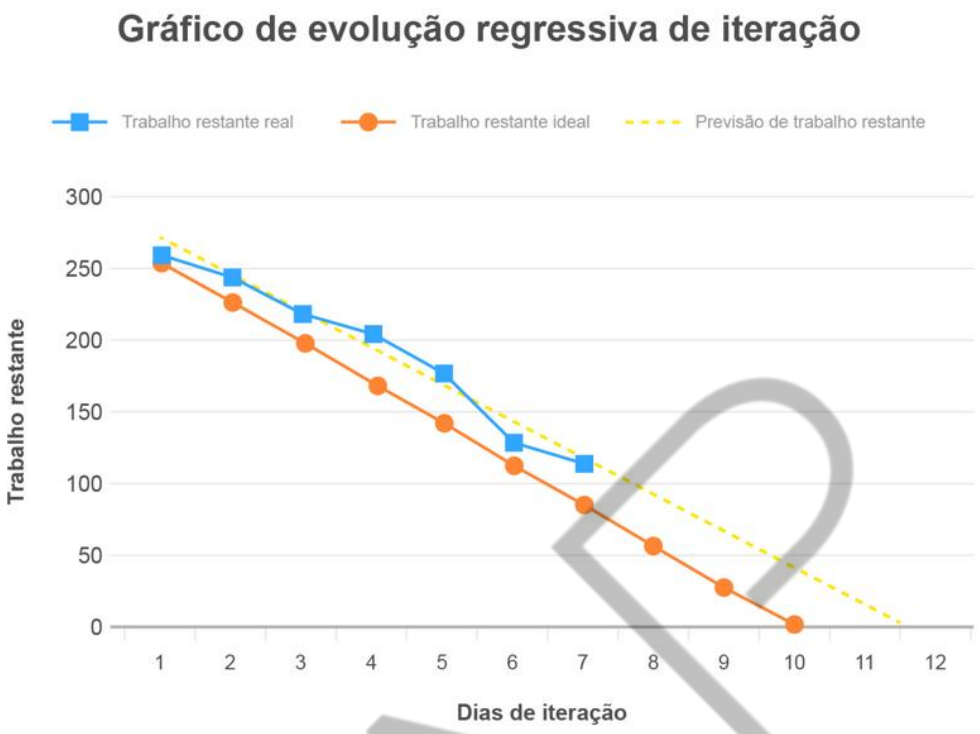

Figura 9 – Gráfico Evolução Regressiva - Burndown
Fonte: PMBOK 6ª Edição, adaptado por FIAP (2020)

Uma típica estrutura de *Status Report* pode ser descrita nas seguintes sequências, montadas em um documento elaborado em formato de apresentação:

- Um *slide* inicial de capa da apresentação contendo nome do projeto, tipo da reunião (*Status Report*) e a data da reunião.
- Um *slide* de Agenda, mostrando os principais tópicos a serem abordados na reunião.
- Um *slide* de *Dashboard*, consolidando as métricas de performance do projeto (logo a seguir apresentaremos um exemplo de *Dashboard*).
- *Slides* adicionais relacionados a temas relevantes a serem discutidos:
    - Desvios e suas origens, bem como ações de recuperação.
    - Tópicos que demandam tomadas de decisão dos presentes.
    - Entregas realizadas no período.
    - Próximas entregas e atividades relevantes.
- Um *slide* contendo painel de pendências relevantes do projeto, responsáveis e datas limites para cumprimento das pendências – em

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

geral, os responsáveis pelas pendências são os executivos presentes na reunião. Desta forma, a reunião torna-se um importante instrumento de cobrança das partes envolvidas.

- Um último *slide* contendo o painel de riscos e alertas do projeto, também carecendo de indicações de ações de mitigação tomadas bem como seus responsáveis.

A seguir, é apresentado um painel exemplo para um *Dashboard* de desempenho do projeto. De uma forma geral, projetos bem administrados possuem reuniões claras e objetivas que finalizam praticamente após a apresentação do Dashboard de desempenho.

Após a finalização da reunião, é de extrema importância que se produza uma ata escrita da reunião, tal qual apresentado no tópico anterior. O gerente de projeto deve preparar um *e-mail* destinado a todos os presentes e anexar cópia da apresentação de *Status* e a ata da reunião.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

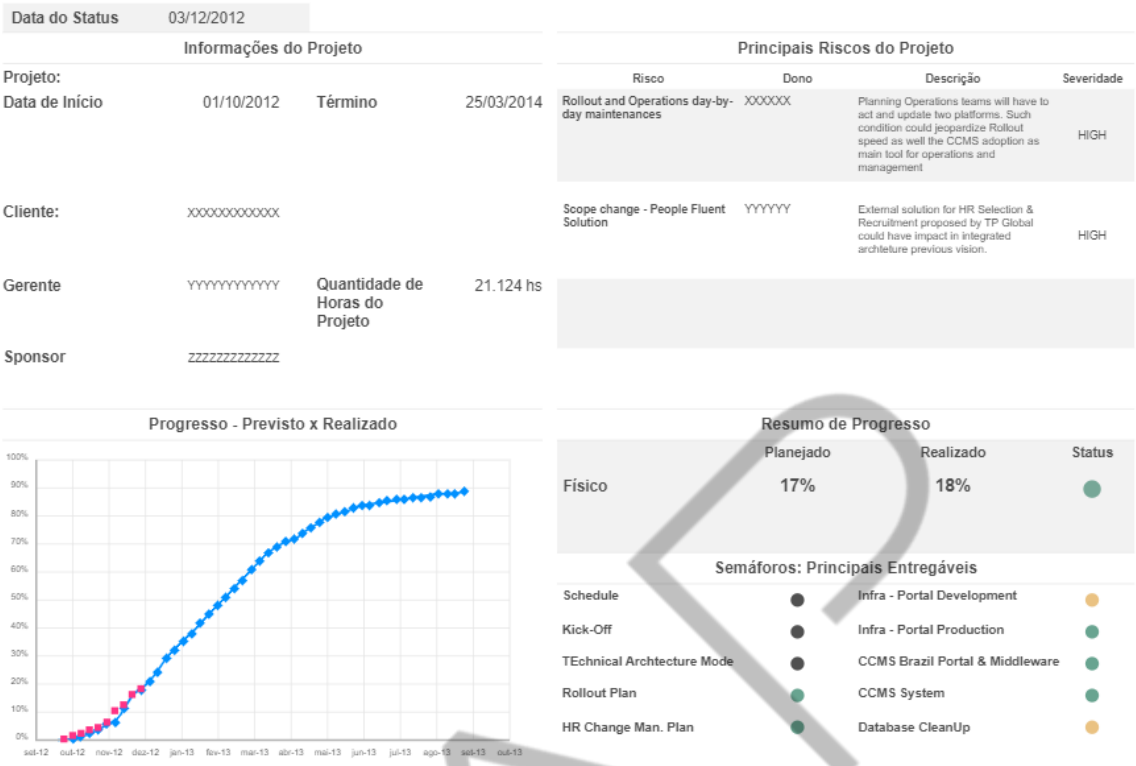

Data do Status 03/12/2012

Informações do Projeto

Projeto:			
Data de Início	01/10/2012	Término	25/03/2014
Cliente:	XXXXXXXXXXXX		
Gerente	YYYYYYYYYYY	Quantidade de Horas do Projeto	21.124 hs
Sponsor	ZZZZZZZZZZZZ		

Principais Riscos do Projeto

Risco	Dono	Descrição	Severidade
Rollout and Operations day-by-day maintenances	XXXXXX	Planning Operations teams will have to act and update two platforms. Such condition could jeopardize Rollout speed as well the CCMS adoption as main tool for operations and management	HIGH
Scope change - People Fluent Solution	YYYYYY	External solution for HR Selection & Recruitment proposed by TP Global could have impact in integrated architeture previous vision.	HIGH

Progresso - Previsto x Realizado

Resumo de Progresso

	Planejado	Realizado	Status
Físico	17%	18%	

Semáforos: Principais Entregáveis

Schedule		Infra - Portal Development	
Kick-Off		Infra - Portal Production	
TEchnical Archtecture Mode		CCMS Brazil Portal & Middleware	
Rollout Plan		CCMS System	
HR Change Man. Plan		Database CleanUp	

Figura 10 – Exemplo de *Dashboard* de Desempenho de um Projeto
Fonte: FIAP (2020)

Agora que você entende a importância de se comunicar claramente não só com a equipe e interessados pelo projeto, mas também com as altas hierarquias, é hora de você repensar suas atuais práticas de comunicação. Nunca se esqueça: quem não se comunica, se trumbica!!!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HELDMAN, Kim. **Gerência de projetos.** 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique Ferreira. **Gestão de projetos**: uma abordagem global. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

MEHRABIAN, Albert. **Silent Messages** – A wealth of information about nonverbal communication (body language). Personality & Emotion Tests & Software: Psychological Books & Articles of Popular Interest. Los Angeles, CA: self-published. 1981. Disponível em: <http://www.kaaj.com/psych/smorder.html>. Acesso em: 26 mai. 2023.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com
